



# Piano di Qualifica

## **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                             |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                 |
| 1.0.0                  | 2026-07-07 | Approvato | The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |                |                |             |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore         | Verificatore   | Approvatore | Descrizione                                                                                                                                         |
| 1.0.0                    | 2026-07-07 | -              | -              | D. Facco    | Approvazione <sub>G</sub> finale per RTB <sub>G</sub>                                                                                               |
| 0.10.0                   | 2026-07-06 | S. Zecchinato  | S. Vendramin   | -           | Aggiorna cruscotto con ultimi sprint <sub>G</sub>                                                                                                   |
| 0.9.0                    | 2026-06-23 | A. Marini      | S. Vendramin   | -           | Aggiunge valutazione MPC-PMS e sistema <sub>G</sub> le altre                                                                                        |
| 0.8.0                    | 2026-06-22 | L. Battistella | S. Vendramin   | -           | Aggiunge valutazioni MPC-IG/MPC-CO                                                                                                                  |
| 0.7.0                    | 2026-06-08 | S. Zecchinato  | L. Battistella | -           | Aggiunge valutazione MPC-AC/MPC-ETC                                                                                                                 |
| 0.6.0                    | 2026-06-07 | S. Zecchinato  | L. Battistella | -           | Aggiunge valutazione MPC-PV/MPC-EV                                                                                                                  |
| 0.5.0                    | 2026-06-04 | E. De Piccoli  | L. Battistella | -           | Aggiornamento test <sub>G</sub> di sistema <sub>G</sub> .                                                                                           |
| 0.4.0                    | 2026-05-30 | D. Facco       | L. Battistella | -           | Stesura dei capitoli Strategia di verifica <sub>G</sub> e testing e Tracciamento dei test <sub>G</sub> .                                            |
| 0.3.0                    | 2026-05-24 | A. Marini      | A. Menegaldo   | -           | Stesura del capitolo Metriche di qualità del prodotto (funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza, manutenibilità <sub>G</sub> e sicurezza). |
| 0.2.0                    | 2026-05-18 | S. Vendramin   | A. Menegaldo   | -           | Stesura del capitolo Metriche di qualità del processo (fornitura, sviluppo <sub>G</sub> , documentazione e verifica <sub>G</sub> ).                 |
| 0.1.0                    | 2026-05-14 | A. Marini      | A. Menegaldo   | -           | Creazione prima versione del documento Piano di Qualifica <sub>G</sub> . Inserimento della struttura iniziale e dei riferimenti.                    |

## Indice

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .             | 5         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .              | 5         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                       | 6         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                     | 6         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .           | 6         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .         | 6         |
| <b>2</b> | <b>Metriche di qualità del processo</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1      | Fornitura . . . . .                       | 7         |
| 2.2      | Sviluppo . . . . .                        | 8         |
| 2.3      | Documentazione . . . . .                  | 8         |
| 2.4      | Verifica . . . . .                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Metriche di qualità del prodotto</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1      | Funzionalità . . . . .                    | 9         |
| 3.2      | Affidabilità . . . . .                    | 10        |
| 3.3      | Usabilità . . . . .                       | 10        |
| 3.4      | Efficienza . . . . .                      | 11        |
| 3.5      | Manutenibilità . . . . .                  | 11        |
| 3.6      | Sicurezza . . . . .                       | 11        |
| <b>4</b> | <b>Strategia di verifica e testing</b>    | <b>12</b> |
| 4.1      | Stati dei test . . . . .                  | 12        |
| 4.2      | Copertura del codice . . . . .            | 12        |
| 4.3      | Test unitari . . . . .                    | 13        |
| 4.4      | Test di integrazione . . . . .            | 13        |
| 4.5      | Test di sistema . . . . .                 | 14        |
| 4.6      | Test di regressione . . . . .             | 15        |
| 4.7      | Test di accettazione . . . . .            | 15        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento dei test</b>              | <b>15</b> |
| 5.1      | Test di sistema principali . . . . .      | 15        |
| 5.2      | Test di accettazione principali . . . . . | 19        |
| <b>6</b> | <b>Cruscotto di valutazione</b>           | <b>20</b> |
| 6.1      | Confronto MPC-PV e MPC-EV . . . . .       | 20        |
| 6.2      | Confronto MPC-AC e MPC-ETC . . . . .      | 21        |
| 6.3      | Confronto MPC-CV e MPC-SV . . . . .       | 23        |
| 6.4      | Confronto MPC-EAC e MPC-BAC . . . . .     | 24        |
| 6.5      | Valutazione MPC-TCR . . . . .             | 26        |
| 6.6      | Valutazione MPC-TS . . . . .              | 27        |
| 6.7      | Valutazione MPC-MR . . . . .              | 28        |
| 6.8      | Valutazione MPC-IR . . . . .              | 29        |
| 6.9      | Valutazione MPC-IG . . . . .              | 30        |
| 6.10     | Valutazione MPC-CO . . . . .              | 31        |
| 6.11     | Valutazione MPC-PMS . . . . .             | 32        |

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Iniziative di miglioramento</b>        | <b>33</b> |
| 7.1      | Valutazione sull'organizzazione . . . . . | 34        |
| 7.2      | Valutazione sui ruoli . . . . .           | 35        |
| 7.3      | Valutazione sugli strumenti . . . . .     | 35        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 2  | Metriche per la qualità del processo di fornitura. . . . .     | 7  |
| 3  | Metriche per la qualità del processo di sviluppo. . . . .      | 8  |
| 4  | Metriche per la qualità della documentazione. . . . .          | 8  |
| 5  | Metriche per la qualità del processo di verifica. . . . .      | 9  |
| 6  | Metriche per la qualità funzionale del prodotto. . . . .       | 9  |
| 7  | Metriche per la qualità dell'affidabilità. . . . .             | 10 |
| 8  | Metriche per la qualità dell'usabilità. . . . .                | 11 |
| 9  | Metriche per la qualità dell'efficienza. . . . .               | 11 |
| 10 | Metriche per la qualità della manutenibilità. . . . .          | 11 |
| 11 | Metriche per la qualità della sicurezza. . . . .               | 12 |
| 12 | Test di integrazione . . . . .                                 | 14 |
| 13 | Test di sistema principali . . . . .                           | 19 |
| 14 | Test di accettazione principali. . . . .                       | 19 |
| 15 | MPC-PV e MPC-EV per sprint . . . . .                           | 20 |
| 16 | MPC-AC, MPC-ETC e MPC-EAC per sprint . . . . .                 | 21 |
| 17 | MPC-CV e MPC-SV per sprint . . . . .                           | 23 |
| 18 | MPC-EAC e BAC per sprint . . . . .                             | 24 |
| 19 | Task Completion Rate per sprint . . . . .                      | 26 |
| 20 | Task Slippage per sprint . . . . .                             | 27 |
| 21 | Merge Rework per sprint . . . . .                              | 28 |
| 22 | Issue Reopening Rate per sprint . . . . .                      | 29 |
| 23 | Indice di Gulpease per documento . . . . .                     | 30 |
| 24 | Percentuale di correttezza ortografica per documento . . . . . | 31 |
| 25 | Percentuale Metriche Soddisfatte per sprint . . . . .          | 32 |
| 26 | Azioni adottate per migliorare l'organizzazione. . . . .       | 34 |
| 27 | Azioni adottate per migliorare la gestione dei ruoli. . . . .  | 35 |
| 28 | Azioni adottate per migliorare l'uso degli strumenti. . . . .  | 35 |

## Elenco delle figure

|    |                                                                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Comparazione <i>Planned Value</i> - <i>Earned Value</i> . . . . .                                  | 21 |
| 2  | Comparazione <i>Actual Cost</i> - <i>Estimate to Complete</i> - <i>Estimated at Completion</i> . . | 22 |
| 3  | Comparazione <i>Cost Variance</i> - <i>Schedule Variance</i> . . . . .                             | 24 |
| 4  | Comparazione <i>Estimate At Completion</i> - <i>Budget At Completion</i> . . . . .                 | 25 |
| 5  | Valutazione <i>Task Completion Rate</i> . . . . .                                                  | 26 |
| 6  | Valutazione <i>Task Slippage</i> . . . . .                                                         | 27 |
| 7  | Valutazione <i>Merge Rework</i> . . . . .                                                          | 29 |
| 8  | Valutazione <i>Issue Reopening Rate</i> . . . . .                                                  | 30 |
| 9  | Valutazione <i>Indice di Gulpease</i> . . . . .                                                    | 31 |
| 10 | Valutazione di <i>Correttezza Ortografica</i> . . . . .                                            | 32 |
| 11 | Valutazione <i>Percentuale di Metriche Soddisfatte</i> . . . . .                                   | 33 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il *Piano di Qualifica* adottato dal gruppo *The Bitless* per il progetto *Second Brain*, relativo al capitolato<sub>G</sub> C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

Il Piano di Qualifica<sub>G</sub> ha lo scopo di definire in modo esplicito gli obiettivi di qualità perseguiti durante lo sviluppo<sub>G</sub> del prodotto software e le modalità con cui tali obiettivi vengono misurati, controllati e progressivamente migliorati.

Il documento raccoglie quindi:

- le metriche utilizzate per valutare la qualità dei processi interni al gruppo;
- le metriche utilizzate per valutare la qualità del prodotto software;
- la strategia di verifica<sub>G</sub> e validazione<sub>G</sub> adottata;
- la classificazione dei test<sub>G</sub> previsti;
- il tracciamento dei test<sub>G</sub> rispetto ai requisiti<sub>G</sub> individuati;
- i criteri con cui interpretare i risultati raccolti nel cruscotto di valutazione;
- le iniziative di miglioramento adottate sui processi e sul prodotto.

Il Piano di Qualifica<sub>G</sub> non ha l'obiettivo di sostituire le *Norme di Progetto*, nelle quali vengono definite le procedure operative seguite dal gruppo. Esso stabilisce invece quali aspetti devono essere misurati, quali valori sono considerati accettabili e quali valori rappresentano un risultato ottimale.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto richiesto dal capitolato<sub>G</sub> C6 consiste in un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown, arricchita dall'integrazione<sub>G</sub> con un Large Language Model<sub>G</sub>.

L'applicazione deve permettere all'utente di:

- scrivere testo Markdown in un'area di editing;
- visualizzare il risultato formattato in una zona di rendering;
- applicare operazioni basate su LLM<sub>G</sub> al testo completo o a una selezione;
- riassumere, riscrivere e tradurre il testo;
- ottenere analisi critiche secondo il modello dei sei cappelli per pensare<sub>G</sub>;
- generare un testo completo a partire da un prompt;
- salvare e recuperare note in formato testuale.

La qualità del prodotto deve quindi essere valutata non solo rispetto alla correttezza funzionale, ma anche rispetto alla facilità d'uso, alla stabilità dell'interazione con il modello linguistico, alla manutenibilità<sub>G</sub> del codice e alla verificabilità delle funzionalità principali.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio<sub>G</sub> applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio**

**di utilizzo:** termine<sub>G</sub>

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf)  
Ultimo accesso: 24 giugno 2026
- **Piano di Progetto v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_esterna/piano-di-progetto/piano-di-progetto.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_esterna/piano-di-progetto/piano-di-progetto.pdf)  
Ultimo accesso: 22 giugno 2026
- **Analisi dei Requisiti v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf)  
Ultimo accesso: 22 giugno 2026
- **Capitolato C6 – Second Brain:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>  
Ultimo accesso: 24 giugno 2026

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/glossario/glossario.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf)  
Ultimo accesso: 14 maggio 2026
- **Slide T07 – Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>  
Ultimo accesso: 23 giugno 2026
- **Slide T08 – Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>  
Ultimo accesso: 23 giugno 2026
- **ISO/IEC 12207:1995:**  
[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)  
Ultimo accesso: 9 giugno 2026
- **Specifica CommonMark:**  
<https://spec.commonmark.org/>  
Ultimo accesso: 21 giugno 2026



- **Documentazione API compatibili con OpenAI:**

<https://developers.openai.com/api/reference/overview>

Ultimo accesso: 20 giugno 2026

## 2 Metriche di qualità del processo

Le metriche di qualità del processo permettono di controllare il modo in cui il gruppo organizza e svolge le proprie attività. Esse non misurano direttamente il comportamento del prodotto finale, ma valutano l'efficacia della pianificazione, la stabilità dei requisiti<sub>G</sub>, la qualità della documentazione, l'efficienza delle verifiche e la sostenibilità del lavoro.

Nel presente documento le metriche di processo sono identificate con il prefisso **MPC**, acronimo di *Metrica di Processo e Controllo*. Ogni metrica è associata a:

- un identificativo univoco;
- un nome descrittivo;
- una soglia di accettabilità;
- un valore ottimale.

Le soglie riportate hanno lo scopo di aiutare il gruppo a interpretare i dati raccolti durante il progetto. Il raggiungimento del valore accettabile indica che il processo è sotto controllo; il raggiungimento del valore ottimale indica invece una condizione pienamente soddisfacente.

### 2.1 Fornitura

Le metriche relative alla fornitura misurano l'andamento del progetto rispetto alla pianificazione economica e temporale. Esse permettono di confrontare quanto era stato previsto con quanto è stato effettivamente realizzato.

| ID      | Nome metrica                      | Valore accettabile                   | Valore ottimale                          |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| MPC-PV  | Planned Value                     | $> 0 \text{ €}$                      | Coerente con la pianificazione approvata |
| MPC-EV  | Earned Value                      | $\geq 80\%$ del valore pianificato   | $\geq$ Planned Value                     |
| MPC-AC  | Actual Cost <sub>G</sub>          | $> 0 \text{ €}$                      | $\leq$ EAC                               |
| MPC-CV  | Cost Variance                     | $> 0$                                | $= 0$                                    |
| MPC-SV  | Schedule Variance                 | $\geq 0$                             | $> 0$                                    |
| MPC-EAC | Estimate At Completion            | $\leq 110\%$ del budget <sub>G</sub> | $\leq$ budget <sub>G</sub> approvato     |
| MPC-ETC | Estimate To Complete              | $\geq 0$                             | $\geq 0$                                 |
| MPC-TCR | Task <sub>G</sub> Completion Rate | $\geq 85\%$                          | 100%                                     |
| MPC-TS  | Task <sub>G</sub> Slippage        | $\leq 15\%$                          | 0%                                       |

Tabella 2: Metriche per la qualità del processo di fornitura.

## 2.2 Sviluppo

Le metriche relative allo sviluppo<sub>G</sub> controllano la stabilità del lavoro tecnico e la capacità del gruppo di introdurre modifiche in modo ordinato, verificabile e tracciabile.

Nel progetto *Second Brain*, particolare attenzione viene posta alla stabilità dei requisiti<sub>G</sub> collegati all'integrazione<sub>G</sub> con LLM<sub>G</sub>, poiché la natura esplorativa del capitolato<sub>G</sub> può portare a raffinamenti progressivi dei prompt, delle funzioni disponibili e delle modalità di interazione con il testo.

| ID       | Nome metrica                         | Valore accettabile                          | Valore ottimale                            |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MPC-RSI  | Requirements Stability Index         | $\geq 80\%$                                 | 100%                                       |
| MPC-PRCT | Pull Request <sub>G</sub> Cycle Time | $\leq 72$ ore                               | $\leq 24$ ore                              |
| MPC-MR   | Merge <sub>G</sub> Rework            | $\leq 20\%$ delle pull request <sub>G</sub> | $\leq 5\%$ delle pull request <sub>G</sub> |
| MPC-IR   | Issue <sub>G</sub> Reopening Rate    | $\leq 15\%$                                 | 0%                                         |

Tabella 3: Metriche per la qualità del processo di sviluppo.

## 2.3 Documentazione

Le metriche relative alla documentazione misurano la leggibilità, la correttezza e la verificabilità dei documenti prodotti. Poiché i documenti rappresentano il principale mezzo di comunicazione verso committente<sub>G</sub>, proponenti e docenti, essi devono essere chiari, aggiornati e coerenti tra loro.

| ID     | Nome metrica            | Valore accettabile | Valore ottimale |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| MPC-IG | Indice di Gulepease     | $\geq 40$          | $\geq 60$       |
| MPC-CO | Correttezza ortografica | Errore grave = 0%  | $CO \geq 99\%$  |

Tabella 4: Metriche per la qualità della documentazione.

## 2.4 Verifica

Le metriche relative alla verifica<sub>G</sub> misurano l'efficacia delle attività di controllo svolte sul prodotto e sui documenti. Esse permettono di valutare se gli errori vengono individuati tempestivamente e se le correzioni introdotte risultano effettivamente risolutive.

| ID      | Nome metrica                            | Valore accettabile                              | Valore ottimale                     |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MPC-CC  | Code Coverage                           | $\geq 70\%$                                     | $\geq 90\%$                         |
| MPC-TSR | Test <sub>G</sub> Success Rate          | $\geq 95\%$                                     | 100%                                |
| MPC-DD  | Defect Density                          | $\leq 2$ difetti per componente                 | 0 difetti aperti                    |
| MPC-TR  | Test <sub>G</sub> Requirements Coverage | 100% requisiti <sub>G</sub> obbligatori coperti | 100% requisiti <sub>G</sub> coperti |
| MPC-PMS | Percentuale Metriche Soddisfatte        | $\geq 80\%$                                     | 100%                                |

| ID | Nome metrica | Valore accettabile | Valore ottimale |
|----|--------------|--------------------|-----------------|
|----|--------------|--------------------|-----------------|

Tabella 5: Metriche per la qualità del processo di verifica.

### 3 Metriche di qualità del prodotto

Le metriche di qualità del prodotto misurano le caratteristiche del software realizzato. A differenza delle metriche di processo, esse valutano direttamente il comportamento dell'applicazione, la sua affidabilità, la sua facilità d'uso e la sua capacità di soddisfare i requisiti<sub>G</sub> del capitolato<sub>G</sub>.

Nel presente documento le metriche di prodotto sono identificate con il prefisso **MPD**, acronimo di *Metrica di Prodotto*. Le caratteristiche considerate sono:

- funzionalità;
- affidabilità;
- usabilità;
- efficienza;
- manutenibilità<sub>G</sub>;
- sicurezza.

#### 3.1 Funzionalità

Le metriche di funzionalità misurano quanto il prodotto soddisfa i requisiti<sub>G</sub> individuati nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>. Per il progetto *Second Brain*, la copertura dei requisiti<sub>G</sub> obbligatori è particolarmente importante, poiché il capitolato<sub>G</sub> richiede un insieme minimo di funzionalità necessarie per considerare accettabile il prodotto.

| ID       | Nome metrica                                     | Valore accettabile    | Valore ottimale       |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MPD-CRO  | Copertura requisiti <sub>G</sub> obbligatori     | 100%                  | 100%                  |
| MPD-CRD  | Copertura requisiti <sub>G</sub> desiderabili    | ≥ 50%                 | ≥ 80%                 |
| MPD-CROp | Copertura requisiti <sub>G</sub> opzionali       | ≥ 0%                  | ≥ 60%                 |
| MPD-CLLM | Copertura funzioni LLM <sub>G</sub> obbligatorie | 100%                  | 100%                  |
| MPD-CMD  | Correttezza rendering Markdown                   | ≥ 95% casi previsti   | 100% casi previsti    |
| MPD-SN   | Salvataggio e recupero note                      | 100% casi obbligatori | 100% casi obbligatori |

Tabella 6: Metriche per la qualità funzionale del prodotto.

### 3.2 Affidabilità

Le metriche di affidabilità misurano la capacità del prodotto di mantenere un comportamento corretto anche in presenza di input<sub>G</sub> non ottimali, errori di comunicazione o risposte inattese da parte del modello linguistico.

Nel contesto del capitolato<sub>G</sub> C6, l'affidabilità riguarda in particolare:

- la stabilità dell'editor durante la scrittura;
- la conservazione del testo inserito dall'utente;
- la gestione degli errori provenienti dall'LLM<sub>G</sub>;
- la capacità di evitare perdita di dati durante salvataggio e caricamento delle note.

| ID     | Nome metrica      | Valore accettabile                | Valore ottimale                     |
|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MPD-DL | Data Loss         | 0 perdite nei casi principali     | 0 perdite in ogni test <sub>G</sub> |
| MPD-EH | Error Handling    | ≥ 90% errori gestiti              | 100% errori gestiti                 |
| MPD-SR | Session Recovery  | Recupero testo nei casi previsti  | Recupero completo e automatico      |
| MPD-AR | Availability Rate | ≥ 95% durante i test <sub>G</sub> | ≥ 99% durante i test <sub>G</sub>   |

Tabella 7: Metriche per la qualità dell'affidabilità.

### 3.3 Usabilità

Le metriche di usabilità valutano la facilità con cui l'utente può comprendere e utilizzare l'applicazione. Il prodotto deve risultare accessibile anche a utenti non esperti, come richiesto dalla natura del capitolato<sub>G</sub>.

L'interfaccia deve permettere di distinguere chiaramente:

- l'area di editing Markdown;
- l'area di rendering;
- i comandi base sul testo;
- i comandi collegati all'LLM<sub>G</sub>;
- le funzioni di salvataggio e caricamento.

| ID     | Nome metrica      | Valore accettabile      | Valore ottimale        |
|--------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| MPD-LT | Learning Time     | ≤ 30 minuti             | ≤ 10 minuti            |
| MPD-NE | Navigation Errors | ≤ 3 errori per scenario | 0 errori per scenario  |
| MPD-UI | UI Consistency    | ≥ 90% elementi coerenti | 100% elementi coerenti |

| ID     | Nome metrica              | Valore accettabile                        | Valore ottimale                           |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MPD-FU | Feature Understandability | $\geq 80\%$ funzioni comprese senza guida | $\geq 95\%$ funzioni comprese senza guida |

Tabella 8: Metriche per la qualità dell'usabilità.

### 3.4 Efficienza

Le metriche di efficienza misurano i tempi di risposta e l'uso delle risorse. Nel progetto *Second Brain*, una parte significativa del tempo di risposta può dipendere dal modello linguistico utilizzato; per questo motivo è opportuno distinguere tra:

- tempo di risposta dell'interfaccia locale;
- tempo di rendering Markdown;
- tempo di risposta delle chiamate  $LLM_G$ .

| ID        | Nome metrica              | Valore accettabile | Valore ottimale    |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| MPD-RT    | Response Time interfaccia | $\leq 2$ secondi   | $\leq 0,5$ secondi |
| MPD-MRT   | Markdown Rendering Time   | $\leq 1$ secondo   | $\leq 0,3$ secondi |
| MPD-LLMRT | $LLM_G$ Response Time     | $\leq 15$ secondi  | $\leq 8$ secondi   |
| MPD-LS    | Loading Speed             | $\leq 3$ secondi   | $\leq 1$ secondo   |

Tabella 9: Metriche per la qualità dell'efficienza.

### 3.5 Manutenibilità

Le metriche di manutenibilità $_G$  valutano quanto il codice sia comprensibile, modificabile e testabile. Considerata la natura evolutiva del progetto, è importante che l'architettura permetta di aggiungere o modificare funzioni  $LLM_G$ , prompt e modalità di salvataggio senza introdurre regressioni.

| ID      | Nome metrica            | Valore accettabile             | Valore ottimale                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| MPD-CYC | Complessità ciclomatica | $\leq 15$                      | $\leq 10$                         |
| MPD-CS  | Code Smell              | $\leq 5$ per componente        | $\leq 1$ per componente           |
| MPD-DUP | Duplicazione del codice | $\leq 10\%$                    | $\leq 3\%$                        |
| MPD-MOD | Modularità              | Componenti principali separate | Dipendenze ridotte e ben definite |

Tabella 10: Metriche per la qualità della manutenibilità.

### 3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza misurano la capacità del prodotto di proteggere dati, chiavi di accesso e contenuti dell'utente. Poiché l'applicazione interagisce con servizi  $LLM_G$  esterni, è necessario evitare l'esposizione impropria di credenziali e gestire con attenzione i dati inviati tramite  $API_G$ .

| ID                  | Nome metrica                  | Valore accettabile                           | Valore ottimale                          |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| MPD-SK              | Secret Key Exposure           | 0 chiavi esposte                             | 0 chiavi esposte                         |
| MPD-IV              | Input <sub>G</sub> Validation | ≥ 95% input <sub>G</sub> validati            | 100% input <sub>G</sub> validati         |
| MPD-DS              | Data Sanitization             | ≥ 95% dati sanificati                        | 100% dati sanificati                     |
| MPD-PR <sub>G</sub> | Privacy <sub>G</sub> Risk     | Nessun dato sensibile non necessario inviato | Minimizzazione completa dei dati inviati |

Tabella 11: Metriche per la qualità della sicurezza.

## 4 Strategia di verifica e testing

La strategia di verifica<sub>G</sub> adottata dal gruppo ha lo scopo di fornire evidenza oggettiva del corretto avanzamento del progetto e della conformità del prodotto rispetto ai requisiti<sub>G</sub> individuati.

Le attività di testing vengono organizzate in modo progressivo. Nelle fasi iniziali vengono privilegiati test<sub>G</sub> e controlli sulle funzionalità fondamentali, mentre nelle fasi successive la copertura viene estesa alle interazioni tra componenti, ai flussi completi e ai requisiti<sub>G</sub> non funzionali.

Ogni test<sub>G</sub> è identificato da un codice univoco, da una descrizione, dal requisito associato e da uno stato.

### 4.1 Stati dei test

Gli stati utilizzati per classificare i test<sub>G</sub> sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il test<sub>G</sub> è stato previsto, ma non è ancora stato implementato;
- **I – Implementato:** il test<sub>G</sub> è stato implementato, ma non ancora eseguito o verificato stabilmente;
- **S – Superato:** il test<sub>G</sub> è stato eseguito e ha prodotto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il test<sub>G</sub> è stato eseguito, ma ha prodotto esito negativo;
- **NA – Non Applicabile:** il test<sub>G</sub> non è applicabile alla versione corrente del prodotto.

### 4.2 Copertura del codice

La copertura del codice misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test<sub>G</sub> automatici.

Questa metrica viene utilizzata come indicatore della quantità di codice effettivamente verificata, ma non è sufficiente da sola a garantire la correttezza del prodotto. Per questo motivo viene interpretata insieme al tasso di successo dei test<sub>G</sub>, alla copertura dei requisiti<sub>G</sub> e al numero di difetti individuati.

Il valore minimo accettabile è fissato al 70%, mentre il valore ottimale è pari o superiore al 90%.

### 4.3 Test unitari

I Test Unitari<sub>G</sub> verificano singole unità software<sub>G</sub> in isolamento. Nel progetto *Second Brain*, tali test<sub>G</sub> riguardano principalmente:

- parsing e gestione del testo Markdown;
- funzioni di aggiornamento dello stato dell'editor;
- validazione<sub>G</sub> degli input<sub>G</sub>;
- costruzione dei prompt da inviare all'LLM<sub>G</sub>;
- funzioni di salvataggio e lettura delle note;
- gestione degli errori applicativi.

La specifica dei Test Unitari<sub>G</sub> viene raffinata con l'avanzamento della progettazione di dettaglio. In questa fase, il Piano di Qualifica<sub>G</sub> definisce la strategia e gli obiettivi di copertura, mentre l'elenco puntuale dei test<sub>G</sub> sarà aggiornato quando le unità software<sub>G</sub> saranno stabilizzate.

### 4.4 Test di integrazione

I test<sub>G</sub> di integrazione<sub>G</sub> del PoC<sub>G</sub> verificano che i moduli dell'architettura dialoghino correttamente ai loro confini, validando interfacce, formato dei dati scambiati e propagazione degli errori lungo l'intera catena.

| Codice        | Descrizione Interfaccia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moduli Coinvolti                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>TI-001</b> | Verifica <sub>G</sub> dello scambio dati e della gestione degli errori tra hook e FastAPI; invio della richiesta via fetch POST, ricezione dello stream SSE e gestione dell'indisponibilità del provider (HTTP 503).                                                                                        | Frontend <sub>G</sub> React (hook useLlmStream) ↔ Backend FastAPI |
| <b>TI-002</b> | Verifica <sub>G</sub> dell'invio del prompt di sistema <sub>G</sub> e del contesto utente verso il modello LLM <sub>G</sub> e della ricezione dello stream di risposta openai-compatible dall'API <sub>G</sub> del provider, tramite client HTTP asincrono (httpx).                                         | LLMClient / LiteLLMClient ↔ Provider LiteLLM Zucchetti            |
| <b>TI-003</b> | Verifica <sub>G</sub> della propagazione dell'annullamento lungo l'intera catena; dall'AbortController lato client a Request.isDisconnected() lato server, fino alla chiusura dello stream del provider.                                                                                                    | AbortController (client) ↔ Request.isDisconnected() (server)      |
| <b>TI-004</b> | Verifica <sub>G</sub> del parsing dei chunk SSE e dell'aggiornamento progressivo dello stato globale dell'applicazione (appendChunk / streamedOutput).                                                                                                                                                      | useLlmStream (parsing via lib/sse.ts) ↔ Store Zustand             |
| <b>TI-005</b> | Verifica <sub>G</sub> del binding del testo e del re-render granulare dell'anteprima durante lo streaming, mediato dalla store globale: l'editor mantiene il focus mentre solo la preview si aggiorna.                                                                                                      | Store Zustand (selettori granulari) ↔ Editor / Preview            |
| <b>TI-006</b> | Verifica <sub>G</sub> dell'applicazione a runtime della politica CORS tra i due servizi containerizzati; le richieste provenienti da un'origine non presente nella whitelist vengono bloccate, quelle da origine consentita vengono accettate.                                                              | Origine cross-origin del browser ↔ CORSMiddleware (FastAPI)       |
| <b>TI-007</b> | Verifica <sub>G</sub> dell'integrazione <sub>G</sub> del pannello dei comandi con la logica di streaming e lo stato globale, il click su "Genera" disabilita il bottone tramite isGenerating, un errore del provider compare nell'Alert tramite errorMessage e il testo presente nell'editor resta intatto. | AIPanel ↔ useLlmStream ↔ Store Zustand                            |

Tabella 12: Test di integrazione

## 4.5 Test di sistema

I test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub> verificano il comportamento complessivo dell'applicazione rispetto ai Requisiti Funzionali<sub>G</sub> e non funzionali. Essi vengono definiti a partire dai casi d'uso<sub>G</sub> e dai requisiti<sub>G</sub> presenti nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>.

Per il progetto *Second Brain*, i test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub> devono coprire almeno i seguenti scenari:

- scrittura di testo Markdown nell'area di editing;
- visualizzazione corretta del testo formattato;
- applicazione della funzione di riassunto;
- applicazione della funzione di riscrittura;
- applicazione della funzione di traduzione;
- applicazione delle critiche secondo i sei cappelli per pensare<sub>G</sub>;



- generazione di un testo completo a partire da prompt;
- salvataggio e caricamento di una nota.

## 4.6 Test di regressione

I test<sub>G</sub> di regressione vengono eseguiti dopo modifiche al codice, correzioni di difetti o introduzione di nuove funzionalità. Il loro obiettivo è verificare che il comportamento già validato non sia stato compromesso.

Nel caso del progetto *Second Brain*, i test<sub>G</sub> di regressione sono particolarmente importanti perché le funzionalità basate su LLM<sub>G</sub> e prompt possono essere raffinate più volte durante lo sviluppo<sub>G</sub>. Ogni modifica ai prompt, alle chiamate API<sub>G</sub> o alla gestione della risposta deve quindi essere accompagnata dalla riesecuzione dei test<sub>G</sub> collegati.

## 4.7 Test di accettazione

I test<sub>G</sub> di accettazione verificano che il prodotto rispetti le aspettative del committente<sub>G</sub> e soddisfi i requisiti<sub>G</sub> obbligatori previsti dal capitolato<sub>G</sub>.

Essi sono formulati dal punto di vista dell'utente finale e descrivono scenari completi di utilizzo. Il superamento dei test<sub>G</sub> di accettazione costituisce una condizione necessaria per considerare il prodotto conforme agli obiettivi minimi del progetto.

# 5 Tracciamento dei test

Il tracciamento dei test<sub>G</sub> permette di collegare ogni verifica<sub>G</sub> al requisito corrispondente. In questo modo è possibile controllare quali requisiti<sub>G</sub> risultano coperti e quali richiedono ulteriori attività di verifica<sub>G</sub>.

Ogni test<sub>G</sub> viene identificato secondo la seguente convenzione:

- **TU**: test<sub>G</sub> unitario;
- **TI**: test<sub>G</sub> di integrazione<sub>G</sub>;
- **TS**: test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub>;
- **TA**: test<sub>G</sub> di accettazione.

## 5.1 Test di sistema principali

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                 | Requisito | Stato |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| TS-001 | Verificare che l'Utente possa inserire testo libero nell'area di editing in formato Markdown <sub>G</sub> .                                                 | R-1-F-Ob  | NI    |
| TS-002 | Verificare che l'Utente possa selezionare una porzione di testo presente nell'editor.                                                                       | R-2-F-Ob  | NI    |
| TS-003 | Verificare che l'Utente possa tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e memorizzandola negli appunti di sistema <sub>G</sub> . | R-3-F-Ob  | NI    |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                              | Requisito | Stato |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| TS-004 | Verificare che l'Utente possa copiare una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema <sub>G</sub> senza modificare il contenuto dell'editor. | R-4-F-Ob  | NI    |
| TS-005 | Verificare che l'Utente possa incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.                                            | R-5-F-Ob  | NI    |
| TS-006 | Verificare che l'Utente possa annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.                                                                        | R-6-F-Ob  | NI    |
| TS-007 | Verificare che l'Utente possa ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.             | R-7-F-Ob  | NI    |
| TS-008 | Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                     | R-8-F-Ob  | NI    |
| TS-009 | Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                       | R-9-F-Ob  | NI    |
| TS-010 | Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione sottolineata al testo.                                                              | R-10-F-Ob | NI    |
| TS-011 | Verificare che l'Utente possa applicare e rimuovere la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                          | R-11-F-Ob | NI    |
| TS-012 | Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere titoli e sottotitoli mediante sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                        | R-12-F-Ob | NI    |
| TS-013 | Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare elenchi puntati o numerati.                                                                          | R-13-F-Ob | NI    |
| TS-014 | Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere blocchi di citazione.                                                                                 | R-14-F-Ob | NI    |
| TS-015 | Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare blocchi di codice sorgente nel documento.                                                            | R-15-F-Ob | NI    |
| TS-016 | Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare formule scientifiche o matematiche.                                                                  | R-16-F-Ob | NI    |
| TS-017 | Verificare che l'Utente possa inserire ed eliminare collegamenti ipertestuali.                                                                           | R-17-F-Ob | NI    |
| TS-018 | Verificare che l'Utente possa inserire, modificare ed eliminare tabelle Markdown <sub>G</sub> .                                                          | R-19-F-Ob | NI    |
| TS-019 | Verificare che l'Utente possa inserire, sostituire ed eliminare immagini all'interno del documento.                                                      | R-20-F-Ob | NI    |
| TS-020 | Verificare che l'Utente possa alternare la visualizzazione tra solo editor, solo anteprima e visualizzazione combinata.                                  | R-25-F-Ob | NI    |
| TS-021 | Verificare che l'Utente possa ottenere un riassunto del testo selezionato tramite LLM <sub>G</sub> .                                                     | R-27-F-Ob | NI    |
| TS-022 | Verificare che l'Utente possa tradurre il testo selezionato in una lingua supportata tramite LLM <sub>G</sub> .                                          | R-29-F-Ob | NI    |
| TS-023 | Verificare che l'Utente possa modificare lo stile linguistico del testo selezionato tramite LLM <sub>G</sub> .                                           | R-30-F-Ob | NI    |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                             | Requisito | Stato |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| TS-024 | Verificare che l'Utente possa correggere grammaticalmente il testo selezionato tramite $LLM_G$ .                                                        | R-31-F-Ob | NI    |
| TS-025 | Verificare che l'Utente riceva una comunicazione nel caso in cui l' $LLM_G$ non rilevi errori nel testo analizzato.                                     | R-32-F-Ob | NI    |
| TS-026 | Verificare che l'Utente possa analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare $_G$ .                               | R-33-F-Ob | NI    |
| TS-027 | Verificare che l'Utente possa selezionare una specifica prospettiva di analisi tra Cappello Bianco, Rosso, Giallo, Nero, Verde e Blu.                   | R-34-F-Ob | NI    |
| TS-028 | Verificare che l'Utente possa generare automaticamente un testo a partire da un $prompt_G$ .                                                            | R-35-F-Ob | NI    |
| TS-029 | Verificare che l'Utente possa salvare, scartare o rigenerare l'output $_G$ prodotto dall' $LLM_G$ .                                                     | R-40-F-Ob | NI    |
| TS-030 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca gli errori di comunicazione o risposta del servizio $LLM_G$ , preservando il contenuto originale dell'editor.   | R-42-F-Ob | NI    |
| TS-031 | Verificare che il Sistema $_G$ impedisca l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.             | R-43-F-Ob | NI    |
| TS-032 | Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota nell'editor.                                                                                  | R-44-F-Ob | NI    |
| TS-033 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca eventuali errori durante la creazione di una nuova nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente. | R-46-F-Ob | NI    |
| TS-034 | Verificare che l'Utente possa caricare una nota da file locale in formato .md o .txt.                                                                   | R-47-F-Ob | NI    |
| TS-035 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.              | R-49-F-Ob | NI    |
| TS-036 | Verificare che l'Utente possa salvare una nota sul File System locale.                                                                                  | R-50-F-Ob | NI    |
| TS-037 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.     | R-52-F-Ob | NI    |
| TS-038 | Verificare che l'Utente possa eliminare una nota dal File System locale.                                                                                | R-53-F-Ob | NI    |
| TS-039 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca eventuali errori durante l'eliminazione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.                | R-55-F-Ob | NI    |
| TS-040 | Verificare che l'Utente possa rinominare una nota locale.                                                                                               | R-56-F-Ob | NI    |
| TS-041 | Verificare che il Sistema $_G$ gestisca eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.                         | R-58-F-Ob | NI    |
| TS-042 | Verificare che l'Utente possa inserire e rimuovere ancora di navigazione interne al documento.                                                          | R-18-F-De | NI    |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                    | Requisito | Stato |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| TS-043 | Verificare che l'Utente possa attivare e disattivare l'autocompletamento dei simboli durante la digitazione.                                                   | R-21-F-De | NI    |
| TS-044 | Verificare che l'Utente possa attivare e disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.                                             | R-22-F-De | NI    |
| TS-045 | Verificare che l'Utente possa alternare l'interfaccia tra tema chiaro e tema scuro.                                                                            | R-23-F-De | NI    |
| TS-046 | Verificare che l'Utente possa aprire e chiudere la barra laterale dell'interfaccia.                                                                            | R-24-F-De | NI    |
| TS-047 | Verificare che l'Utente possa inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API <sub>G</sub> .                                 | R-26-F-De | NI    |
| TS-048 | Verificare che l'Utente possa scegliere la percentuale di concisione del riassunto.                                                                            | R-28-F-De | NI    |
| TS-049 | Verificare che l'Utente possa definire la lunghezza desiderata del testo generato.                                                                             | R-36-F-De | NI    |
| TS-050 | Verificare che il Sistema <sub>G</sub> mostri all'Utente un riepilogo del contesto prima dell'invio della richiesta all'LLM <sub>G</sub> .                     | R-37-F-De | NI    |
| TS-051 | Verificare che l'Utente possa fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.                                                    | R-38-F-De | NI    |
| TS-052 | Verificare che l'Utente possa annullare una richiesta di elaborazione in corso.                                                                                | R-41-F-De | NI    |
| TS-053 | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.                                                               | R-59-F-De | NI    |
| TS-054 | Verificare che l'Utente autenticato possa selezionare manualmente note salvate nel database <sub>G</sub> da usare come contesto per la generazione automatica. | R-39-F-Op | NI    |
| TS-055 | Verificare che l'Utente autenticato possa creare una nuova nota nel database <sub>G</sub> .                                                                    | R-45-F-Op | NI    |
| TS-056 | Verificare che l'Utente autenticato possa caricare una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                        | R-48-F-Op | NI    |
| TS-057 | Verificare che l'Utente autenticato possa salvare una nota nel database <sub>G</sub> .                                                                         | R-51-F-Op | NI    |
| TS-058 | Verificare che l'Utente autenticato possa eliminare una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                       | R-54-F-Op | NI    |
| TS-059 | Verificare che l'Utente autenticato possa rinominare una nota salvata nel database <sub>G</sub> .                                                              | R-57-F-Op | NI    |
| TS-060 | Verificare che l'Utente autenticato possa cercare note nel database <sub>G</sub> per titolo.                                                                   | R-60-F-Op | NI    |
| TS-061 | Verificare che l'Utente autenticato possa effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database <sub>G</sub> .                        | R-61-F-Op | NI    |
| TS-062 | Verificare che l'Utente autenticato possa filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di creazione.                                                    | R-62-F-Op | NI    |
| TS-063 | Verificare che l'Utente autenticato possa filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di ultima modifica.                                              | R-63-F-Op | NI    |

| ID     | Descrizione                                                                                                                                             | Requisito | Stato |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| TS-064 | Verificare che l'Utente non autenticato possa effettuare l'autenticazione tramite username e password.                                                  | R-64-F-Op | NI    |
| TS-065 | Verificare che il Sistema <sub>G</sub> gestisca eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore. | R-65-F-Op | NI    |
| TS-066 | Verificare che l'Utente non autenticato possa registrare un nuovo account.                                                                              | R-66-F-Op | NI    |
| TS-067 | Verificare che il Sistema <sub>G</sub> impedisca la registrazione con uno username già presente nel database <sub>G</sub> .                             | R-67-F-Op | NI    |
| TS-068 | Verificare che il Sistema <sub>G</sub> impedisca la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.                                 | R-68-F-Op | NI    |
| TS-069 | Verificare che l'Utente autenticato possa eliminare il proprio account e i dati cloud associati.                                                        | R-69-F-Op | NI    |
| TS-070 | Verificare che l'Utente autenticato possa effettuare il logout.                                                                                         | R-70-F-Op | NI    |

Tabella 13: Test di sistema principali

## 5.2 Test di accettazione principali

I test<sub>G</sub> di accettazione validano il sistema<sub>G</sub> rispetto agli scenari d'uso previsti (Use Cases), verificando che l'utente possa completare i flussi di lavoro principali richiesti dal capitolato<sub>G</sub> d'appalto. Nella tabella seguente ogni test<sub>G</sub> è associato ai Requisiti Funzionali<sub>G</sub> obbligatori di riferimento, mentre la colonna Stato ne riporta lo stato di avanzamento.

| ID     | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Riferimento  | Stato |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| TA-001 | L'utente scrive una nota in formato Markdown, ne osserva l'anteprima formattata e salva il contenuto su file locale.                                                                           | UC 1, UC 70  | NI    |
| TA-002 | L'utente seleziona una porzione di testo e ne richiede il riassunto all'LLM <sub>G</sub> , scegliendo se porre il risultato in coda o in sostituzione della selezione.                         | UC 52        | NI    |
| TA-003 | L'utente richiede una riscrittura del testo specificando il tipo di intervento (sistemazione grammaticale, cambio di tono, estensione o riduzione) e la modalità di inserimento del risultato. | UC 54, UC 55 | NI    |
| TA-004 | L'utente richiede al sistema <sub>G</sub> la traduzione del testo, indicando la lingua di destinazione e la modalità di inserimento del risultato.                                             | UC 53        | NI    |
| TA-005 | L'utente applica in sequenza al testo le sei analisi dei cappelli (bianco, rosso, giallo, nero, verde, blu).                                                                                   | UC 56        | NI    |
| TA-006 | L'utente inserisce un prompt nell'apposito pannello e avvia la generazione dell'intero testo da parte dell'LLM <sub>G</sub> .                                                                  | UC 57        | NI    |
| TA-007 | Partendo da una nota salvata in precedenza, l'utente la carica da file locale e ne riprende la modifica nell'area di editing.                                                                  | UC 67        | NI    |

Tabella 14: Test di accettazione principali.

## 6 Cruscotto di valutazione

Il cruscotto di valutazione raccoglie periodicamente i valori delle metriche definite nel presente documento. La sua funzione è fornire una visione sintetica dello stato del progetto e rendere più semplice individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati.

Il cruscotto viene aggiornato al termine di ogni periodo di lavoro rilevante e viene utilizzato durante le retrospettive per:

- valutare l'efficacia delle attività svolte;
- individuare problemi ricorrenti;
- stabilire eventuali azioni correttive;
- migliorare la pianificazione futura;
- verificare l'effetto delle iniziative di miglioramento.

Le misurazioni che seguono fanno riferimento al periodo che intercorre tra l'aggiudicazione del capitolato<sub>G</sub>, avvenuto il 28 marzo 2026, e la consegna della RTB<sub>G</sub>.


### 6.1 Confronto MPC-PV e MPC-EV

| Sprint | Planned Value | Earned Value | Accumulo PV | Accumulo EV |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 1      | €985,00       | €939,19      | €985,00     | €939,19     |
| 2      | €980,00       | €1.024,55    | €1.965,00   | €1.963,73   |
| 3      | €955,00       | €1.085,23    | €2.920,00   | €3.048,96   |
| 4      | €880,00       | €832,43      | €3.800,00   | €3.881,39   |
| 5      | €1.075,00     | €1.126,19    | €4.875,00   | €5.007,58   |
| 6      | €1.055,00     | €1.037,12    | €5.930,00   | 6.044,70    |
| 7      | €185,00       | €185,00      | €6.115,00   | €6.229,70   |

Tabella 15: MPC-PV e MPC-EV per sprint

Come possiamo notare dalla figura 1, il *Planned Value* cresce di pari passo con l'avanzare degli sprint<sub>G</sub>. Vediamo poi come nel primo sprint<sub>G</sub> l'*Earned Value* sia minore rispetto alla stima pianificata: questo è dovuto a una inesperienza nella programmazione del lavoro che, a partire dallo sprint<sub>G</sub> 2, è stata migliorata. Questo lo si può notare anche dall'accumulo di EV che, dallo sprint<sub>G</sub> 3, comincia ad essere maggiore dell'accumulo di PV, che riporta quindi un avanzamento del progetto di poco in anticipo rispetto a quanto pianificato. Nell'ultimo sprint<sub>G</sub>, che coincide con la prima fase di valutazione RTB<sub>G</sub>, il lavoro è stato principalmente di palestra e meno lavorativo e per questo risultano valori bassi in PV e EV. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $PV > 0€$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimo:** PV pari alla pianificazione concordata, vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore accettabile:**  $EV \geq 80\% * PV$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimo:**  $EV \geq PV$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* in due sprint<sub>G</sub> su sette.

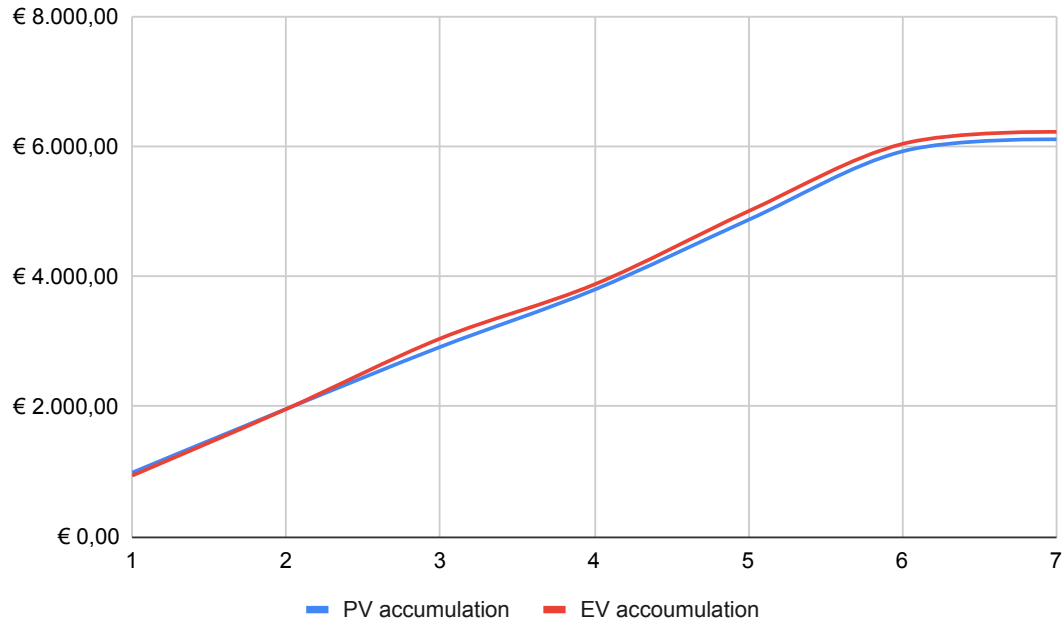Figura 1: Comparazione *Planned Value* - *Earned Value*

## 6.2 Confronto MPC-AC e MPC-ETC

| Sprint | Actual Cost | Accumulo AC | Estimate to Complete | Estimate at Completion |
|--------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 1      | €945,00     | €945,00     | €11.994,61           | €12.939,61             |
| 2      | €980,00     | €1.925,00   | €10.375,87           | €12.300,87             |
| 3      | €1.105,00   | €3.030,00   | €10.064,31           | €13.094,31             |
| 4      | €780,00     | €3.810,00   | €8.239,99            | €12.049,99             |
| 5      | €1.120,00   | €4.930,00   | €7.859,31            | €12.789,31             |
| 6      | €1.040,00   | €5.970,00   | €6.925,73            | €12.895,73             |
| 7      | €185,00     | €6.155,00   | €6.705,00            | €12.860,00             |

Tabella 16: MPC-AC, MPC-ETC e MPC-EAC per sprint

L'analisi del grafico in Figura 2 evidenzia, come atteso, un incremento progressivo dell'*Actual Cost*, fisiologico e coerente con il continuo assorbimento delle risorse economiche durante l'avanzamento del progetto. Relativamente alle metriche previsionali *Estimate to Complete* ed *Estimate at Completion*, osserviamo un trend decrescente fino al secondo sprint<sub>G</sub>. Tale dinamica rappresenta un indicatore di elevata efficienza iniziale, avendo posizionato la stima del costo a finire (EAC) significativamente al di sotto del budget<sub>G</sub> stanziato. Tra il secondo e il terzo sprint<sub>G</sub>, tuttavia, rileviamo una flessione nelle performance di progetto: all'incremento dei costi sostenuti non corrisponde una proporzionale riduzione del lavoro residuo stimato (ETC). Conseguentemente, l'EAC subisce un innalzamento, approssimandosi al limite critico definito dal BAC. Questa

deviazione è imputabile principalmente alla fase di revisione dell' *Analisi dei Requisiti*, un'attività che ha richiesto un notevole impiego di risorse in termini di *effort* senza tuttavia generare un proporzionale incremento del valore maturato (*Earned Value*). A tale criticità si è sommata un'iniziale inesperienza nella pianificazione operativa e nel coordinamento delle attività del team, con inevitabili ricadute negative sull'efficienza economica complessiva dello sprint<sub>G</sub>. A partire dal terzo sprint<sub>G</sub> si registra, in controtendenza, un marcato recupero dell'efficienza operativa, con una riduzione dell'ETC. Ciò determina una conseguente e significativa riduzione della stima del costo totale a finire. Pur riscontrando un lieve incremento dell'EAC in corrispondenza del quinto sprint<sub>G</sub>, la proiezione di chiusura si stabilizza circa al limite imposto dal BAC. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $AC > 0\text{€}$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimo:**  $AC \leq EAC$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore accettabile:**  $ETC \geq 0$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimo:**  $ETC \geq 0$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.

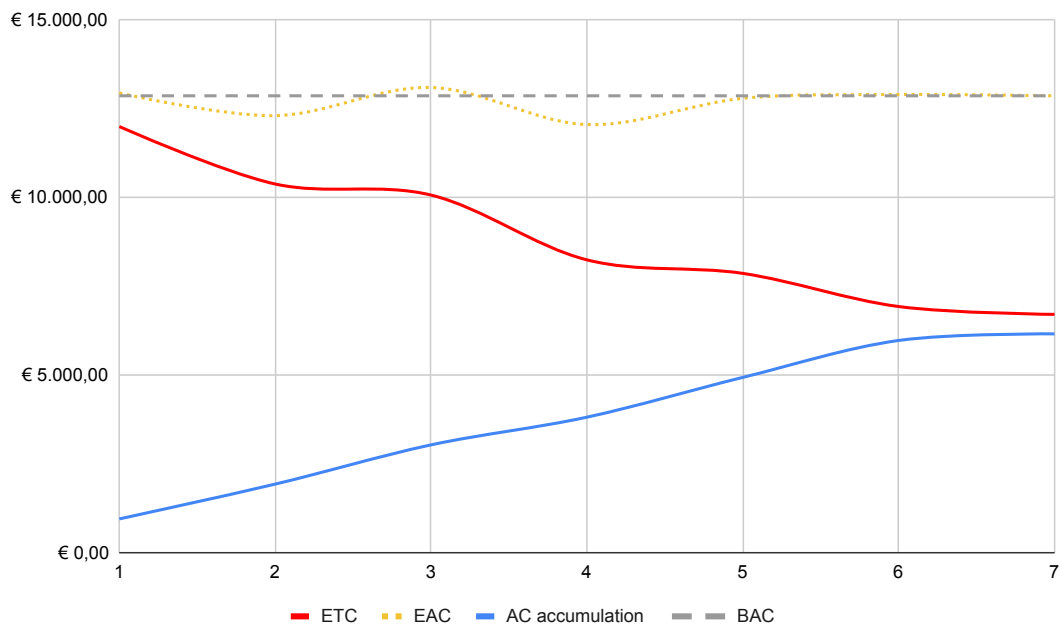


Figura 2: Comparazione *Actual Cost* - *Estimate to Complete* - *Estimated at Completion*



### 6.3 Confronto MPC-CV e MPC-SV

| Sprint | Cost Variance (€) | Schedule Variance (€) | Giudizio                                              |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1      | -5,81             | -45,81                | In ritardo e lievemente sopra il budget <sub>G</sub>  |
| 2      | +44,55            | +44,55                | In anticipo e sotto il budget <sub>G</sub>            |
| 3      | -19,77            | +130,23               | In anticipo ma sopra il budget <sub>G</sub>           |
| 4      | +52,43            | -47,57                | In ritardo ma sotto il budget <sub>G</sub>            |
| 5      | +6,19             | +51,19                | In anticipo e lievemente sotto il budget <sub>G</sub> |
| 6      | -2,88             | -17,88                | In ritardo e lievemente sopra il budget <sub>G</sub>  |
| 7      | 0,00              | 0,00                  | In regola                                             |

Tabella 17: MPC-CV e MPC-SV per sprint

Dall'analisi del grafico in Figura 3 possiamo notare un andamento altalenante che, tuttavia, culmina in una convergenza verso l'efficienza ottimale:

- **Sprint 1:** In questo sprint<sub>G</sub> il progetto si avvia con performance al di sotto del livello di ottimalità. Questa dinamica è del tutto coerente con le difficoltà iniziali di calibrazione del team.
- **Sprint 2:** In questo sprint<sub>G</sub> il team recupera il ritardo iniziale con un ottimo slancio portandosi in anticipo sulle consegne. Questo slancio, però, comporta un impiego di risorse economiche superiore al previsto, che porta ad uno scenario di anticipo temporale a fronte di un sovraccosto.
- **Sprint 3:** La tendenza all'accelerazione vista nello scorso sprint<sub>G</sub> si consolida generando il picco massimo di vantaggio sulla schedulazione. Questo ritmo veloce produce un ulteriore, seppur contenuto, sfioramento del budget<sub>G</sub>.
- **Sprint 4:** In questo sprint<sub>G</sub> il team registra una flessione dal punto di vista temporale, accumulando nuovamente ritardo rispetto al piano ideale. Di contro si rileva un eccellente recupero dell'efficienza economica.
- **Sprint 5:** In questa iterazione entrambe le metriche di varianza risultano positive consolidando un solido anticipo sulla tabella di marcia mantenendo allo stesso tempo una, seppur minima, efficienza finanziaria.
- **Sprint 6:** In questo sprint<sub>G</sub> il progetto registra un leggero calo delle prestazioni dovuto principalmente alla sessione d'esami. Questo ha portato ad un ritardo contenuto e ad un leggero sfioramento di budget<sub>G</sub>.

- **Sprint 7:** In quest'ultima iterazione analizzata notiamo *Schedule Variance* e *Cost Variance* pari a zero. Questo è dovuto dal fatto che questo sprint<sub>G</sub> rappresentava la prima fase di revisione RTB<sub>G</sub>, quindi il carico di lavoro è stato poco e facile da portare a termine.

Valutazione:

- **Valore accettabile CV:**  $CV > 0$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* in tre sprint<sub>G</sub> su cinque con scostamenti lievi.
- **Valore accettabile SV:**  $SV \geq 0$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* in tre sprint<sub>G</sub> su cinque con slittamenti consistenti.

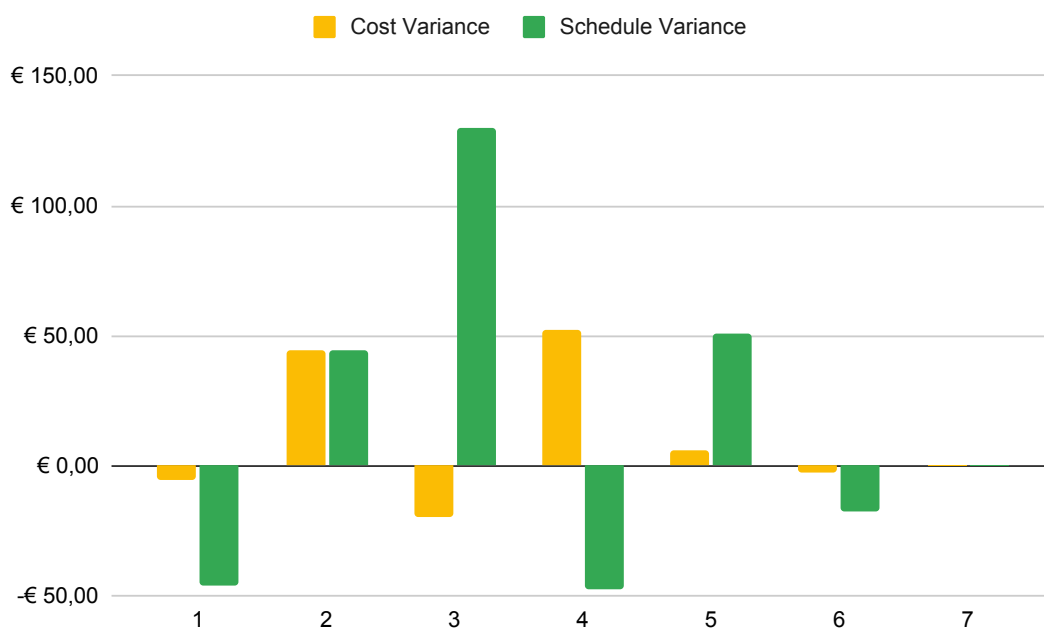


Figura 3: Comparazione *Cost Variance* - *Schedule Variance*

#### 6.4 Confronto MPC-EAC e MPC-BAC

| Sprint | Estimate At Completion | Budget At Completion | Stato   |
|--------|------------------------|----------------------|---------|
| 1      | €12.939,61             | €12.860,00           | EAC>BAC |
| 2      | €12.300,87             | €12.860,00           | EAC<BAC |
| 3      | €13.094,31             | €12.860,00           | EAC>BAC |
| 4      | €12.049,99             | €12.860,00           | EAC<BAC |
| 5      | €12.789,31             | €12.860,00           | EAC<BAC |
| 6      | €12.895,73             | €12.860,00           | EAC>BAC |
| 7      | €12.860,00             | €12.860,00           | EAC=BAC |

Tabella 18: MPC-EAC e BAC per sprint

Dall'aggiudicazione del capitolato<sub>G</sub> fino alla revisione della RTB<sub>G</sub>, l'*Estimate At Completion* oscilla attorno al *Budget At Completion*. L'EAC supera il BAC solo in tre occasioni:

- **Sprint 1:** come detto anche nelle altre sezioni, il primo sprint<sub>G</sub> ha sofferto dell'inesperienza del gruppo nell'organizzare le task<sub>G</sub>, dimensionarle e portarle a compimento. Questo ha provocato un leggero sfioramento di budget<sub>G</sub>.
- **Sprint 3:** in questo sprint<sub>G</sub> il gruppo si è dovuto confrontare con la revisione dell'*Analisi dei Requisiti*, che ha portato ad un rallentamento del progetto e ad un conseguente minore valore aggiunto.
- **Sprint 6:** in questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha dovuto affrontare la revisione interna dei documenti e del PoC<sub>G</sub> precedente alla prima fase di revisione RTB<sub>G</sub>. Questo ha portato ad un carico di lavoro importante con conseguente sfioramento di budget<sub>G</sub> e leggero ritardo in quanto non si è prodotto un effettivo valore aggiunto.

Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $EAC \leq 110\% \text{ budget}_G$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimale:**  $EAC \leq \text{budget}_G$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* in tre sprint<sub>G</sub> su cinque.

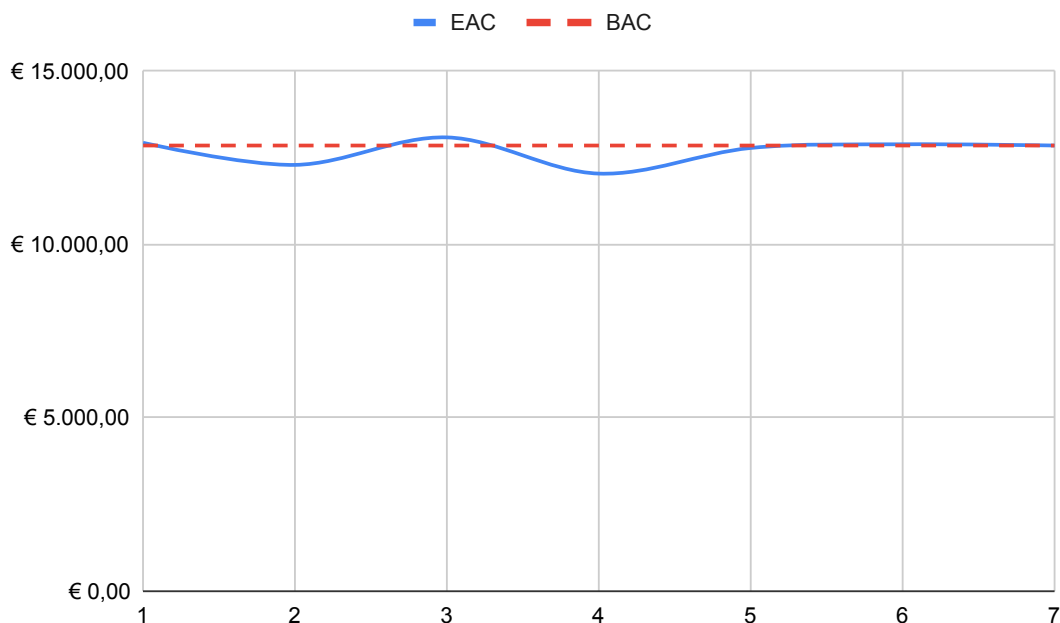


Figura 4: Comparazione *Estimate At Completion* - *Budget At Completion*

## 6.5 Valutazione MPC-TCR

| Sprint | Task completate | Task in ritardo | TCR (%) | Giudizio    |
|--------|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| 1      | 13              | 3               | 76,9%   | Critico     |
| 2      | 11              | 0               | 100,0%  | Ottimo      |
| 3      | 13              | 0               | 100,0%  | Ottimo      |
| 4      | 13              | 1               | 92,3%   | Accettabile |
| 5      | 49              | 0               | 100,0%  | Ottimo      |
| 6      | 25              | 0               | 100,0%  | Ottimo      |
| 7      | 5               | 0               | 100,0%  | Ottimo      |

Tabella 19: Task Completion Rate per sprint

Il *Task Completion Rate* risulta ottimo in tre sprint<sub>G</sub> su cinque. Notiamo subottimalità critica nello sprint<sub>G</sub> 1 (76,9%) e una subottimalità lieve nello sprint<sub>G</sub> 4 (92,3%). Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $TCR \geq 85\%$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* nello sprint<sub>G</sub> 1.

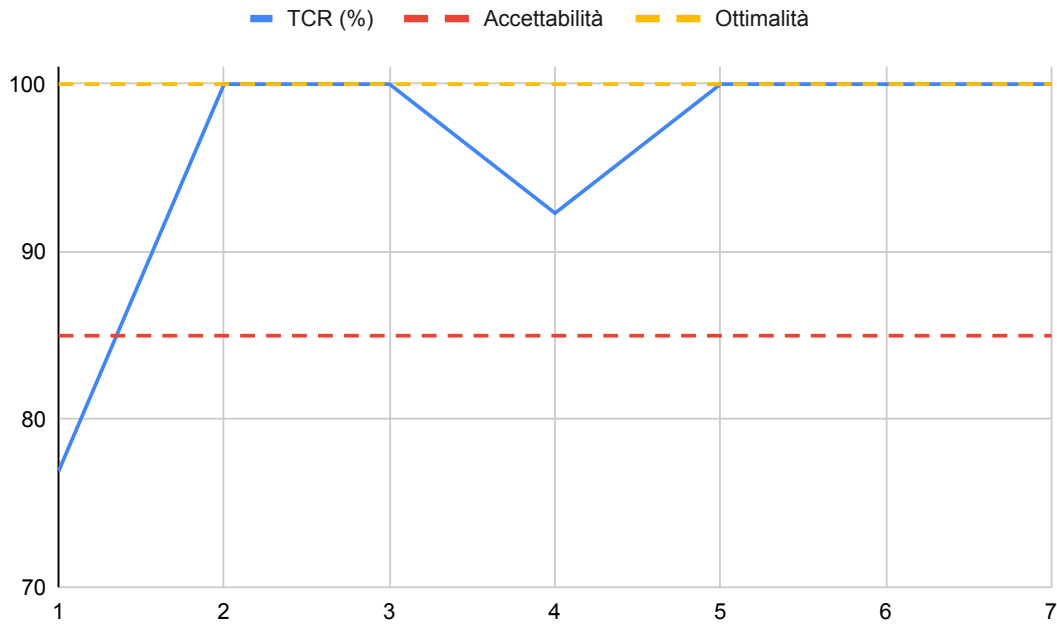


Figura 5: Valutazione *Task Completion Rate*

## 6.6 Valutazione MPC-TS

| Sprint | Task completate | Task in ritardo | TS (%) | Giudizio    |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 1      | 13              | 3               | 23,1%  | Critico     |
| 2      | 11              | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 3      | 13              | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 4      | 13              | 1               | 7,7%   | Accettabile |
| 5      | 49              | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 6      | 25              | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 7      | 5               | 0               | 0,0%   | Ottimo      |

Tabella 20: Task Slippage per sprint

Il *Task Slippage* risulta ottimo in tre sprint<sub>G</sub> su cinque. Notiamo subottimalità critica nello sprint<sub>G</sub> 1 (23,1%) e una subottimalità lieve nello sprint<sub>G</sub> 4 (7,7%). Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $TS < 15\%$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* nello sprint<sub>G</sub> 1.

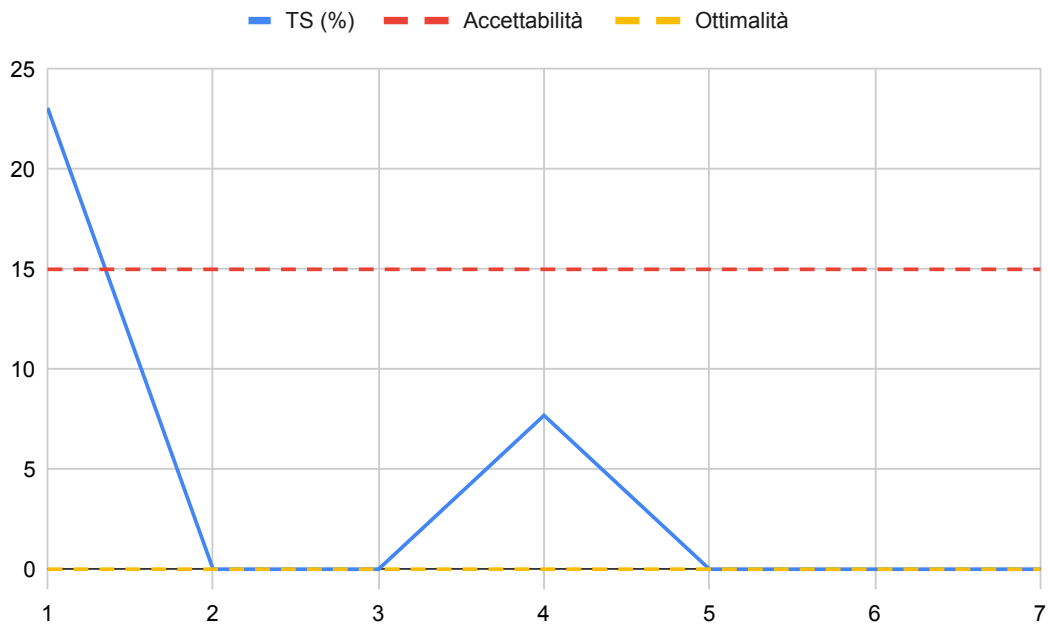


Figura 6: Valutazione *Task Slippage*


## 6.7 Valutazione MPC-MR

| Sprint | Pull request aperte | PR riaperte | MR (%) | Giudizio    |
|--------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | 13                  | 1           | 7,7%   | Accettabile |
| 2      | 30                  | 2           | 6,7%   | Accettabile |
| 3      | 21                  | 7           | 33,3%  | Critico     |
| 4      | 29                  | 7           | 24,1%  | Critico     |
| 5      | 68                  | 2           | 2,9%   | Ottimo      |
| 6      | 30                  | 0           | 0,0%   | Ottimo      |
| 7      | 2                   | 0           | 0,0%   | Ottimo      |

Tabella 21: Merge Rework per sprint

Dal grafico in Figura 7 possiamo notare come la valutazione di *Merge Rework*, ovvero la percentuale di Pull Request<sub>G</sub> approvate nelle quali viene sovrascritto del lavoro già svolto, varia a seconda della fase del progetto. Nei primi due sprint<sub>G</sub> troviamo dei valori simili (7% circa) che riteniamo accettabili. Questi valori sono dati dal fatto che tutti i membri del gruppo non avevano avuto ancora esperienza di co-working con lo strumento GitHub<sub>G</sub>, né con un progetto con un gruppo così numeroso. Questo ha portato a iniziali incomprensioni sul lavoro da svolgere e, di conseguenza, a riscritture di parti di documenti. Nel terzo e quarto sprint<sub>G</sub> abbiamo valori critici, dovuti principalmente all'*Analisi dei Requisiti* (primo grande documento condiviso da più redattori) e dalla sua riscrittura, dovuta a revisioni a seguito di numerosi difetti di modellazione riscontrati. Nello sprint<sub>G</sub> 5 abbiamo avuto un'enorme mole di Pull Request<sub>G</sub> dovute all'inizio del *Proof of Concept* che però sono state minimamente sovrascritte grazie ad una progettazione adeguata. Infine negli ultimi due sprint<sub>G</sub> la percentuale di lavoro sovrascritto è stata pari a zero. Questo è dovuto al carico di lavoro diminuito e ad una consapevolezza aumentata sulle task<sub>G</sub> da svolgere e sugli strumenti da utilizzare. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $MR \leq 20\%$ , vincolo<sub>G</sub> *violato* in due sprint<sub>G</sub> su cinque.

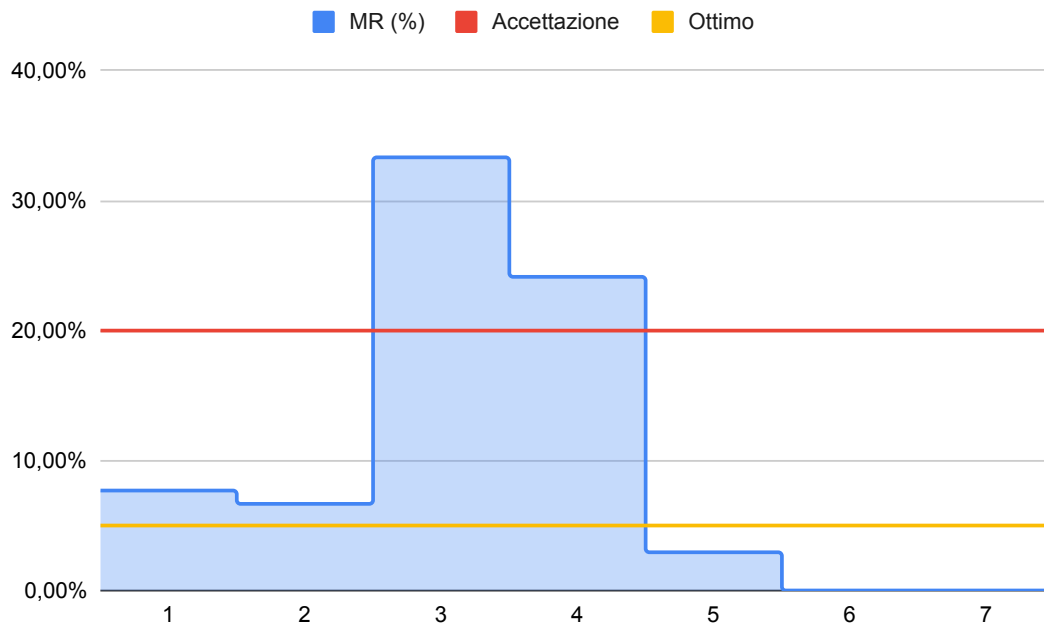Figura 7: Valutazione *Merge Rework*


## 6.8 Valutazione MPC-IR

| Sprint | Issues aperte | Issues riaperte | IR (%) | Giudizio    |
|--------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 1      | 13            | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 2      | 11            | 1               | 9,1%   | Accettabile |
| 3      | 13            | 3               | 23,1%  | Critico     |
| 4      | 14            | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 5      | 49            | 1               | 2,0%   | Accettabile |
| 6      | 25            | 0               | 0,0%   | Ottimo      |
| 7      | 5             | 0               | 0,00%  | Ottimo      |

Tabella 22: Issue Reopening Rate per sprint

Come è possibile notare in Figura 8, l'andamento dell'*Issue Reopening Rate* è altalenante sebbene si mantenga quasi sempre abbondantemente sotto la soglia di accettabilità. L'unico sprint<sub>G</sub> che fa eccezione è il numero 3 che, per motivi già affrontati in questo documento, possiede un valore di MPC-IR critico. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $IR \leq 15\%$ , vincolo<sub>G</sub> violato nello sprint<sub>G</sub> 3.

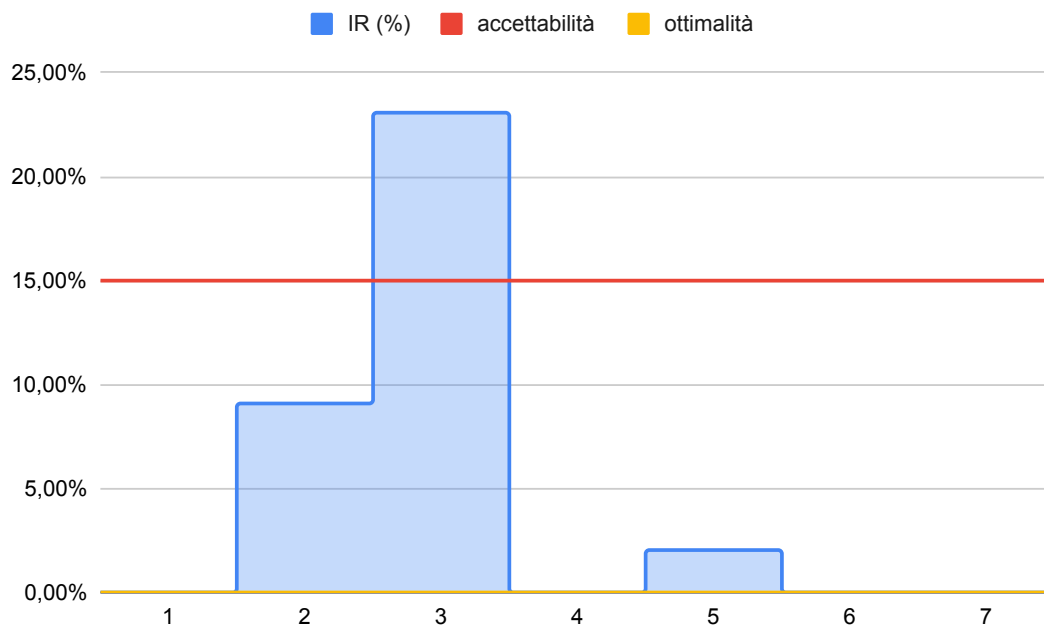Figura 8: Valutazione *Issue Reopening Rate*

## 6.9 Valutazione MPC-IG

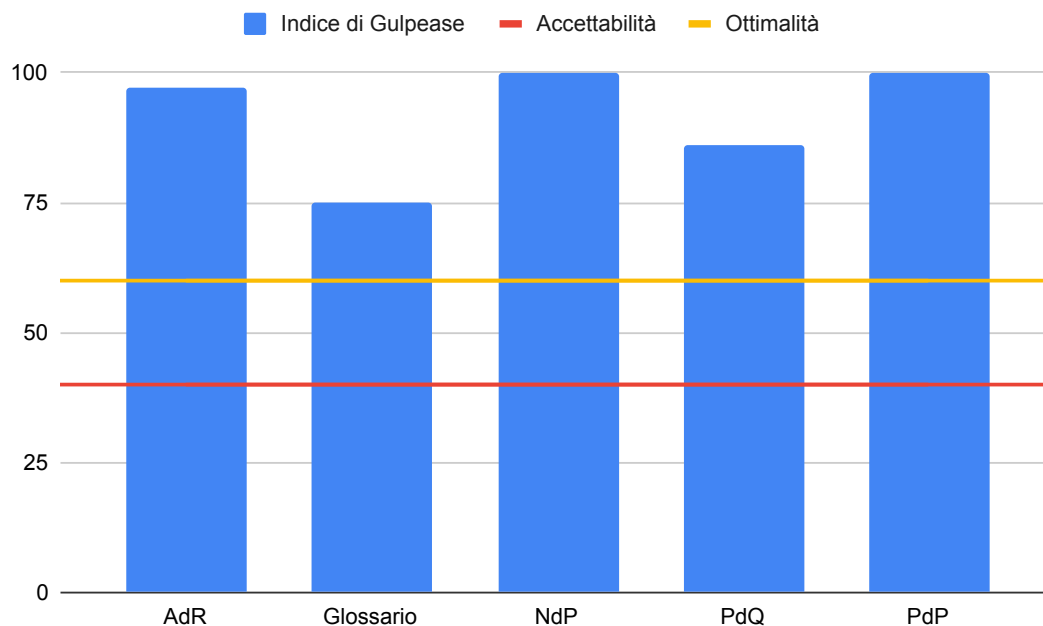
| Documento | Indice di Gulpease | Giudizio |
|-----------|--------------------|----------|
| AdR       | 97                 | Ottimo   |
| Glossario | 75                 | Ottimo   |
| NdP       | 100                | Ottimo   |
| PdQ       | 86                 | Ottimo   |
| PdP       | 100                | Ottimo   |

Tabella 23: Indice di Gulpease per documento

Il grafico in Figura 9 mostra l'indice di Gulpease di ogni documento prodotto nel suo stato finale (versione 1.0.0). Come possiamo notare, tutti i documenti si posizionano sopra la soglia di ottimalità. Questo certifica che i documenti prodotti sono leggibili e comprensibili da qualsiasi individuo in possesso di licenza media. Questa leggibilità elevata è data dalla preferenza di periodi semplici e brevi al posto di quelli complessi e lunghi; in più le parole usate vogliono essere il meno "tecniche" possibili, preferendo quindi una maggiore comprensibilità per i non addetti ai lavori a discapito però di una maggiore lunghezza dei documenti. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $IG \geq 40$ , vincolo<sub>G</sub> sempre *rispettato*.
- **Valore ottimo:**  $IG \geq 60$ , vincolo<sub>G</sub> sempre *rispettato*.



Figura 9: Valutazione *Indice di Gulpease*


### 6.10 Valutazione MPC-CO

| Documento | Errori gravi (%) | Errori non gravi (%) | CO (%) | Giudizio |
|-----------|------------------|----------------------|--------|----------|
| AdR       | 0%               | 0,50%                | 99,50% | Ottimo   |
| Glossario | 0%               | 1,00%                | 99,00% | Ottimo   |
| NdP       | 0%               | 0,30%                | 99,77% | Ottimo   |
| PdQ       | 0%               | 0,20%                | 99,80% | Ottimo   |
| PdP       | 0%               | 0,28%                | 99,72% | Ottimo   |

Tabella 24: Percentuale di correttezza ortografica per documento

Com'è possibile notare dalla Figura 10, l'indice di correttezza ortografica è ottimo in tutti i documenti. Questo perché ogni documento in scrittura viene automaticamente analizzato dall'editor di testo che segnala all'utente eventuali inesattezze ortografiche. Valutazione:

- **Valore accettabile:** documenti senza errori gravi, vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.
- **Valore ottimo:**  $CO \geq 99\%$ , vincolo<sub>G</sub> *rispettato*.

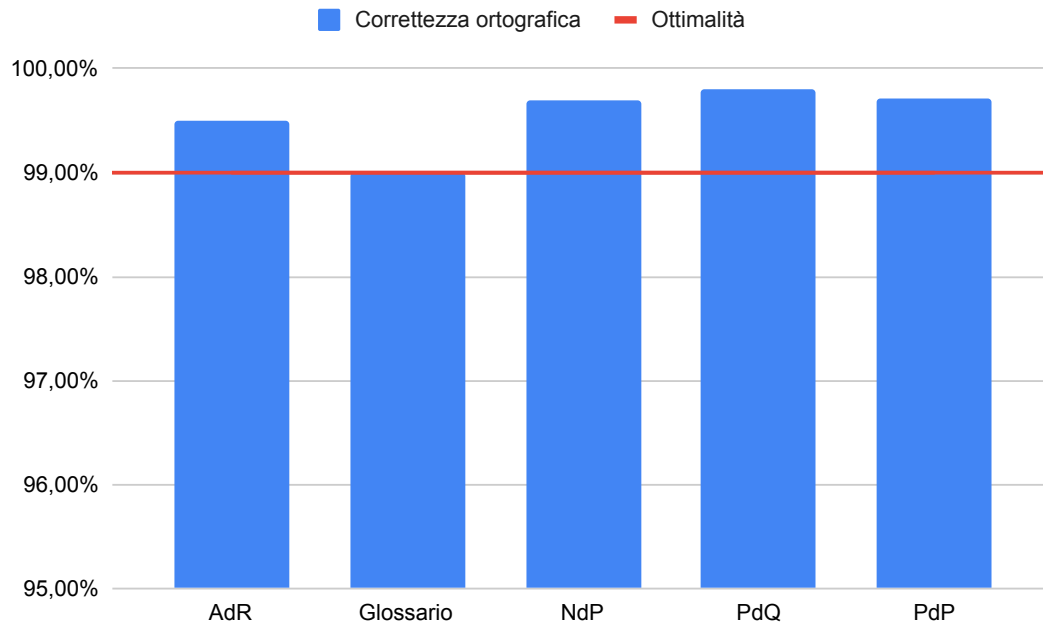Figura 10: Valutazione di *Correttezza Ortografica*

### 6.11 Valutazione MPC-PMS

| Sprint | Percentuale Metriche Soddisfatte (%) | Giudizio    |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| 1      | 67%                                  | Critico     |
| 2      | 100%                                 | Ottimo      |
| 3      | 75%                                  | Critico     |
| 4      | 83%                                  | Accettabile |
| 5      | 100%                                 | Ottimo      |
| 6      | 82%                                  | Accettabile |
| 7      | 100%                                 | Ottimo      |
| 8      | 100%                                 | Ottimo      |
| 9      | 82%                                  | Ottimo      |
| 7      | 100%                                 | Ottimo      |

Tabella 25: Percentuale Metriche Soddisfatte per sprint

Analizzando l'andamento della *Percentuale di Metriche Soddisfatte* (MPC-PMS) per la durata degli sprint<sub>G</sub> in Figura 11, notiamo un percorso discontinuo ma in miglioramento. A fronte di alcune criticità operative riscontrate negli Sprint<sub>G</sub> 1 e 3 in cui i nostri risultati (67% e 75%) sono scesi sotto la soglia di accettabilità dell'80% per i motivi già citati in questo documento, abbiamo messo in campo un'ottima capacità di reazione. Dopo aver recuperato l'adeguatezza nello Sprint<sub>G</sub> 4 (83%), nello sprint<sub>G</sub> 5 notiamo un completamento al 100% delle metriche che ci porta alla piena conformità agli standard qualitativi prefissati. Dal calcolo sono state escluse le metriche

di correttezza dei documenti, in quanto queste sono calcolate a documento approvato e non a  $\text{sprint}_G$ . Il loro coinvolgimento nel calcolo produrrebbe uno sfasamento che non permetterebbe una stima affidabile. Valutazione:

- **Valore accettabile:**  $PMS \geq 80\%$ , vincolo<sub>G</sub> *non rispettato* nello  $\text{sprint}_G$  3.

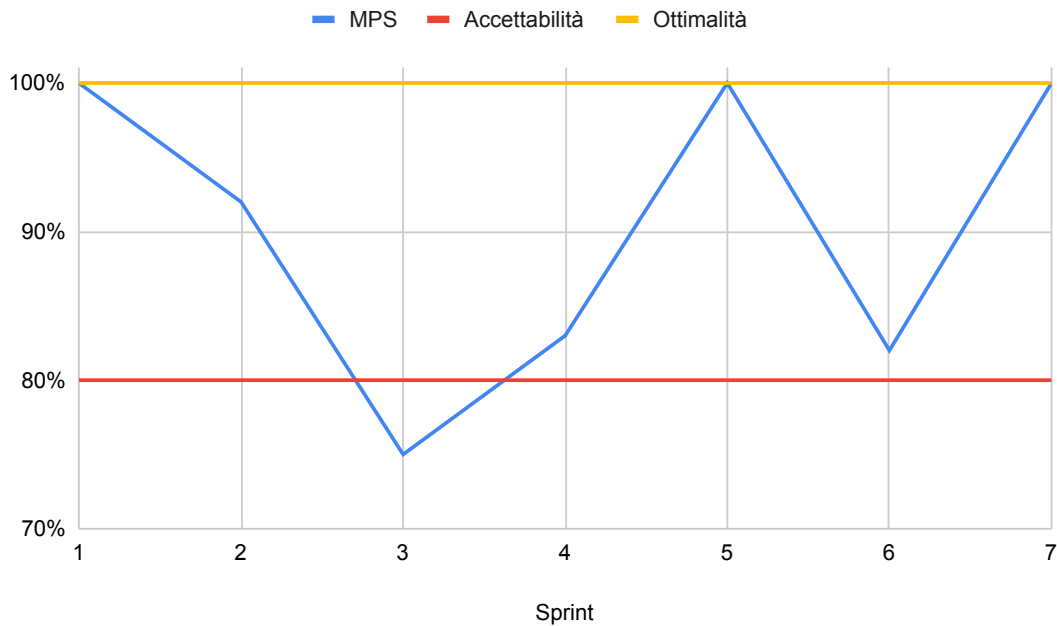


Figura 11: Valutazione *Percentuale di Metriche Soddisfatte*

## 7 Iniziative di miglioramento

Le iniziative di miglioramento hanno lo scopo di analizzare l'andamento del progetto, soprattutto i problemi, e applicare correzioni incrementalmente sia ai processi interni che al prodotto. Il gruppo adotta un approccio basato sul miglioramento continuo per minimizzare i rischi e massimizzare l'efficienza.

## 7.1 Valutazione sull'organizzazione

| Problema                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Azioni di correzione                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificazione e dimensionamento $task_G$          | Inesperienza iniziale (Sprint <sub>G</sub> 1) nell'organizzare, dimensionare e portare a compimento le $task_G$ , con conseguente abbassamento del Task <sub>G</sub> Completion Rate (TCR) e scostamenti nei costi (EAC).                       | Migliore calibrazione del team e scomposizione delle $task_G$ in unità più piccole per facilitarne il completamento nei tempi previsti (come dimostrato nei recuperi degli sprint <sub>G</sub> successivi).      |
| Gestione e modellazione dei Requisiti <sub>G</sub> | Numerosi difetti di modellazione nel documento di Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> hanno causato pesanti rallentamenti nello Sprint <sub>G</sub> 3, alzando drasticamente il Merge <sub>G</sub> Rework e l'Issue <sub>G</sub> Reopening Rate. | Organizzazione di sessioni di revisione congiunta prima della stesura definitiva per evitare corpose riscritture strutturali e minimizzare la riapertura delle issue <sub>G</sub> .                              |
| Calibrazione dell'effort economico                 | Tendenza ad accelerare il lavoro (Sprint <sub>G</sub> 2 e 3) accumulando anticipo sulla schedulazione ma causando frequenti sforamenti del budget <sub>G</sub> e Cost Variance negative.                                                        | Maggiore attenzione al bilanciamento tra l'Earned Value e l'Actual Cost <sub>G</sub> , stabilizzando l'impiego delle ore produttive per non superare il costo pianificato (risolto nello Sprint <sub>G</sub> 5). |

Tabella 26: Azioni adottate per migliorare l'organizzazione.

## 7.2 Valutazione sui ruoli

| Problema                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Azioni di correzione                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinamento dei redattori in gruppi numerosi   | Iniziali incomprensioni sul lavoro da svolgere a causa della mancanza di esperienza pregressa in un team così numeroso, sfociate in sovrascritture di porzioni di documenti.                                  | Definizione di confini più rigidi nell'assegnazione <sub>G</sub> dei compiti ai singoli redattori per prevenire la sovrapposizione del lavoro e l'annullamento delle Pull Request <sub>G</sub> .                                               |
| Verifica <sub>G</sub> formale e controllo logico | I verificatori si sono inizialmente affidati eccessivamente ai correttori ortografici, tralasciando discrepanze logiche (formule smentite dai dati testuali) e sviste nel "copia e incolla" delle didascalie. | Integrazione <sub>G</sub> di una checklist di verifica <sub>G</sub> semantica e strutturale (matching dei dati tra tabelle e testo, controllo incrociato delle definizioni metriche) obbligatoria per il ruolo del Verificatore <sub>G</sub> . |

Tabella 27: Azioni adottate per migliorare la gestione dei ruoli.

## 7.3 Valutazione sugli strumenti

| Problema                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Azioni di correzione                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Co-working tramite GitHub <sub>G</sub> | L'inesperienza iniziale di tutti i membri con lo strumento di versioning GitHub <sub>G</sub> ha portato a conflitti e difficoltà nella gestione collaborativa (alto Merge <sub>G</sub> Rework iniziale).                             | Adozione di workflow <sub>G</sub> condivisi e rigidi per l'apertura, revisione e approvazione <sub>G</sub> delle Pull Request <sub>G</sub> , uniti alla fisiologica esperienza maturata dal team sul campo. |
| ITS inesistente                        | All'inizio del progetto il gruppo non adoperava strumenti di <i>Issue Tracking System</i> che non permettevano quindi di sapere chi-fa-cosa-quando in tempi ragionevoli e alzava la probabilità di conflitti di merge <sub>G</sub> . | Adozione dell'ITS GitHub <sub>G</sub> Project per l'assegnazione <sub>G</sub> , la misurazione e la rendicontazione delle issue <sub>G</sub> .                                                              |

Tabella 28: Azioni adottate per migliorare l'uso degli strumenti.
