



Piano di Progetto

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.2.0	2026-07-21	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.2.0	2026-07-21	D. Facco	A. Menegaldo	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #8, ricalibrazione del preventivo a finire e aggiornamento dell'analisi dei rischi (RO-6, RO-8)
1.0.0	2026-07-07	-	-	D. Facco	Approvazione della revisione del documento per l'ingresso nella baseline di RTB, sulla base del lavoro di stesura e verifica tracciato nelle righe sottostanti
0.15.0	2026-07-06	S. Vendramin	A. Marini	-	Revisione stima dei costi (riduzione ore Progettista nel preventivo a finire) e stima temporale
0.14.0	2026-07-02	A. Marini	E. De Piccoli	-	Rettifica consuntivo Sprint #6, stesura preventivo Sprint #7
0.13.0	2026-06-24	A. Menegaldo	S. Vendramin	-	Stesura consuntivo Sprint #6
0.12.0	2026-06-19	A. Marini	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #6
0.11.1	2026-06-17	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Sistemazione errori ortografici
0.11.0	2026-06-16	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura preventivo e consuntivo Sprint #5
0.10.0	2026-06-11	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione Sprint #5 e rettifica consuntivo Sprint #1
0.9.0	2026-05-22	D. Facco	A. Marini	-	Miglioramento consuntivo
0.8.0	2026-05-19	A. Menegaldo	A. Marini	-	Aggiornamento sezione Analisi dei rischi
0.7.0	2026-05-14	D. Facco	A. Marini	-	Pianificazione e preventivo Sprint #4
0.6.0	2026-05-11	L. Battistella	S. Vendramin	-	Stesura Consuntivo Sprint #3
0.5.0	2026-05-02	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #3
0.4.0	2026-04-27	A. Marini	D. Facco	-	Consuntivo Sprint #2 e aggiunta sezioni §3, §4, §5
0.3.0	2026-04-18	S. Vendramin	E. De Piccoli	-	Pianificazione e preventivo Sprint #2 e stesura Analisi dei rischi
0.2.0	2026-04-13	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura Consuntivo Sprint #1 e inizio Analisi dei rischi
0.1.0	2026-04-03	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Struttura del documento, introduzione e pianificazione Sprint #1

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti Normativi	1
1.3.2	Riferimenti Informativi	2
1.4	Glossario	2
1.5	Note organizzative	2
2	Analisi e Gestione dei Rischi	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Rischi tecnologici	3
2.2.1	RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate	3
2.2.2	RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo	4
2.2.3	RT-3: Presenza di errori nel codice	4
2.3	Rischi organizzativi	5
2.3.1	RO-1: Periodi di rallentamento	5
2.3.2	RO-2: Incomprensioni comunicative	6
2.3.3	RO-3: Contrasti interni al gruppo	6
2.3.4	RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate	7
2.3.5	RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	7
2.3.6	RO-6: Errori di pianificazione	8
2.3.7	RO-7: Rotazione dei ruoli	9
2.3.8	RO-8: Errata stima delle attività	10
2.4	Rischi relativi al prodotto	10
2.4.1	RP-1: Errata comprensione del capitolato	10
2.4.2	RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente	11
2.5	Tabella riassuntiva dei rischi	12
2.5.1	Legenda dei valori	12
3	Modello di sviluppo	13
4	Stima temporale del progetto	13
5	Stima dei costi	14
5.1	Distribuzione delle ore per ruolo	14
6	Pianificazione	15
6.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	15
6.1.1	Obiettivi	15
6.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	16
6.2.1	Obiettivi	16
6.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	17
6.3.1	Obiettivi	17
6.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	18
6.4.1	Obiettivi	18
6.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	19
6.5.1	Obiettivi	19

6.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	20
6.6.1	Obiettivi	20
6.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	21
6.7.1	Obiettivi	21
6.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	22
6.8.1	Obiettivi	22
7	Preventivo	23
7.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	23
7.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	25
7.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	26
7.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	28
7.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	29
7.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	31
7.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	32
7.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	34
8	Consuntivo	35
8.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	36
8.1.1	Revisione delle attività	37
8.1.2	Retrospectiva	38
8.1.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	38
8.1.3.1	Pianificazione futura	39
8.1.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	39
8.1.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	39
8.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	40
8.2.1	Revisione delle attività	42
8.2.2	Retrospectiva	42
8.2.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	43
8.2.3.1	Pianificazione futura	44
8.2.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	44
8.2.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	44
8.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	45
8.3.1	Revisione delle attività	47
8.3.2	Retrospectiva	48
8.3.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	48
8.3.3.1	Pianificazione futura	48
8.3.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	49
8.3.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	49
8.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	50
8.4.1	Revisione delle attività	51
8.4.2	Retrospectiva	52
8.4.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	53
8.4.3.1	Pianificazione futura	54
8.4.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	54
8.4.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	54
8.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	56
8.5.1	Revisione delle attività	57
8.5.2	Retrospectiva	58

8.5.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	59
8.5.3.1	Pianificazione futura	59
8.5.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	59
8.5.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	59
8.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	60
8.6.1	Revisione delle attività	62
8.6.2	Retrospettiva	62
8.6.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	63
8.6.3.1	Pianificazione futura	63
8.6.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	63
8.6.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	63
8.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	64
8.7.1	Revisione delle attività	66
8.7.2	Retrospettiva	66
8.7.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	67
8.7.3.1	Pianificazione futura	67
8.7.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	67
8.7.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	67
8.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	67
8.8.1	Consuntivo di periodo	69
8.8.2	Retrospettiva	70
8.8.3	Misure correttive	70
8.8.3.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	71
8.8.4	Miglioramento della pianificazione futura	71
8.8.5	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	72

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto rappresenta il documento di riferimento per la gestione organizzativa, temporale ed economica del progetto. Esso ha lo scopo di descrivere le modalità con cui il gruppo intende pianificare, coordinare e controllare le attività necessarie alla realizzazione del prodotto software.

Il documento permette di definire una visione d'insieme del lavoro da svolgere, individuando le attività principali, le risorse coinvolte, le responsabilità assegnate e le tempistiche previste. Inoltre, consente di monitorare l'avanzamento del progetto e di confrontare le stime iniziali con i dati effettivamente rilevati durante lo svolgimento delle attività.

Al fine di garantire un controllo efficace del progetto, il Piano di Progetto include:

- l'identificazione e l'analisi dei principali rischi_G di progetto; la definizione delle strategie di mitigazione dei rischi individuati;
- la descrizione del modello di sviluppo adottato;
- la pianificazione temporale delle attività;
- la stima dei costi e delle risorse necessarie;
- la definizione del preventivo e del preventivo a finire;
- la revisione periodica delle attività svolte e la relativa retrospettiva_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto **Second Brain** ha lo scopo di realizzare un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown_G, integrando funzionalità basate su Large Language Models_G per supportare l'utente nella creazione, revisione e rielaborazione dei testi.

L'applicazione si propone di offrire un editor semplice e accessibile, composto da un'area di scrittura e da una vista di anteprima renderizzata, permettendo all'utente di concentrarsi sia sulla stesura del contenuto sia sulla valutazione del risultato finale.

Attraverso l'integrazione con un LLM_G, il sistema deve supportare operazioni come il riassunto, la riscrittura, la traduzione, la correzione e la critica del testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare. Inoltre, il prodotto deve permettere la generazione automatica di un testo completo a partire da un prompt fornito dall'utente.

Lo scopo finale è verificare la potenzialità degli LLM_G nell'assistere una persona nei compiti legati alla scrittura, allo sviluppo di idee e al brainstorming_G, realizzando uno strumento organico, semplice da utilizzare e utile anche per utenti non esperti.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

Ultimo accesso: 3 giugno 2026

- **Regolamento del Progetto Didattico:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

Ultimo accesso: 14 maggio 2026

- **Norme di Progetto v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Corso di Ingegneria del Software – I processi di ciclo di vita del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

Ultimo accesso: 11 giugno 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Modelli di sviluppo del Software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf>

Ultimo accesso: 23 maggio 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Gestione di Progetto:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

Ultimo accesso: 6 giugno 2026

- **Glossario v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.4 Glossario

Per garantire una comprensione uniforme dei termini utilizzati nella documentazione, il gruppo mette a disposizione un **Glossario**. Questo documento raccoglie le definizioni dei termini tecnici, degli acronimi e delle espressioni che potrebbero risultare ambigue o assumere un significato specifico nel contesto del progetto.

All'interno dei documenti, i termini presenti nel Glossario vengono indicati mediante una formattazione dedicata, ovvero con la lettera *G* posta in pedice. Tale convenzione permette al lettore di riconoscere facilmente i concetti definiti formalmente e favorisce l'uso coerente del linguaggio in tutta la documentazione prodotta.

1.5 Note organizzative

Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti periodici, in modo da rispecchiare l'evoluzione del progetto e le decisioni assunte dal gruppo nel corso delle diverse attività. La sua revisione continua consente di mantenere allineata la pianificazione con lo stato effettivo dei lavori e di controllare con maggiore precisione l'avanzamento complessivo.

Ogni modifica rilevante viene riportata nel Registro delle modifiche, così da conservare una traccia chiara delle revisioni effettuate, dei responsabili coinvolti e dello stato di maturazione del documento.

2 Analisi e Gestione dei Rischi

2.1 Introduzione

L'attività di analisi dei rischi_G ha l'obiettivo di identificare, valutare e gestire preventivamente quegli eventi che potrebbero compromettere il corretto svolgimento dei task_G e il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Per ogni rischio individuato, il gruppo ne valuta la **probabilità** di occorrenza e la **gravità** dell'impatto, definendo specifiche contromisure per mitigarli.

I rischi sono identificati tramite una sigla univoca così composta:

R[Tipo]-[Numero]

- **R**: indica che si tratta di un Rischio_G;
- **Tipo**: rappresenta la categoria del rischio:
 - **T**: Tecnologico;
 - **O**: Organizzativo;
 - **P**: Relativo al Prodotto.
- **Numero**: identificativo numerico progressivo all'interno della categoria.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate

- **Codice**: RT-1
- **Nome**: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate
- **Descrizione**: Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo di alcune tecnologie fondamentali per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*. In particolare, il rischio riguarda Python_G per la componente back-end, React_G per la realizzazione dell'interfaccia utente, le API_G per l'interazione con gli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. La limitata familiarità iniziale con tali tecnologie potrebbe causare rallentamenti nelle attività di progettazione, sviluppo e integrazione, soprattutto nelle prime fasi del progetto.
- **Strategie di rilevamento**: Il Responsabile monitora periodicamente l'avanzamento dei task_G assegnati, verificando eventuali ritardi riconducibili a difficoltà tecniche. Durante gli sprint_G, il gruppo raccoglie feedback dai singoli membri per individuare tempestivamente eventuali lacune. L'utilizzo di GitHub_G e dell'integrazione continua permette inoltre di rilevare errori ricorrenti nell'uso delle tecnologie adottate, specialmente durante le fasi di integrazione tra front-end, back-end e servizi LLM_G.
- **Contromisure**: Il gruppo prevede attività di studio e momenti di condivisione interna sulle tecnologie meno note. I membri con maggiore esperienza supportano chi incontra difficoltà, in particolare nelle attività più delicate, come la configurazione dell'ambiente di sviluppo, l'integrazione con le API_G degli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. In caso di dubbi sulle tecnologie proposte o sulle modalità di integrazione, il team potrà richiedere chiarimenti alla Proponente_G. Qualora una tecnologia risultasse poco adatta o troppo onerosa, potranno essere valutate soluzioni alternative compatibili con il capitolato C6.
- **Probabilità**: Alta
- **Pericolosità**: Alta

2.2.2 RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo

- **Codice:** RT-2
- **Nome:** Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo corretto degli strumenti a supporto dello sviluppo, della documentazione e della gestione del progetto. In particolare, il rischio riguarda l'uso di GitHub_G per il versionamento del codice e della documentazione, la gestione di branch_G, pull request_G, issue_G e milestone_G, oltre alla produzione della documentazione in LaTeX_G. Una gestione non uniforme di tali strumenti potrebbe causare conflitti tra versioni, errori di integrazione, rallentamenti nella revisione del lavoro e difficoltà nel mantenere allineati prodotto software e documentazione.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile controlla periodicamente l'utilizzo degli strumenti condivisi, verificando la corretta apertura e chiusura delle issue_G, l'aggiornamento delle attività assegnate e la coerenza tra branch_G, pull request_G e versioni dei documenti. Durante gli sprint_G, il gruppo monitora eventuali errori ricorrenti nei commit_G, nei merge_G e nella compilazione della documentazione. Le difficoltà vengono inoltre rilevate attraverso il confronto interno durante le riunioni di coordinamento.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce procedure operative comuni all'interno delle Norme di Progetto_G, così da uniformare l'uso degli strumenti e ridurre ambiguità nel modo di lavorare. Vengono predisposti template_G per documenti, issue_G, pull request_G e verbali, in modo da rendere più semplice e controllabile il lavoro dei singoli membri. I membri con maggiore esperienza affiancano chi incontra difficoltà, specialmente nelle attività più delicate come merge_G, rilascio delle versioni e aggiornamento del sito pubblico.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Media

2.2.3 RT-3: Presenza di errori nel codice

- **Codice:** RT-3
- **Nome:** Presenza di errori nel codice
- **Descrizione:** Durante lo sviluppo del prodotto *Second Brain* potrebbero essere introdotti errori nel codice, dovuti alla complessità dell'integrazione tra le diverse componenti del sistema. Il rischio riguarda in particolare la comunicazione tra front-end React_G e back-end Python_G, l'interazione con le API_G degli LLM_G, la gestione del testo Markdown_G, il salvataggio delle note e l'eventuale persistenza server-side. Alcuni difetti potrebbero non emergere immediatamente durante la scrittura del codice, ma solo in fase di test_G, integrazione o utilizzo del prodotto, causando ritardi nelle attività pianificate.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo rileva questo rischio attraverso l'esecuzione periodica di test_G, la revisione del codice e il controllo delle funzionalità implementate rispetto ai casi d'uso_G e ai requisiti individuati. Le pull request_G vengono verificate prima dell'integrazione nel branch_G principale, così da individuare errori logici, problemi di compatibilità o regressioni. Particolare attenzione viene posta alle funzionalità più critiche, come l'invio di richieste agli LLM_G, la gestione degli errori di risposta, il salvataggio dei dati e il corretto aggiornamento dell'interfaccia utente.

- **Contromisure:** Per ridurre l'impatto del rischio, il gruppo adotta una strategia di sviluppo incrementale, evitando di integrare grandi quantità di codice non verificato. Ogni funzionalità viene testata prima dell'integrazione definitiva e, in caso di errore, il componente responsabile procede inizialmente con l'analisi e la correzione del problema. Se l'anomalia risulta complessa, viene richiesto il supporto dei membri più esperti del team. In presenza di errori critici, il gruppo dà priorità al debugging_G e può riorganizzare la pianificazione, posticipando attività secondarie per preservare la stabilità del prodotto.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3 Rischi organizzativi

2.3.1 RO-1: Periodi di rallentamento

- **Codice:** RO-1
- **Nome:** Periodi di rallentamento
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe subire rallentamenti nello svolgimento delle attività a causa di periodi dell'anno caratterizzati da minore disponibilità dei membri, come festività, sessioni d'esame e vacanze estive. Tale rischio può incidere sull'avanzamento del progetto *Second Brain*, soprattutto nelle fasi in cui sono richieste attività coordinate tra più componenti del team. Se non gestito correttamente, il rallentamento potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze pianificate e ridurre il margine disponibile per correzioni o attività di verifica.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora periodicamente le ore rendicontate dai membri del gruppo e confronta l'avanzamento effettivo dei task_G con quanto previsto dalla pianificazione dello sprint_G. Particolare attenzione viene posta ai periodi in cui è prevedibile una minore disponibilità, come festività, sessioni d'esame e vacanze. Durante le riunioni interne, il team verifica eventuali ritardi, attività bloccate o carichi di lavoro non sostenibili, così da individuare tempestivamente situazioni che potrebbero influire sulla consegna degli incrementi previsti.
- **Contromisure:** La pianificazione del progetto tiene conto dei periodi di minore disponibilità, distribuendo le attività più critiche nei momenti in cui il gruppo può garantire maggiore continuità di lavoro. In caso di rallentamenti, il Responsabile può riassegnare i task_G, anticipare attività meno dipendenti da altri membri oppure posticipare attività secondarie, dando priorità agli elementi necessari per rispettare gli obiettivi del capitolato C6 e mantenere stabile l'avanzamento del prodotto.
- **Periodi critici previsti:**

Periodo	Motivazione
Periodo pasquale	Possibile riduzione della disponibilità dovuta a festività e spostamenti personali.
Sessione estiva	Possibile sovrapposizione tra attività di progetto, studio individuale ed esami universitari.
Agosto	Possibile rallentamento generale dovuto a vacanze e minore reperibilità dei membri del gruppo.

- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

2.3.2 RO-2: Incomprensioni comunicative

- **Codice:** RO-2
- **Nome:** Incomprensioni comunicative
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella comunicazione interna, con il rischio che alcune informazioni vengano trasmesse in modo incompleto, poco chiaro o non uniforme tra i membri del team. Questo potrebbe portare a interpretazioni diverse degli obiettivi del progetto, dei requisiti del capitolato C6 o delle attività assegnate durante gli sprint_G.
- **Strategie di rilevamento:** Tutti i componenti del gruppo sono tenuti a collaborare attivamente nel rilevare eventuali dubbi, ambiguità o disallineamenti informativi. Durante gli incontri interni, ciascun membro può segnalare difficoltà nella comprensione dei task_G, delle decisioni prese o delle responsabilità assegnate. Il gruppo monitora inoltre lo stato delle issue_G, dei verbali, delle attività pianificate e dell'avanzamento dei lavori, così da individuare tempestivamente eventuali incoerenze tra quanto deciso e quanto effettivamente svolto. Il Responsabile mantiene una funzione di coordinamento, ma il controllo della chiarezza comunicativa è condiviso da tutto il team.
- **Contromisure:** Il gruppo utilizza canali di comunicazione ufficiali e condivisi, evitando che decisioni importanti rimangano disperse in conversazioni informali o private. Ogni riunione viene accompagnata da un verbale in cui vengono riportate decisioni, responsabilità assegnate, scadenze e problemi emersi. I membri del team sono invitati a chiedere chiarimenti appena rilevano dubbi, senza attendere fasi successive dello sprint_G. Le decisioni tecniche e organizzative rilevanti vengono documentate nelle Norme di Progetto_G o nei documenti opportuni, così da mantenere una fonte comune e consultabile.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.3 RO-3: Contrasti interni al gruppo

- **Codice:** RO-3
- **Nome:** Contrasti interni al gruppo
- **Descrizione:** Durante il ciclo di vita del progetto potrebbero sorgere divergenze di opinione tra i membri del team riguardo a scelte tecniche (es. architettura del sistema), metodologiche (es. gestione dei task) o organizzative. Tali contrasti, se non gestiti tempestivamente, possono deteriorare il clima lavorativo, ridurre la motivazione e causare situazioni di stallo operativo.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile ha il compito di monitorare il clima durante le riunioni e le interazioni sui canali di comunicazione. Eventuali segnali di tensione, scarsa partecipazione o disaccordo persistente vengono discussi apertamente durante i momenti di retrospettiva_G.

- **Contromisure:** Il gruppo adotta un approccio democratico: ogni decisione rilevante viene discussa collettivamente. In caso di mancato accordo, la decisione finale spetta al Responsabile di progetto in carica o, se necessario, tramite votazione a maggioranza semplice. Si promuove una cultura del riscontro costruttivo per risolvere i problemi sul nascere.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.4 RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate

- **Codice:** RO-4
- **Nome:** Risorse disponibili ma non impiegate
- **Descrizione:** Durante lo svolgimento degli sprint_G, potrebbe verificarsi una situazione in cui uno o più membri del gruppo terminano i task_G assegnati in anticipo rispetto alla pianificazione o si ritrovano impossibilitati a procedere a causa di dipendenze bloccanti da parte di altri componenti. Tale inefficienza porta a uno spreco di risorse orarie che, se non riallocate, riducono la produttività globale e rischiano di sovraccaricare il team nelle fasi finali del progetto.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora costantemente lo stato delle issue_G sul repository_G GitHub. Durante i brevi incontri di allineamento interni, ogni membro segnala la propria disponibilità residua o eventuali blocchi operativi che impediscono l'avanzamento dei compiti.
- **Contromisure:** Il gruppo mantiene un backlog_G di attività secondarie o task_G di miglioramento (es. perfezionamento della documentazione, incremento della copertura dei test, ricerca tecnologica) a cui i membri "scarichi" possono dedicarsi. In alternativa, si promuove il supporto collaborativo tramite pair programming_G o attività di verifica incrociata su task particolarmente complessi o critici.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.5 RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo

- **Codice:** RO-5
- **Nome:** Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella gestione collaborativa di un progetto software complesso come *Second Brain*, che richiede coordinamento tra attività di analisi, progettazione, sviluppo, verifica e documentazione. La presenza di componenti diverse, come interfaccia React_G, back-end Python_G, integrazione con API_G di LLM_G, gestione delle note e produzione della documentazione, rende necessario un lavoro organizzato e coerente tra tutti i membri. Una scarsa esperienza nel lavoro di gruppo potrebbe causare sovrapposizioni nei task_G, distribuzione non equilibrata delle attività, difficoltà nell'integrazione del codice o ritardi nella consegna degli incrementi previsti.

- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo monitora periodicamente l'avanzamento delle attività assegnate, verificando che ogni membro abbia compreso il proprio compito e che non vi siano sovrapposizioni o attività lasciate scoperte. Durante le riunioni interne vengono discussi lo stato dei task_G, eventuali blocchi, problemi di coordinamento e difficoltà nell'integrazione del lavoro svolto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G, branch_G e pull request_G consente inoltre di individuare tempestivamente disallineamenti tra le attività pianificate e quelle realmente completate.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce nelle Norme di Progetto_G un workflow_G condiviso, così da stabilire regole comuni per assegnazione dei task_G, gestione dei branch_G, apertura delle pull request_G, revisione del lavoro e integrazione degli incrementi. Le attività vengono suddivise in modo chiaro e tracciabile, evitando che più persone lavorino inconsapevolmente sulla stessa parte o che alcune sezioni del progetto rimangano prive di responsabili operativi. Tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.6 RO-6: Errori di pianificazione

- **Codice:** RO-6
- **Nome:** Errori di pianificazione
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe pianificare in modo non adeguato le attività necessarie allo sviluppo di *Second Brain*, sottostimando la complessità di alcuni task_G o non considerando correttamente le dipendenze tra le diverse parti del progetto. Questo rischio può riguardare, ad esempio, l'integrazione tra front-end React_G, back-end Python_G, API_G degli LLM_G, gestione della persistenza, rendering Markdown_G, test e documentazione. Una pianificazione poco precisa potrebbe causare ritardi, sovraccarico di alcuni membri, attività svolte in ordine non ottimale o difficoltà nel rispettare le scadenze previste.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo controlla periodicamente l'avanzamento delle attività confrontando quanto pianificato con quanto effettivamente completato. Durante le riunioni interne vengono analizzati eventuali scostamenti rispetto alle stime iniziali, task_G bloccati, dipendenze non considerate o attività che richiedono più tempo del previsto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G e strumenti di tracciamento permette di individuare tempestivamente ritardi o squilibri nella distribuzione del lavoro.
- **Contromisure:** La pianificazione viene riesaminata a ogni sprint_G, così da correggere eventuali stime troppo ottimistiche e adattare il piano allo stato reale del progetto. Il gruppo mantiene margini di flessibilità nella suddivisione delle attività, dando priorità ai requisiti obbligatori e alle componenti più critiche del capitolato C6. Tutti i membri collaborano alla revisione delle stime, segnalando tempestivamente difficoltà, dipendenze non previste o carichi di lavoro eccessivi. In caso di ritardi, il gruppo può riassegnare alcune attività, ridurre temporaneamente il lavoro su funzionalità opzionali o riorganizzare le priorità per garantire il completamento degli obiettivi principali. A seguito dello Sprint_G #8 il Responsabile_G pianifica inoltre, per ogni periodo, un insieme di attività indipendenti

dai riscontri esterni e dagli incontri con la committenza_G, da assegnare ai membri temporaneamente bloccati; ogni attività che modifica requisiti_G, casi d'uso_G o loro tracciamenti viene stimata includendo esplicitamente l'aggiornamento dei documenti collegati.

- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Bassa* a *Media*. Nel corso dello Sprint_G #8 il rischio_G si è effettivamente manifestato: la pianificazione_G non aveva considerato le dipendenze fra la revisione dei requisiti_G non funzionali e i documenti da essa derivati, e l'avvio della fase di Product Baseline_G è risultato subordinato all'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, comprimendo le attività di progettazione_G nella seconda metà del periodo.

2.3.7 RO-7: Rotazione dei ruoli

- **Codice:** RO-7
- **Nome:** Rotazione dei ruoli
- **Descrizione:** Ogni componente del gruppo deve ricoprire, a rotazione, i diversi ruoli previsti dal regolamento del progetto. Questa modalità di lavoro può generare difficoltà organizzative, soprattutto all'inizio di ogni sprint_G, quando un membro assume un ruolo con cui ha poca esperienza o deve proseguire attività precedentemente gestite da altri. Nel caso del progetto *Second Brain*, questo rischio può incidere sia sulle attività tecniche, come sviluppo front-end React_G, back-end Python_G e integrazione con API_G LLM_G, sia sulle attività documentali e di verifica. L'impatto può aumentare nel tempo, poiché il materiale prodotto diventa progressivamente più ampio e complesso da comprendere, controllare e aggiornare.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente se il cambio di ruolo sta causando rallentamenti, dubbi operativi o difficoltà nella presa in carico delle attività. Durante le riunioni di pianificazione e retrospettiva vengono raccolti feedback dai membri che hanno cambiato ruolo, così da individuare eventuali problemi ricorrenti. La rendicontazione delle ore, l'avanzamento dei task_G e lo stato delle issue_G permettono inoltre di riconoscere tempestivamente eventuali squilibri o ritardi legati alla rotazione.
- **Contromisure:** Le Norme di Progetto_G definiscono in modo chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo, così da ridurre ambiguità durante il passaggio da uno sprint_G al successivo. Prima di ogni rotazione, il membro uscente deve lasciare indicazioni comprensibili sul lavoro svolto, sui problemi aperti e sulle attività ancora da completare. Durante le riunioni interne, il gruppo dedica tempo al passaggio di consegne e alla chiarificazione dei compiti assegnati. In caso di difficoltà, i membri con maggiore familiarità con un ruolo o con una specifica attività supportano chi subentra, evitando che la rotazione comprometta la continuità del lavoro.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3.8 RO-8: Errata stima delle attività

- **Codice:** RO-8
- **Nome:** Errata stima delle attività
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe sottostimare o sovrastimare il tempo, le risorse o la complessità necessari per completare alcune attività del progetto. Nel caso del prodotto *Second Brain*, questo rischio può riguardare sia attività di sviluppo, come l'integrazione con gli LLM_G, la gestione del rendering Markdown_G o la persistenza delle note, sia attività documentali e di verifica. Una sottostima può causare ritardi e sovraccarico di lavoro, mentre una sovrastima può portare a una pianificazione poco efficiente delle risorse disponibili.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo confronta periodicamente le ore preventivate con quelle effettivamente impiegate per ciascun task_G. Durante le riunioni di avanzamento e retrospettiva vengono analizzati eventuali scostamenti significativi rispetto alla pianificazione iniziale, così da individuare attività più complesse o più semplici del previsto.
- **Contromisure:** Il gruppo aggiorna la pianificazione in modo incrementale, correggendo le stime sulla base dei dati raccolti durante gli sprint_G. Le attività più incerte vengono suddivise in task_G più piccoli e controllabili. In caso di sottostima, il gruppo può ridefinire le priorità, riallocare le risorse o posticipare attività meno urgenti. In caso di sovrastima, il tempo disponibile può essere destinato al miglioramento della qualità, alla verifica o alla documentazione. A seguito dello Sprint_G #8 le scelte architetturali sono precedute da una sessione di istruttoria preliminare, nella quale i Progettisti_G producono un elenco motivato dei pattern_G candidati prima di formulare qualsiasi stima; alle attività prive di precedenti storici viene inoltre applicato un margine esplicito in luogo della stima puntuale, e il confronto fra preventivo_G e consuntivo_G viene svolto per singolo ruolo e non solo sul totale di periodo.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Media* ad *Alta*. Nello Sprint_G #8 la sottostima si è manifestata simultaneamente sui ruoli Analista_G e Progettista_G, con uno scostamento_G complessivo di 10 ore sui due ruoli, e ha riguardato attività affrontate dal gruppo per la prima volta, quali la definizione dell'architettura_G generale e la formalizzazione dei requisiti_G non funzionali in forma misurabile, per le quali non erano disponibili dati storici di riferimento.

2.4 Rischi relativi al prodotto

2.4.1 RP-1: Errata comprensione del capitolato

- **Codice:** RP-1
- **Nome:** Errata comprensione del capitolato
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe interpretare in modo non corretto alcuni requisiti_G presenti nel capitolato_G C6 - *Second Brain*, oppure non individuare correttamente alcune funzionalità richieste dalla Proponente_G. Questo rischio potrebbe portare alla realizzazione di un prodotto non pienamente conforme alle aspettative, soprattutto per quanto

riguarda l'integrazione con gli LLM_G, il supporto a Markdown_G, la gestione delle note e le funzionalità opzionali come persistenza server-side, collegamento tra note e RAG_G.

- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente la coerenza tra requisiti_G, casi d'uso_G e contenuto del capitolato_G. Durante le riunioni interne vengono discussi eventuali punti ambigui e confrontate le interpretazioni dei membri del team. Inoltre, il documento di Analisi dei Requisiti viene aggiornato in modo incrementale per correggere eventuali imprecisioni emerse durante l'avanzamento del progetto.
- **Contromisure:** In presenza di dubbi o ambiguità, il gruppo si impegna a contattare la Proponente_G per ottenere chiarimenti ufficiali. Viene inoltre mantenuta una tracciabilità esplicita tra requisiti_G, fonti e casi d'uso_G, così da ridurre il rischio di introdurre funzionalità non richieste o di trascurare elementi obbligatori. Le dispense del corso e il regolamento del progetto vengono utilizzati come supporto metodologico per svolgere correttamente l'analisi.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.4.2 RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente

- **Codice:** RP-2
- **Nome:** Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente
- **Descrizione:** Il successo del progetto *Second Brain* dipende in parte dalla possibilità di confrontarsi con la Proponente per validare scelte progettuali, chiarire requisiti ambigui o risolvere dubbi tecnici specifici (es. limiti delle API_G o criteri di valutazione delle risposte degli LLM_G). Una ridotta disponibilità o tempi di risposta prolungati da parte dei referenti aziendali potrebbero causare stalli decisionali, costringendo il gruppo ad assumere decisioni basate su interpretazioni autonome che potrebbero non essere conformi alle aspettative finali.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora la frequenza e l'esito dei contatti con la Proponente. Segnali di allerta sono rappresentati da mancate risposte alle email di chiarimento entro i tempi previsti dalle Norme di Progetto_G o dall'impossibilità di fissare gli incontri di allineamento periodici necessari per la verifica degli incrementi.
- **Contromisure:** Il gruppo si impegna a raggruppare i dubbi e le richieste di chiarimento in liste strutturate, inviandole con congruo anticipo rispetto alle scadenze interne. In caso di prolungata assenza di supporto, il team documenta formalmente nei verbali le decisioni assunte in autonomia e le relative motivazioni, in modo da poterle discutere rapidamente al primo incontro utile. Si cercherà inoltre di mantenere una pianificazione flessibile che permetta di spostare l'effort su task_G meno dipendenti dal feedback esterno.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.5 Tabella riassuntiva dei rischi

Codice	Nome del Rischio	Probabilità	Pericolosità
Rischi Tecnologici			
RT-1	Scarsa esperienza con le tecnologie	Alta	Alta
RT-2	Scarsa esperienza strumenti di sviluppo	Media	Media
RT-3	Presenza di errori nel codice	Alta	Media
Rischi Organizzativi			
RO-1	Periodi di rallentamento	Media	Alta
RO-2	Incomprensioni comunicative	Alta	Media
RO-3	Contrasti interni al gruppo	Bassa	Bassa
RO-4	Risorse disponibili ma non impiegate	Media	Bassa
RO-5	Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	Alta	Media
RO-6	Errori di pianificazione	Media	Alta
RO-7	Rotazione dei ruoli	Alta	Alta
RO-8	Errata stima delle attività	Alta	Alta
Rischi di Prodotto			
RP-1	Errata comprensione del capitolato	Bassa	Media
RP-2	Mancanza di supporto della Proponente	Bassa	Media

Tabella 1: Tabella riassuntiva dell'analisi dei rischi

2.5.1 Legenda dei valori

Per la valutazione dei rischi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Probabilità:**

- **Bassa:** l'evento è improbabile o legato a circostanze eccezionali;
- **Media:** l'evento è possibile e si è verificato saltuariamente in contesti simili;
- **Alta:** l'evento è molto probabile o quasi certo a causa della natura del progetto.

- **Pericolosità:**

- **Bassa:** impatto minimo, risolvibile con azioni correttive immediate;
- **Media:** impatto moderato, può causare lievi ritardi o richiedere riallocazione di risorse;
- **Alta:** impatto critico, può compromettere milestone o la stabilità del prodotto finale.

3 Modello di sviluppo

Per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*, il gruppo ha scelto di adottare un modello di sviluppo di tipo Agile_G. Tale scelta è motivata dalla necessità di mantenere un'elevata flessibilità durante l'intero ciclo di vita del progetto, permettendo al team di adattarsi progressivamente a nuove esigenze, chiarimenti della Proponente_G e possibili modifiche nella comprensione del capitolato_G.

Il gruppo ha deciso di organizzare il lavoro in sprint_G, ovvero periodi di durata prestabilita, generalmente pari a due settimane. Ogni sprint_G prevede la selezione di un insieme di attività da completare, in modo da produrre un incremento verificabile del prodotto o della documentazione.

Nello specifico, il gruppo si ispira ad alcuni eventi del framework Scrum_G, adattandoli al contesto del progetto didattico:

- **Sprint Planning:** all'inizio di ogni sprint_G, il gruppo analizza le attività presenti nel backlog_G e seleziona quelle da svolgere durante l'iterazione. I task_G vengono assegnati ai membri del team tenendo conto delle priorità, delle dipendenze tra attività e della disponibilità oraria di ciascun componente;
- **Sprint Review:** al termine dello sprint_G, il gruppo valuta il lavoro completato e verifica se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti. In questa fase vengono discussi gli incrementi prodotti, eventuali difficoltà incontrate e possibili dubbi da sottoporre alla Proponente_G;
- **Sprint Retrospective:** dopo la revisione dello sprint_G, il gruppo analizza l'andamento dell'iterazione dal punto di vista organizzativo. Vengono individuati gli aspetti positivi, le criticità emerse e le azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

A ogni nuova iterazione viene inoltre pianificata la rotazione dei ruoli prevista dal regolamento del progetto, così da permettere a ciascun membro del gruppo di assumere responsabilità diverse nel corso dello sviluppo. Tale rotazione viene organizzata considerando sia le necessità del progetto sia il carico di lavoro individuale. L'adozione di questo modello consente al gruppo di procedere in modo controllato e progressivo, mantenendo una visione aggiornata dello stato del progetto. Inoltre, permette di integrare in modo più efficace i riscontri ricevuti, riducendo il rischio di sviluppare funzionalità non coerenti con le aspettative della Proponente_G o con i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti.

4 Stima temporale del progetto

La pianificazione temporale del progetto è organizzata attorno alle principali revisioni di avanzamento previste dal percorso didattico: la **RTB_G** (*Requirements and Technology Baseline*) e la **PB_G** (*Product Baseline*). Tali revisioni rappresentano due momenti fondamentali per verificare lo stato del lavoro svolto, la qualità della documentazione prodotta e l'avanzamento del prodotto software. Il calendario iniziale è stato definito sulla base delle attività individuate, delle disponibilità dei membri del gruppo e dell'analisi preliminare dei rischi. Tuttavia, trattandosi di una stima formulata nelle prime fasi del progetto, le date previste possono subire variazioni durante lo sviluppo.

Per questo motivo, ogni sprint_G comprende una fase di pianificazione e una fase di consuntivo. La sezione di consuntivo permette di confrontare le stime iniziali con il tempo effettivamente impiegato, individuando eventuali scostamenti e aggiornando di conseguenza la pianificazione futura. Questo approccio consente di mantenere il Piano di Progetto coerente con l'andamento reale delle attività, riducendo il rischio di basarsi su previsioni non più attuali e permettendo una gestione più controllata delle risorse disponibili. **Ultimo aggiornamento: 2026-07-07**




Figura 1: Stima temporale delle revisioni di progetto

5 Stima dei costi

Alla luce dell'analisi del capitolato *Second Brain*, dei rischi individuati e delle attività previste per lo sviluppo del prodotto, il gruppo ha elaborato una stima preliminare delle ore necessarie alla realizzazione del progetto. La stima considera le attività associate ai diversi ruoli previsti dal progetto: Responsabile_G, Amministratore_G, Analista_G, Progettista_G, Programmatore_G e Verificatore_G. La distribuzione delle ore è stata definita in modo da garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i membri del gruppo e una copertura adeguata di tutte le fasi del ciclo di vita del software_G. Il gruppo stima un impegno complessivo pari a **623 ore**. Tale valore recepisce la revisione effettuata al termine dello Sprint_G #7: rispetto alla stima iniziale (644 ore), il monte ore del ruolo Progettista_G è stato ridotto in quanto ritenuto sovrastimato, essendo la progettazione stata in gran parte completata durante la fase di RTB_G. Inoltre, viene adottato un modello di rotazione dei ruoli ogni due settimane, così da permettere a ciascun componente di acquisire esperienza trasversale nelle diverse attività progettuali. Il preventivo viene rivalutato e, se necessario, aggiornato migliorativamente al termine di ogni sprint_G.

Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

La tabella seguente riassume, per ciascun ruolo, il monte ore complessivo, il costo orario e il costo totale stimato:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo orario (in €)	Costo totale (in €)
Responsabile di progetto	48	30,00	1.440,00
Amministratore	60	20,00	1.200,00
Analista	62	25,00	1.550,00
Progettista	135	25,00	3.375,00
Programmatore	158	15,00	2.370,00
Verificatore	160	15,00	2.400,00
Totale	623	—	12.335,00

Tabella 2: Stima dei costi per ruolo

5.1 Distribuzione delle ore per ruolo

Ultimo aggiornamento: 2026-07-20

Di seguito è riportato il preventivo “a finire”, ovvero la stima delle ore e dei costi ancora necessari al completamento del progetto, soggetto a miglioramento continuo in base alle considerazioni del consuntivo di periodo. Al termine dello Sprint_G #8 risultano consuntivate complessivamente 410 ore delle 623 preventivate, con 213 ore residue.

La ripartizione è stata ricalibrata a valle dello Sprint_G #8: il monte ore del ruolo Analista_G, risultato negativo a seguito dello sfondamento registrato nella revisione dei requisiti_G non funzionali, è stato riportato in positivo attingendo alle ore del ruolo Progettista_G, la cui attività residua si è ridotta grazie all'analisi dei design pattern_G e dell'architettura_G generale già svolta. Trattandosi di ruoli con identico costo orario, l'operazione lascia invariato il valore economico complessivo delle ore residue e il budget totale del progetto.

Membro	RE	AM	AN	PT	PR	VE	Totale
L. Battistella	2	1	1	5	15	13	37
E. De Piccoli	1	1	1	5	12	10	30
D. Facco	2	1	1	4	12	11	31
A. Marini	1	0	1	4	10	10	26
A. Menegaldo	2	1	2	5	16	15	41
S. Vendramin	1	0	1	4	9	8	23
S. Zecchinato	1	1	1	3	8	11	25
Totale per ruolo	10	5	8	30	82	78	213
Costo totale (in €)	300,00	100,00	200,00	750,00	1.230,00	1.170,00	3.750,00

Tabella 3: Preventivo a finire al termine dello Sprint #8

Legenda dei ruoli:

- **RE**: Responsabile_G;
- **AM**: Amministratore_G;
- **AN**: Analista_G;
- **PT**: Progettista_G;
- **PR**: Programmatore_G;
- **VE**: Verificatore_G.

6 Pianificazione

6.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

6.1.1 Obiettivi

Durante questo primo sprint, è prevista l'attivazione delle fondamenta documentali e dell'infrastruttura di progetto. Un'attenzione particolare viene dedicata all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti*,

con l'obiettivo di individuare gli attori principali del sistema e definire una prima struttura dei casi d'uso_G, fondamentale per comprendere le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- migliorare progressivamente il Way of Working_G, così da rendere più chiara l'organizzazione interna del gruppo;
- iniziare la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, concentrandosi sull'individuazione degli attori, dei loro obiettivi e dei principali casi d'uso_G del sistema;
- definire una prima classificazione delle funzionalità richieste, distinguendo tra operazioni di editing, funzionalità basate su LLM_G e gestione delle note;
- avviare la redazione delle *Norme di Progetto* e del *Piano di Progetto*;
- predisporre la prima bozza del *Glossario*, al fine di uniformare la terminologia tecnica utilizzata nella documentazione;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti;
- tenere un incontro di allineamento con l'azienda proponente *Zucchetti S.p.A.*, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per chiarire i dettagli operativi e verificare la corretta interpretazione iniziale del capitolato.

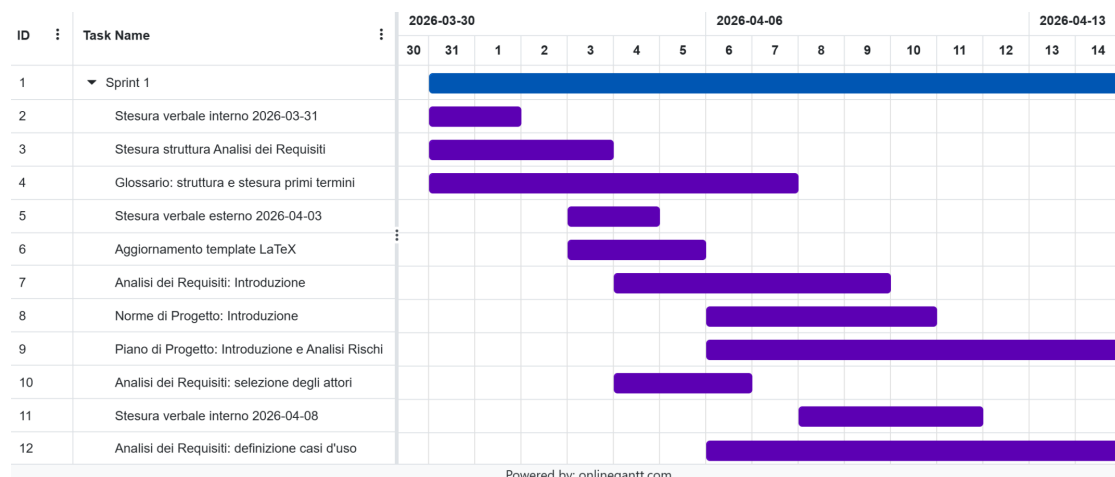


Figura 2: Diagramma di Gantt dello Sprint 1

6.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

6.2.1 Obiettivi

Durante il secondo sprint, il team prevede di consolidare e aggiornare la documentazione prodotta nello sprint_G precedente, con particolare attenzione all'avanzamento dell'*Analisi dei Requisiti*. L'obiettivo principale è passare dalla fase preliminare di studio e modellazione alla stesura più formale dei casi d'uso_G, mantenendo allineati il *Piano di Progetto*, le *Norme di Progetto*, il *Glossario* e l'*Analisi dei Requisiti*. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la stesura del documento *Analisi dei Requisiti*, avviando la descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente studiati e modellati;
- completare la prima versione delle *Norme di Progetto*, così da fornire al gruppo una base normativa condivisa per la gestione del lavoro, della documentazione e degli strumenti utilizzati;
- completare, all'interno del *Piano di Progetto*, la sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi e redigere il consuntivo e la retrospettiva dello Sprint_G #1, analizzando gli scostamenti rispetto al preventivo e individuando eventuali azioni correttive;
- aggiornare il *Glossario* con i termini tecnici emersi durante la stesura della documentazione e durante le attività di analisi;
- avviare un'attività di brainstorming per il design preliminare UX/UI_G, in vista della preparazione del mock-up_G previsto per lo Sprint_G #3;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

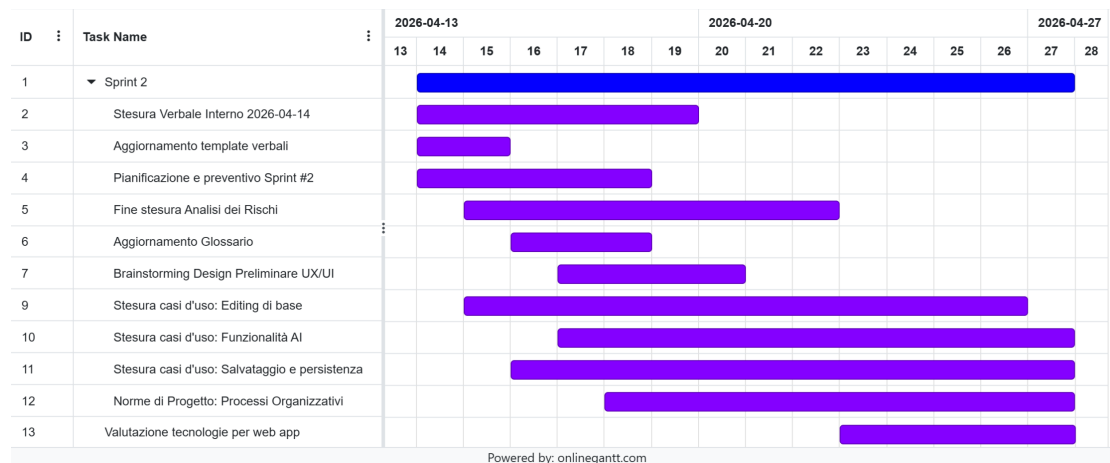


Figura 3: Diagramma di Gantt dello Sprint 2

6.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

6.3.1 Obiettivi

Durante il terzo sprint_G, il team prevede di concentrare le attività sul completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'avvio delle prime attività progettuali legate al prodotto software. In questo sprint_G viene inoltre introdotto il ruolo di Progettista, principalmente per la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente e per le prime attività di raccordo tra requisiti, esperienza utente e futura implementazione del prodotto. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'*Analisi dei Requisiti*, realizzando i diagrammi UML_G relativi ai casi d'uso_G;
- organizzare un incontro con la Proponente_G per discutere i casi d'uso individuati, chiarire eventuali ambiguità e ottenere un riscontro prima di procedere con le fasi successive del progetto;

- avviare la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente, definendo una prima rappresentazione grafica delle principali schermate e dei flussi di interazione dell'applicazione;
- svolgere uno studio iniziale delle tecnologie da adottare nello sviluppo del prodotto software, valutando quali strumenti risultino più adeguati per la realizzazione della web app_G;
- proseguire l'aggiornamento dei documenti di progetto, in particolare *Piano di Progetto*, *Norme di Progetto*, *Glossario* e *Analisi dei Requisiti*;
- sviluppare uno script_G per automatizzare la gestione dei termini del *Glossario*, riducendo il lavoro manuale necessario per inserire nei documenti il riferimento ai termini glossarizzati;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

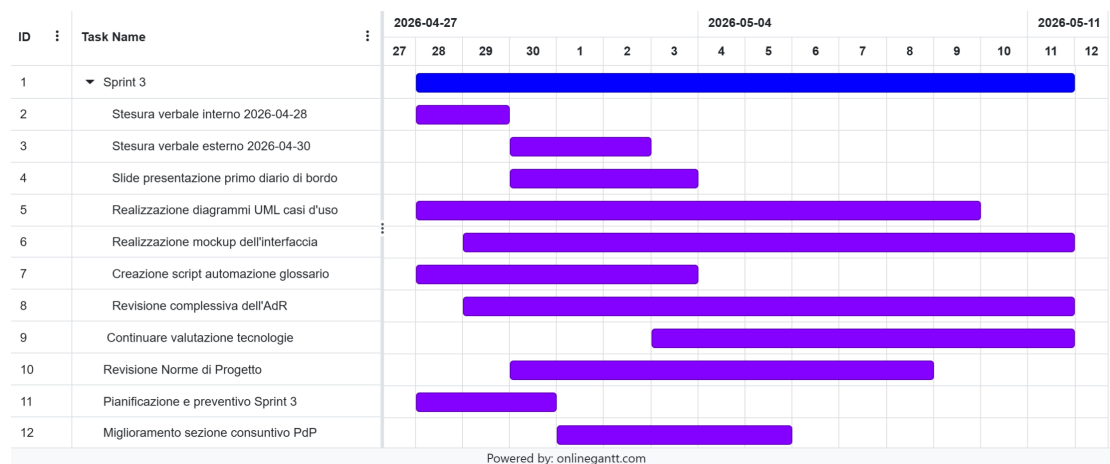


Figura 4: Diagramma di Gantt dello Sprint 3

6.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

6.4.1 Obiettivi

Durante il quarto sprint_G, il team prevede di concentrarsi principalmente sulla realizzazione del *Proof of Concept* e sulla definizione dell'architettura logica necessaria a supportare le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

- consolidare definitivamente il documento di Analisi dei Requisiti in ogni sua sezione;
- prendere le decisioni formali e definitive sullo stack tecnologico e sui framework da adottare per lo sviluppo del *Proof of Concept* e del prodotto software finale;
- avviare uno studio iniziale per definire l'architettura logica del PoC e comprendere i requisiti minimi necessari alla sua progettazione;
- introdurre formalmente il ruolo di Programmatore, che lavorerà in sinergia con il Progettista per l'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept*;
- iniziare lo sviluppo e la codifica effettiva del PoC verso la conclusione dello sprint;

- avviare un percorso di formazione per allineare tutti i componenti del gruppo sulle tecnologie scelte;
- proseguire con l'aggiornamento e la stesura della documentazione di supporto.

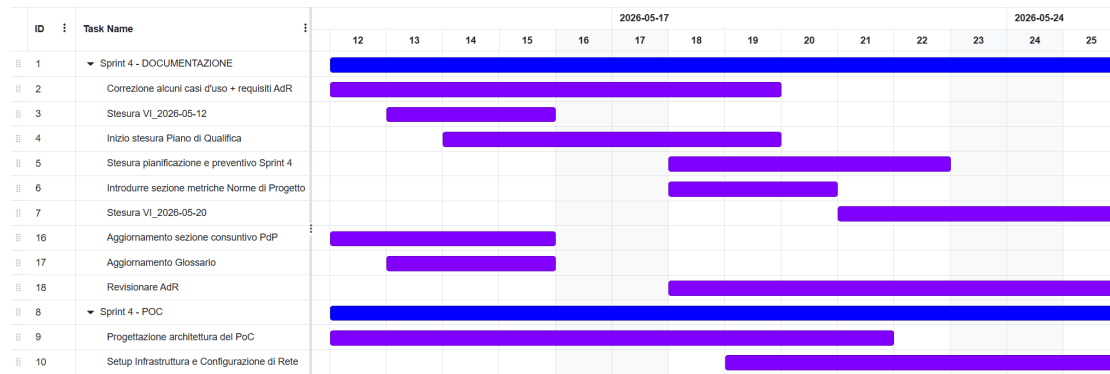


Figura 5: Diagramma di Gantt dello Sprint 4

6.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

6.5.1 Obiettivi

Gli obiettivi dello Sprint_G #5 sono stati definiti a partire dalle evidenze emerse nella retrospettiva precedente e in coerenza con l'avanzamento complessivo del progetto. L'attività centrale dell'iterazione è il completamento del *Proof of Concept*, affiancata dalla stesura del *Piano di Qualifica* e dalla revisione di correttezza dei documenti già prodotti.

Per concentrare l'impegno sullo sviluppo, il team ha previsto l'impiego di tre Programmatori_G, dedicati in parallelo al front-end e al back-end del PoC, e di un Verificatore_G incaricato di controllare in modo continuativo quanto via via implementato.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo del *Proof of Concept*, portando a termine entro la finestra dello sprint_G l'implementazione del front-end e del back-end e la verifica delle componenti realizzate;
- proseguire la stesura del *Piano di Qualifica*, con particolare attenzione alla sezione dedicata alle metriche di prodotto, che saranno popolate a partire dai test_G effettivamente eseguiti sul PoC: la disponibilità di codice funzionante consentirà di passare da definizioni astratte a misurazioni concrete;
- revisionare la correttezza dei documenti già prodotti, correggendo eventuali refusi, aggiornando i riferimenti incrociati e allineando i contenuti allo stato corrente del progetto, con particolare riguardo alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il *Piano di Progetto* per riflettere i consuntivi dello Sprint_G #4 e la pianificazione rivista per gli sprint_G successivi;
- avanzare il *Glossario* con i nuovi termini emersi durante lo sviluppo e la progettazione, integrandolo nel sito pubblico del gruppo affinché risulti direttamente consultabile online;

- migliorare la veste grafica e l'organizzazione del sito pubblico del progetto;
- proseguire l'attività di studio e approfondimento delle tecnologie adottate per lo sviluppo del PoC;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

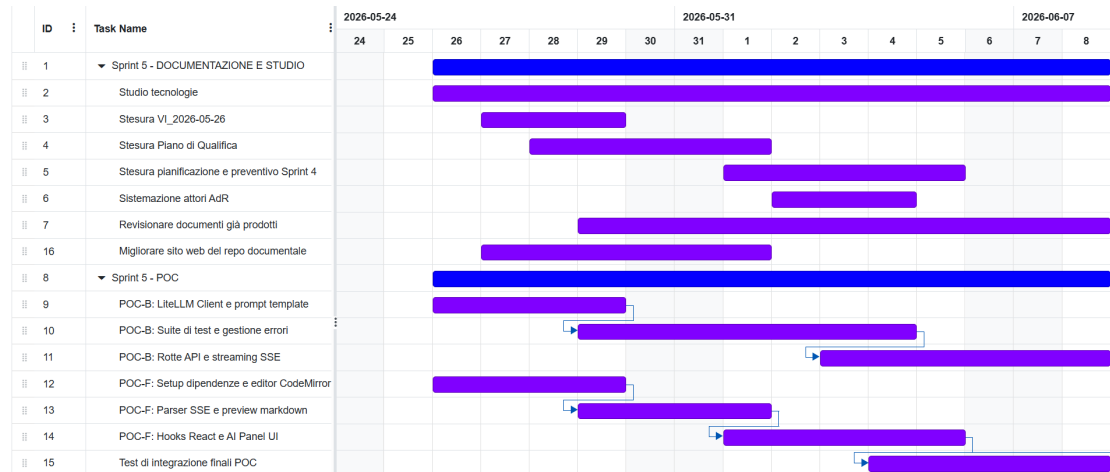


Figura 6: Diagramma di Gantt dello Sprint 5

6.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

6.6.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #6 è dedicato principalmente ad attività di programmazione e di verifica_G, in vista della presentazione della RTB_G. L'obiettivo centrale è il completamento del *Proof of Concept* e il controllo accurato di tutta la documentazione prodotta finora.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo del *Proof of Concept*;
- verificare accuratamente tutti i documenti in vista della presentazione della RTB_G, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto* e al *Piano di Progetto*;
- completare il *Piano di Qualifica* e sottoporlo a un'accurata verifica_G;
- organizzare un incontro con la Proponente_G per mostrare il *Proof of Concept* e raccoglierne il riscontro;
- preparare le diapositive per la presentazione RTB_G delle tecnologie;
- redigere la lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- richiedere al prof. Cardin il colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_G;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.



Figura 7: Diagramma di Gantt dello Sprint 6

6.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

6.7.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #7 comprende la consegna della RTB_G, avvenuta il 25 giugno 2026 con circa cinque giorni di ritardo rispetto a quanto pianificato per lo Sprint_G #6, ed è dedicato alla formalizzazione della candidatura per la presentazione delle tecnologie, all'attesa del riscontro da parte del prof. Cardin e al consolidamento della documentazione, oltre a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase successiva di Progettazione e Codifica.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- inoltrare al prof. Cardin la candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G, svolgere la relativa presentazione e attenderne il riscontro;
- redigere la lettera di presentazione della RTB_G destinata al prof. Vardanega;
- aggiornare i documenti soggetti a modifica, in particolare il *Piano di Progetto* (con l'aggiunta del consuntivo dello Sprint_G #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_G #7) e il *Piano di Qualifica* (con l'aggiunta degli Sprint_G #6 e #7);
- approvare tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_G della RTB_G;
- avviare la progettazione dell'MVP_G, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analizzare i documenti da produrre nella fase di Product Baseline_G, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specific Tecnica*;
- dedicare ore di palestra all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline_G.

Il gruppo attribuisce particolare importanza alle ore di palestra: prima di avviare concretamente le attività di sviluppo è infatti fondamentale comprendere *come* realizzarle. Si tratta di ore che non vengono rendicontate come effettivamente produttive, ma che risultano essenziali per costruire una base solida su cui impostare il lavoro della fase successiva.

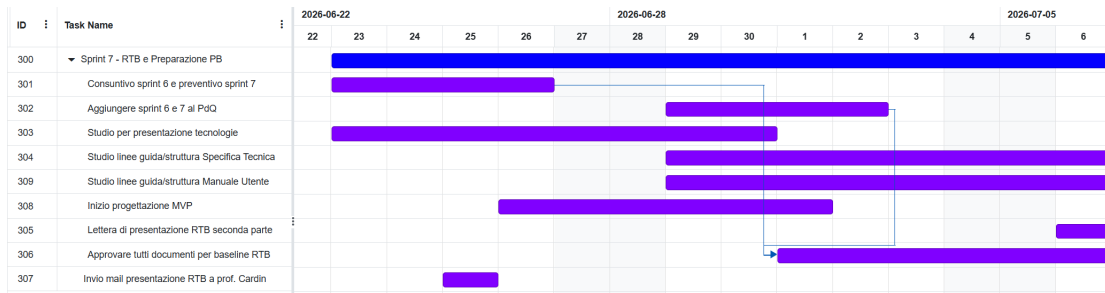


Figura 8: Diagramma di Gantt dello Sprint 7

6.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

6.8.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #8 rappresenta il punto di passaggio tra la fase di RTB_G e quella di Product Baseline_G. Il periodo è dedicato al recepimento dei rilievi mossi dal prof. Riccardo Cardin sull'*Analisi dei Requisiti*, alla preparazione e allo svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G con il prof. Tullio Vardanega e, a valle dell'esito positivo di tale incontro, all'ingresso effettivo nella fase di PB_G.

Rispetto agli sprint_G precedenti il gruppo ha scelto di preventivare_G un monte ore sensibilmente più elevato. La decisione, assunta durante la riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-07, nasce dalla constatazione che gli sprint_G #6 e #7 avevano lasciato emergere alcuni "tempi morti" legati all'attesa dei riscontri esterni: con l'avvio della progettazione_G di dettaglio e della documentazione di PB_G il carico di lavoro effettivo cresce in modo significativo e una pianificazione_G più densa consente di sfruttare pienamente il tempo a disposizione.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- sistemare gli errori e i requisiti_G segnalati dal prof. Riccardo Cardin nell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione ai requisiti_G non funzionali, rendendoli più chiari, misurabili e verificabili_G;
- svolgere le attività di studio e preparazione, sia individuali sia collettive, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, così da presentarsi con una comprensione uniforme e condivisa del lavoro svolto;
- predisporre i materiali e le argomentazioni da esporre al prof. Tullio Vardanega durante la seconda parte della presentazione RTB_G, prevista per il 9 luglio 2026;
- avviare la fase di Product Baseline_G a seguito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, impostando le attività e i documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avviare, da parte dei Progettisti_G, la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G a partire dalle scelte già consolidate nel *Proof of Concept*;
- analizzare i design pattern_G e l'architettura_G generale del prodotto, motivandone le scelte e avviandone la stesura all'interno del documento di *Specifica Tecnica*.

Per sostenere queste attività il gruppo ha previsto due Analisti_G, incaricati della revisione incrociata dei requisiti_G, e due Progettisti_G, dedicati in parallelo alla progettazione_G dell'MVP_G e allo studio dei pattern_G architetture. Non è invece previsto alcun Programmatore_G: la

progettazione_G è ancora in fase di avvio e non fornisce una base sufficientemente matura per iniziare la codifica_G.

7 Preventivo

Il preventivo viene elaborato considerando il costo orario associato a ciascun ruolo, il budget complessivo previsto e le attività pianificate per il periodo di riferimento. Per ogni sprint_G vengono quindi riportati:

- un preventivo delle ore previste, organizzato in forma tabellare;
- un preventivo dei costi stimati, anch'esso presentato in forma tabellare;
- un areogramma che rappresenta la distribuzione delle ore tra i diversi ruoli di progetto.

Il carico di lavoro complessivo previsto per ciascun componente del gruppo è pari a 89 ore, distribuite tra i diversi ruoli di progetto, per un totale di 623 ore produttive. La ripartizione delle mansioni viene gestita tramite un meccanismo di rotazione, con l'obiettivo di garantire a ogni membro del team la possibilità di ricoprire ruoli differenti e acquisire una visione più completa del processo di sviluppo.

Per rendere le tabelle più leggibili e compatte, i ruoli di progetto vengono indicati mediante le seguenti abbreviazioni_G:

- **Re**: Responsabile di progetto;
- **Am**: Amministratore;
- **An**: Analista;
- **Pt**: Progettista;
- **Pr**: Programmatore;
- **Ve**: Verificatore.

7.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	6	-	-	-	6
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	6	-	-	-	6
A. Marini	-	-	6	-	-	-	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	4	-	-	-	-	-	4
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	4	5	24	-	-	8	41

Tabella 4: *Preventivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

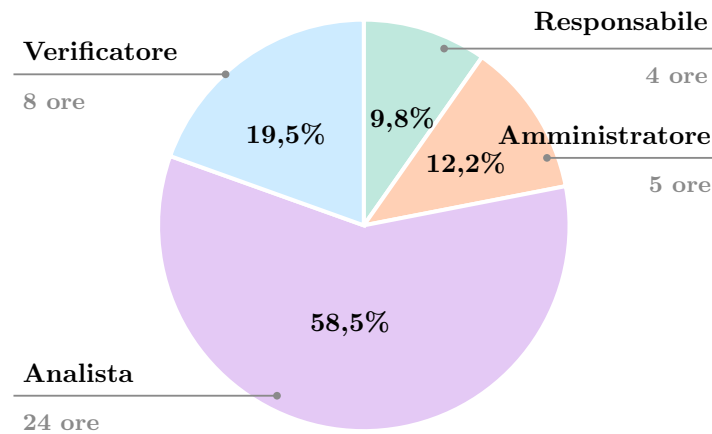


Figura 9: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #1

Di seguito è riportato il preventivo economico del primo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	5	100,00
Analista	24	600,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	8	120,00
Totale	41	940,00

Tabella 5: *Preventivo economico dello Sprint #1*

7.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	-	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	6	6
D. Facco	-	-	-	-	-	6	6
A. Marini	-	7	-	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	6	-	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	7	7	18	-	-	12	44

Tabella 6: *Preventivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

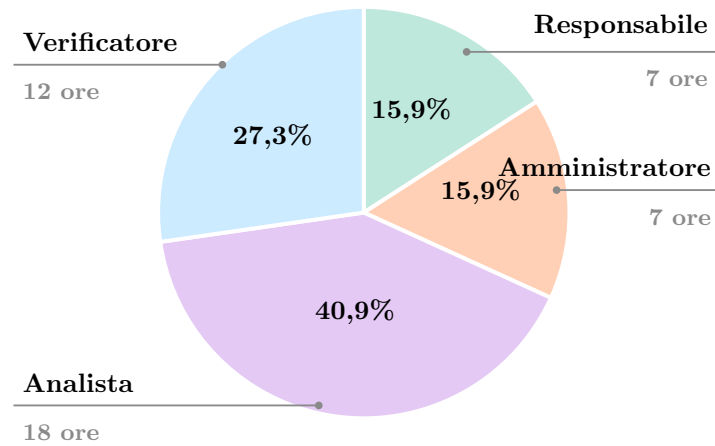


Figura 10: Areogramma della distribuzione delle ore per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il preventivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	7	210,00
Amministratore	7	140,00
Analista	18	450,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	12	180,00
Totale	44	980,00

Tabella 7: *Preventivo economico dello Sprint #2*

7.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	7	-	-	-	7
D. Facco	-	-	-	5	-	-	5
A. Marini	4	-	3	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	5	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	-	6	6
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	10	10	-	13	44

Tabella 8: *Preventivo orario Sprint #3*

Distribuzione ore per ruolo

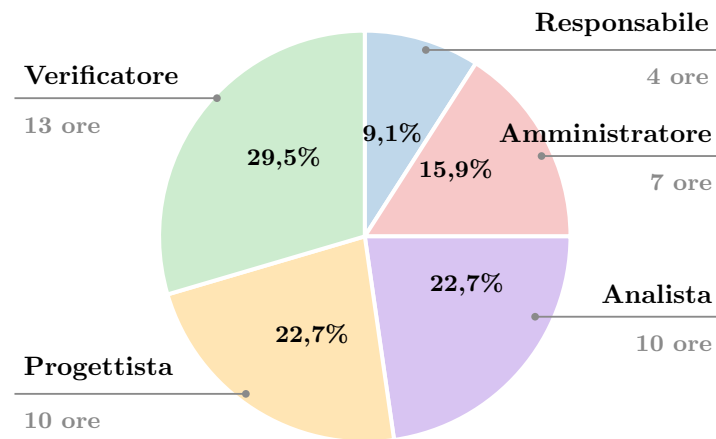


Figura 11: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #3

Di seguito è riportato il preventivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	7	140,00
Analista	10	250,00
Progettista	10	250,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	13	195,00
Totale	44	955,00

Tabella 9: *Preventivo economico dello Sprint #3*

7.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totale per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	7	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	8	-	-	8
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	-	-	8	8
A. Menegaldo	-	3	3	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	-	-	8	-	8
S. Zecchinato	6	-	-	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	10	3	15	8	8	50

Tabella 10: *Preventivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore per ruolo

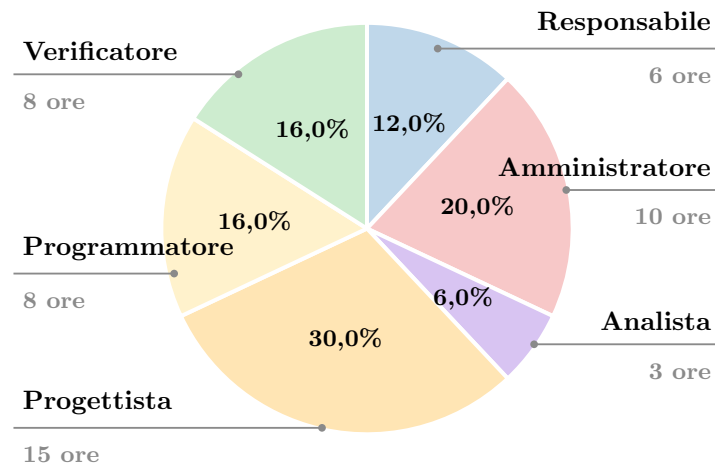


Figura 12: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #4

Di seguito è riportato il preventivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	6	180,00
Amministratore	10	200,00
Analista	3	75,00
Progettista	15	375,00
Programmatore	8	120,00
Verificatore	8	120,00
Totale	50	1.070,00

Tabella 11: *Preventivo economico dello Sprint #4*

7.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	-	10	-	10
D. Facco	-	-	-	-	10	-	10
A. Marini	-	-	-	-	11	-	11
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	-	-	6
Totale per ruolo	2	8	-	6	37	10	63

Tabella 12: *Preventivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore per ruolo

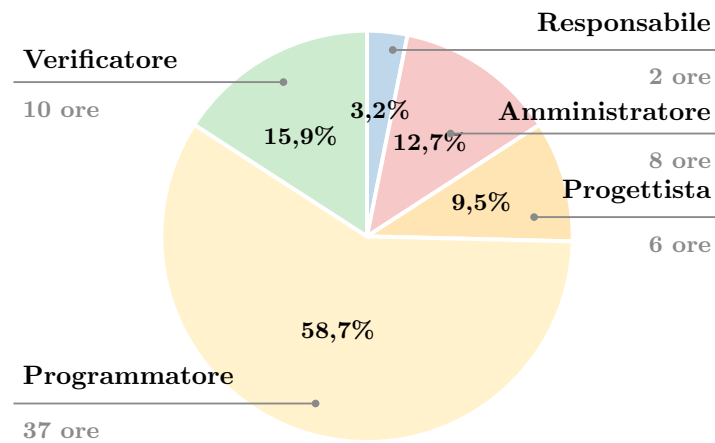


Figura 13: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #5

Di seguito è riportato il preventivo economico del quinto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	2	60,00
Amministratore	8	160,00
Analista	0	0,00
Progettista	6	150,00
Programmatore	37	555,00
Verificatore	10	150,00
Totale	63	1.075,00

Tabella 13: *Preventivo economico dello Sprint #5*

7.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	8	-	8
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	6	9
D. Facco	-	-	-	-	8	-	8
A. Marini	-	-	-	8	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	-	8	-	8
S. Vendramin	-	-	-	-	-	9	9
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	24	15	59

Tabella 14: *Preventivo orario Sprint #6*

Distribuzione ore per ruolo

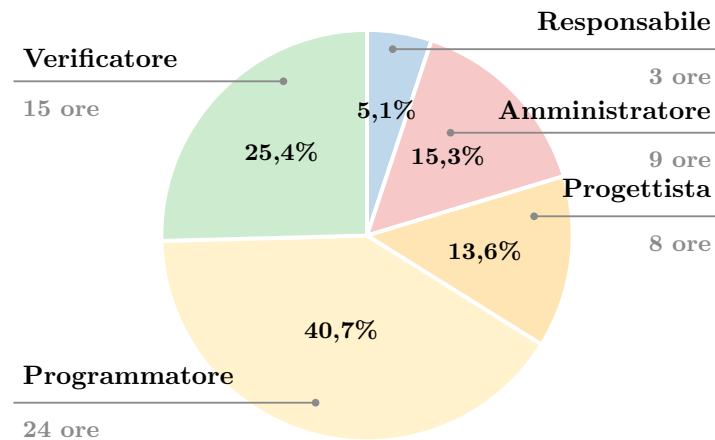


Figura 14: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #6

Di seguito è riportato il preventivo economico del sesto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	9	180,00
Analista	0	0,00
Progettista	8	200,00
Programmatore	24	360,00
Verificatore	15	225,00
Totale	59	1.055,00

Tabella 15: *Preventivo economico dello Sprint #6*

7.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	1	1
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 16: *Preventivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

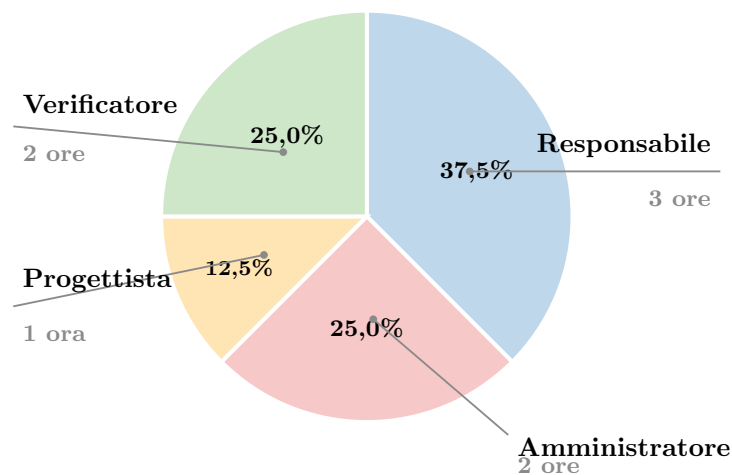


Figura 15: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #7

Le ore preventivate riguardano le attività produttive di coordinamento, amministrazione, progettazione e verifica_G previste per il periodo, oltre all'aggiornamento documentale. I restanti membri del gruppo (E. De Piccoli e S. Zecchinato) interverranno all'occorrenza a supporto degli altri componenti e dedicheranno il resto del tempo alle attività di palestra, non rendicontate come ore produttive.

Di seguito è riportato il preventivo economico del settimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	2	40,00
Analista	0	0,00
Progettista	1	25,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	2	30,00
Totale	8	185,00

Tabella 17: *Preventivo economico dello Sprint #7*

7.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-07:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	12	-	-	12
D. Facco	-	-	12	-	-	-	12
A. Marini	10	-	-	-	-	-	10
A. Menegaldo	-	8	-	-	-	-	8
S. Vendramin	-	-	-	12	-	-	12
S. Zecchinato	-	-	12	-	-	-	12
Totale per ruolo	10	8	24	24	-	10	76

Tabella 18: *Preventivo orario Sprint #8*

Distribuzione ore per ruolo

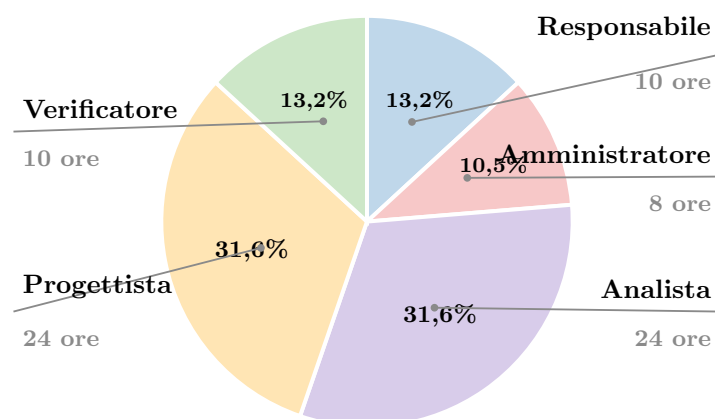


Figura 16: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #8

Il preventivo dello Sprint_G #8 si discosta in modo evidente da quelli dei periodi precedenti: a fronte di una media di circa 44 ore preventivate per sprint_G negli Sprint_G dal #1 al #7, il gruppo ha stimato per questo periodo 76 ore produttive. L'incremento è motivato dalla concentrazione, in un unico sprint_G, di tre attività onerose e in larga parte parallele: il refactoring_G dei requisiti_G non funzionali richiesto dal prof. Cardin, la preparazione e lo svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G e l'avvio contestuale della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G e dell'analisi dei design pattern_G. Il carico è distribuito in modo simmetrico tra le due coppie Analisti_G e Progettisti_G, che assorbono complessivamente il 63,2% delle ore preventivate.

Di seguito è riportato il preventivo economico dell'ottavo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	10	300,00
Amministratore	8	160,00
Analista	24	600,00
Progettista	24	600,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	10	150,00
Totale	76	1.810,00

Tabella 19: *Preventivo economico dello Sprint #8*

8 Consuntivo

Il consuntivo rappresenta la stima aggiornata delle ore e dei costi effettivamente impiegati durante lo sprint_G, confrontati con le previsioni iniziali. Questa fase è fondamentale per valutare l'andamento del progetto, identificare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggior-

nare il preventivo a finire. Il consuntivo viene elaborato al termine di ogni sprint_G, tenendo conto delle ore rendicontate dai membri del gruppo, delle attività completate e di eventuali difficoltà incontrate durante l'iterazione. Inoltre, vengono analizzati i motivi di eventuali scostamenti rispetto al preventivo iniziale, così da individuare azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

8.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	4	-	-	-	4
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	2	-	-	-	2
A. Marini	-	-	5	-	-	-	5
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	6	-	4	-	-	-	10
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	5	21	-	-	8	40

Tabella 20: *Consuntivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

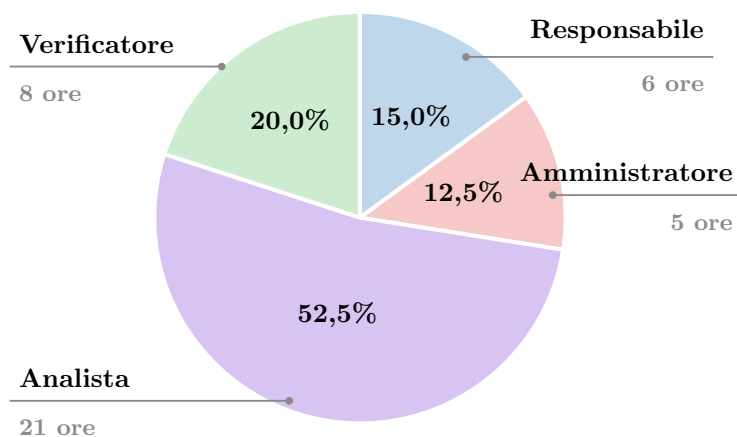


Figura 17: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #1

Di seguito è riportato il consuntivo economico del primo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo(in €)
Responsabile di progetto	6	-2	180,00	-60,00
Amministratore	5	0	100,00	0,00
Analista	21	+3	525,00	+75,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	40	+1	925,00	+15,00
Sprint pregressi	0	/	0,00	/
Restante	604	/	11.935,00	/

Tabella 21: *Consuntivo economico Sprint #1*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	9	5	22	22	23	88
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	23	87
D. Facco	7	8	7	22	23	23	90
A. Marini	7	8	4	22	23	23	87
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	15	84
S. Vendramin	1	9	4	22	24	22	82
S. Zecchinato	6	9	3	23	22	23	86
Totale per ruolo	42	55	41	156	158	152	604

Tabella 22: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #1*

8.1.1 Revisione delle attività

Durante lo Sprint_G #1 il team ha svolto attività principalmente orientate alla definizione delle basi documentali e organizzative del progetto. Le attività principali svolte sono state:

- inizio dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione a:
 - studio preliminare della struttura dei casi d'uso_G;
 - individuazione degli attori principali del sistema;
 - definizione dei primi casi d'uso_G;
- avvio della stesura del *Piano di Progetto*, comprendendo l'avvio dell'analisi dei rischi tecnologici e organizzativi;

- avvio della stesura delle *Norme di Progetto*;
- miglioramento del Way of Working_G, con l'obiettivo di definire modalità comuni per la gestione del lavoro;
- pianificazione e preventivazione delle attività relative allo Sprint_G #2;
- inserimento nel *Glossario* dei primi termini tecnici utilizzati durante la candidatura e nelle prime attività progettuali;
- redazione dei verbali interni ed esterni.

8.1.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #1 sono emersi alcuni scostamenti tra preventivo e consuntivo.

- **Scostamento del ruolo Analista:** le ore consuntivate per il ruolo di Analista sono risultate inferiori rispetto a quelle preventivate (21 ore effettive contro le 24 previste, -3 ore). Il gruppo ha infatti impiegato più tempo effettivo nell'attività di "palestra" iniziale, ovvero nel familiarizzare con il contesto del progetto (comprendere l'analisi del capitolato, studiare cosa fossero i casi d'uso_G e i requisiti_G, assimilare le modalità corrette di documentazione), che nella produzione della documentazione effettiva. Di conseguenza, le ore dedicate alla stesura vera e propria dei contenuti di analisi sono risultate inferiori a quanto inizialmente preventivato.
- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha consuntivato 6 ore contro le 4 preventivate (+2 ore). Essendo il primo sprint_G, il gruppo ha avuto bisogno di maggiore coordinamento per chiarire le attività da svolgere, le priorità, l'utilizzo degli strumenti di tracciamento e la suddivisione dei compiti tra i membri.
- **Problemi principali rilevati:** sono stati individuati alcuni problemi organizzativi, tra cui task_G inizialmente troppo generici, mancanza di una lista puntuale delle attività da svolgere, uso non ancora uniforme degli strumenti di project tracking_G e comunicazione interna non sempre sufficiente.

8.1.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle criticità emerse durante lo Sprint_G #1, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- definire task_G più dettagliati, meno generici e facilmente verificabili;
- assegnare le attività in modo più chiaro, specificando responsabilità e risultati attesi per ciascun membro;
- migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più costante sull'avanzamento delle attività;
- utilizzare in modo più sistematico GitHub_G per il tracciamento dei task_G, delle issue_G e delle milestone_G;
- completare e applicare in modo più rigoroso quanto definito nelle *Norme di Progetto*, così da rendere più stabile e uniforme il Way of Working_G.

8.1.3.1 Pianificazione futura In seguito alle inefficienze emerse durante questo primo sprint_G, la pianificazione dei periodi successivi verrà rivista. Poiché la fase di apprendimento degli strumenti ha sottratto parte del tempo destinato alla formalizzazione dei requisiti, il team intende ridefinire l'assegnazione delle attività. Per lo Sprint 2 sarà data priorità all'approfondimento dei casi d'uso_G, con l'obiettivo di garantire una To-Do List più esplicita e priva di ambiguità, così da prevenire ulteriori blocchi. Inoltre, sarà necessario dedicare maggiore attenzione all'uso corretto degli strumenti di sviluppo, in modo da migliorare l'efficienza complessiva del team.

8.1.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Durante lo Sprint #1 è emersa una lieve discrepanza tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate. In particolare, il ruolo di responsabile di progetto ha richiesto un impegno maggiore rispetto alle attese, principalmente a causa delle attività iniziali di coordinamento, organizzazione e gestione del lavoro del team. Tale incremento è inoltre attribuibile alla limitata esperienza del gruppo nelle prime fasi operative del progetto. Il ruolo di analista, invece, ha richiesto un numero di ore inferiore rispetto a quanto preventivato. Il team ritiene che l'aumento del carico di lavoro del responsabile sia fisiologico nelle fasi iniziali del progetto e prevede, nei prossimi sprint, di distribuire in modo più equilibrato le attività, così da ridurre l'impegno richiesto a tale ruolo. Lo scostamento rilevato non compromette il budget complessivo né la pianificazione temporale del progetto. Di conseguenza, il team non ritiene necessaria una revisione sostanziale del preventivo a finire.

8.1.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante il primo sprint_G, il team ha osservato l'emergere di criticità organizzative tipiche della fase iniziale del progetto. L'analisi pratica ha evidenziato una parziale inefficacia delle contromisure previste a livello teorico, rendendo necessario introdurre tempestivi miglioramenti metodologici per gli sprint successivi.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato in quanto il gruppo si trovava nella fase iniziale del progetto e non aveva ancora consolidato un metodo di lavoro comune. Le *Norme di Progetto* erano ancora in fase di stesura, quindi non fornivano ancora una guida completa e stabile per la gestione operativa delle attività. Alcuni task_G sono stati assegnati in modo troppo generale, senza una suddivisione sufficientemente precisa delle attività da svolgere. Questo ha generato qualche difficoltà nel comprendere con chiarezza chi dovesse occuparsi di determinate parti del lavoro e quale risultato fosse atteso da ciascun membro.
 - * **Esito della mitigazione:** Le misure di mitigazione previste si sono rivelate solo parzialmente efficaci durante il primo sprint_G. Come azione correttiva, l'evento ha evidenziato la necessità di definire task_G più specifici, responsabilità più chiare e momenti di confronto più frequenti tra i membri del gruppo.
 - * **Impatto:** Contenuto, poiché il rischio si è manifestato in una fase ancora iniziale del progetto, quando la quantità di documentazione da gestire era limitata.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato principalmente nell'utilizzo non ancora uniforme degli strumenti di supporto allo sviluppo e alla gestione del progetto, in particolare GitHub_G, issue_G, milestone_G, branch_G e strumenti di project tracking_G. La mancanza iniziale di una lista puntuale delle attività da svolgere

ha reso meno immediata la gestione delle issue_G e l'assegnazione dei compiti ai singoli membri.

- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficaci, poiché il team ha iniziato a prendere familiarità con tali strumenti durante lo sprint_G, ma non disponeva ancora di procedure operative completamente definite.
- * **Impatto:** Inefficienze organizzative che non hanno compromesso le scadenze dello sprint_G. In particolare, è stato necessario dedicare tempo alla comprensione degli strumenti e al loro utilizzo corretto, riducendo parzialmente le ore di produzione effettiva.

– **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La stima iniziale delle ore di Analista si è rivelata leggermente sovrastimata. Sono state preventivate 24 ore, ma ne sono state consuntivate 21: il tempo effettivo dedicato alla produzione della documentazione di analisi è stato inferiore al previsto, poiché una parte rilevante dell'impegno è stata assorbita dall'attività di "palestra" iniziale di familiarizzazione con il contesto (casi d'uso_G, requisiti_G, modalità di documentazione), trattandosi della prima attività di analisi del progetto.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficace. Lo scostamento è stato assorbito senza impatti sulle scadenze, ma ha evidenziato la necessità di distinguere, nelle stime successive, le ore di apprendimento da quelle di produzione effettiva.
- * **Impatto:** Contenuto. Le 3 ore in meno rientrano nel monte ore complessivo del ruolo e non hanno compromesso il budget né la pianificazione.

8.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	5	-	2	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	4	4
D. Facco	-	-	-	-	-	5	5
A. Marini	-	7	2	-	-	-	9
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	7	-	-	-	7
S. Zecchinato	-	-	1	-	-	7	8
Totale per ruolo	5	7	18	-	-	16	46

Tabella 23: *Consuntivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

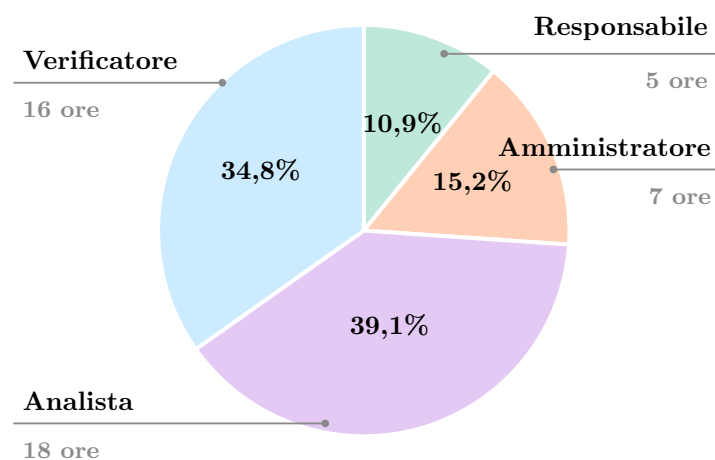


Figura 18: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il consuntivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	5	+2	150,00	+60,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	18	0	450,00	0,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	16	-4	240,00	-60,00
Totale	46	-2	980,00	0,00
Sprint pregressi	40	/	925,00	/
Restante	558	/	10.955,00	/

Tabella 24: *Consuntivo economico Sprint #2*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	9	3	22	22	23	81
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	19	83
D. Facco	7	8	7	22	23	18	85
A. Marini	7	1	2	22	23	23	78
A. Menegaldo	7	8	3	23	22	15	78
S. Vendramin	1	9	-3	22	24	22	75
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	16	78
Totale per ruolo	37	48	23	156	158	136	558

Tabella 25: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #2

Un eventuale valore negativo nella colonna Analista indica che il membro ha svolto più ore di quelle inizialmente previste per tale ruolo. Nelle prime iterazioni, dedicate all'*Analisi dei Requisiti*, alcune attività di analisi non sono state completate nei tempi previsti da chi le aveva in carico; A. Marini e S. Vendramin sono quindi intervenuti a supporto per garantire la qualità e la completezza dell'ADR, assorbendo parte del lavoro. I totali per ruolo di ciascuno sprint_G restano comunque invariati.

8.2.1 Revisione delle attività

Nel corso dello Sprint_G #2, le principali attività svolte sono state:

- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;
- aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione alla descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente individuati e studiati;
- inserimento e aggiornamento dei termini all'interno del *Glossario*, sulla base della terminologia emersa durante la stesura dei documenti;
- aggiornamento delle *Norme di Progetto*, con l'obiettivo di rendere più chiaro e stabile il Way of Working_G del gruppo;
- aggiornamento del *Piano di Progetto*, tramite l'inserimento dei preventivi, dei consuntivi e delle retrospettive relative ai primi due sprint_G; completamento e revisione della sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi;
- avvio dello studio iniziale delle tecnologie da adottare per lo sviluppo della web app_G;
- confronto interno sulle possibili scelte UX/UI_G, senza definire ancora in modo definitivo il mock-up_G, poiché in questa fase il gruppo ha ritenuto prioritario consolidare i requisiti e garantire la futura correttezza funzionale del prodotto.

8.2.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #2 emerge un miglioramento generale nell'organizzazione interna del gruppo rispetto allo sprint_G precedente. Il team ha mostrato maggiore capacità di adattamento,

soprattutto nella gestione dei ruoli e nella redistribuzione delle attività in base alle necessità emerse durante il lavoro.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha richiesto meno ore rispetto a quelle preventivate. Una volta completate le attività principali di coordinamento, parte dell'impegno è stata riallocata a supporto degli Analisti, che stavano lavorando alla stesura formale dei casi d'uso_G.
- **Scostamento del ruolo Analista:** il ruolo di Analista ha richiesto un impegno rilevante, soprattutto per la descrizione dei casi d'uso_G nell'*Analisi dei Requisiti*. In particolare, un membro del team ha rilevato di aver quasi esaurito le ore previste per tale ruolo e ha quindi contribuito anche alle attività di verifica, così da supportare i Verificatori nel controllo della documentazione prodotta. Inoltre, alcune ore di analisi inizialmente in carico ad A. Menegaldo sono state completate da A. Marini, subentrata a supporto per non rallentare la stesura dei casi d'uso_G.
- **Scostamento del ruolo Verificatore:** il ruolo di Verificatore ha richiesto più ore rispetto al preventivo. Questo è dovuto al carico documentale dello sprint_G, che ha incluso aggiornamenti significativi all'*Analisi dei Requisiti*, al *Piano di Progetto*, alle *Norme di Progetto* e al *Glossario*. La verifica è stata quindi necessaria per garantire coerenza, qualità e uniformità tra i documenti.
- **Miglioramenti osservati:** rispetto allo Sprint_G #1, il gruppo ha dimostrato una maggiore capacità di collaborazione. I membri hanno iniziato a considerare il proprio ruolo non come un insieme rigido di attività isolate, ma come parte di un lavoro collettivo da adattare al contesto e alle necessità del momento.

8.2.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle osservazioni emerse durante lo Sprint_G #2, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- continuare a migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più frequente sull'avanzamento delle attività;
- definire i task_G in modo più preciso prima dell'inizio dello sprint_G, indicando chiaramente obiettivo, responsabile e risultato atteso;
- mantenere una certa flessibilità nella distribuzione delle attività, permettendo ai membri con minore carico di lavoro di supportare chi si trova in maggiore difficoltà;
- rafforzare l'utilizzo degli strumenti di project tracking_G, così da rendere più visibile lo stato di avanzamento delle attività;
- dedicare maggiore attenzione alla pianificazione delle attività di verifica, poiché l'aumento della documentazione prodotta comporta un carico crescente per il ruolo di Verificatore;
- proseguire lo studio delle tecnologie da adottare, così da arrivare agli sprint_G successivi con una base tecnica più solida per l'avvio dello sviluppo.

8.2.3.1 Pianificazione futura In base alle necessità emerse e in linea con le decisioni prese al termine del ciclo precedente, la pianificazione per le iterazioni successive si concentrerà sul completamento definitivo della linea di base dei requisiti, preparandosi al contempo al passaggio verso le prime fasi di modellazione architettuale. Il team focalizzerà gli sforzi futuri sull'introduzione programmata del ruolo di Progettista, che sarà incaricato di strutturare i primi mock-up_G dell'interfaccia utente in stretta aderenza ai casi d'uso_G consolidati, ponendo le basi per lo studio di fattibilità dei framework di sviluppo.

8.2.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint_G 2 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle stime iniziali, concentrato principalmente sul ruolo di Responsabile e sul ruolo di Verificatore. In particolare, si osserva un lieve incremento delle ore dedicate alle attività di coordinamento, compensato tuttavia da una riduzione del carico previsto per la verifica.

Nel complesso, tali variazioni risultano contenute e non incidono in maniera significativa sull'equilibrio generale del progetto, né sul rispetto del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue vengono quindi mantenute sostanzialmente in linea con la pianificazione iniziale e saranno riutilizzate in modo flessibile per assorbire i carichi futuri, in particolare quelli legati all'aumento progressivo delle attività documentali e all'avvio delle prime fasi di progettazione. Il team ritiene inoltre che l'attuale incremento del carico sul ruolo di Responsabile sia riconducibile alle difficoltà organizzative tipiche delle fasi iniziali del progetto, durante le quali è necessario un maggiore impegno di coordinamento per garantire la corretta gestione delle attività e delle comunicazioni interne. Tuttavia, tale situazione è considerata transitoria: con il progressivo consolidamento del gruppo e una maggiore chiarezza operativa sui compiti associati a ciascun ruolo, ci si attende una naturale riduzione di questo carico. Per tale motivo, non si ritiene opportuno modificare al rialzo le ore previste nel preventivo a finire per il ruolo di Responsabile.

8.2.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_G #2 sono stati monitorati i rischi individuati nel *Piano di Progetto*. Alcuni di essi si sono effettivamente manifestati, mentre altri sono stati gestiti con successo grazie a una maggiore collaborazione interna rispetto allo sprint_G precedente.

- **Rischi attesi e occorsi:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché i membri del team hanno dovuto assumere ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti nello sprint_G precedente, con la necessità di comprendere le nuove responsabilità, le attività associate al ruolo e il modo corretto di svolgerle.
 - * **Esito mitigazione:** Le misure di mitigazione si sono rivelate complessivamente efficaci. Il gruppo ha cercato di affrontare le difficoltà attraverso il confronto interno, la collaborazione tra i membri e una maggiore disponibilità ad aiutare chi si trovava in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo.
 - * **Impatto:** l'impatto del rischio è stato moderato. La rotazione dei ruoli ha richiesto un periodo iniziale di adattamento, ma non ha compromesso le scadenze dello sprint_G. L'esperienza ha evidenziato l'importanza di definire in modo sempre più chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo e di mantenere un dialogo costante tra i membri del gruppo.

- **RO-4 - Risorse disponibili ma non impiegate**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché alcune risorse del team erano disponibili ma non erano state allocate in modo efficace.
- * **Esito mitigazione:** il rischio è stato gestito con successo. Durante lo sprint_G, il gruppo ha mostrato una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse rispetto al periodo precedente. Alcuni membri, una volta completate le attività principali assegnate al proprio ruolo, hanno supportato altri componenti del team che stavano affrontando un carico di lavoro più elevato.
Questo comportamento ha permesso di evitare momenti di inattività e di distribuire meglio l'impegno complessivo, soprattutto nelle attività legate alla stesura e alla verifica della documentazione.
- * **Impatto:** l'impatto è stato positivo. La collaborazione tra membri ha permesso di ridurre il rischio di squilibri nel carico di lavoro e ha favorito un avanzamento più regolare delle attività.

8.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	8	-	-	-	8
D. Facco	-	-	-	7	-	-	7
A. Marini	4	-	4	-	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	6	-	-	6
S. Vendramin	-	-	1	-	-	6	7
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	13	13	-	13	50

Tabella 26: *Consuntivo orario Sprint #3*

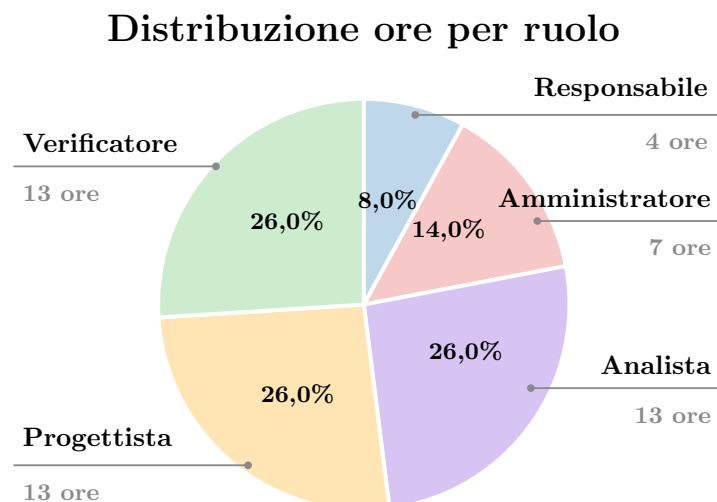


Figura 19: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #3

Di seguito è riportato il consuntivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	13	-3	325,00	-75,00
Progettista	13	-3	325,00	-75,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	13	0	195,00	0,00
Totale	50	-6	1.105,00	-150,00
Sprint pregressi	86	/	1.905,00	/
Restante	508	/	9.850,00	/

Tabella 27: Consuntivo economico Sprint #3

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	22	22	23	74
E. De Piccoli	7	4	1	22	22	19	75
D. Facco	7	8	7	15	23	18	78
A. Marini	3	1	-2	22	23	23	70
A. Menegaldo	7	8	3	17	22	15	72
S. Vendramin	1	9	-4	22	24	16	68
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	9	71
Totale per ruolo	33	41	10	143	158	123	508

Tabella 28: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #3

8.3.1 Revisione delle attività

Nel corso del terzo sprint_G, il team ha svolto attività fondamentali per il consolidamento dei requisiti e la progettazione preliminare del software. Nello specifico:

- Aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti* a seguito di un incontro di allineamento con l'azienda proponente;
- Sistemazione definitiva dei casi d'uso_G e realizzazione dei relativi diagrammi UML_G di specifica;
- **Gestione delle priorità di Progettazione:** Il team si è reso conto che avviare lo sviluppo del PoC nel prossimo sprint senza una solida architettura di base sarebbe stato rischioso. Pertanto, i Progettisti hanno riorganizzato le priorità: la realizzazione dei mock-up_G per l'interfaccia utente (UX/UI_G) è stata completata in forma minimale per poter dedicare il grosso delle ore a un'urgente esplorazione e definizione delle tecnologie.
- Per quanto riguarda la conseguente progettazione architettuale preliminare, il team ha definito i seguenti aspetti fondamentali:
 - **Selezione dello Stack:** Valutazione e scelta motivata delle tecnologie ottimali (SPA React con Zustand per il frontend, FastAPI asincrono per il backend, Docker Compose per l'infrastruttura).
 - **Decomposizione Strutturale:** Scomposizione logica del sistema in macro-aree indipendenti, stabilendo i principi architeturali di base (es. backend puramente *stateless* e privo di logica di dominio, delegando il mantenimento dello stato al frontend).
 - **Strategia di Isolamento:** Progettazione delle astrazioni necessarie (come il provider LLM astratto) per garantire un basso accoppiamento e permettere lo sviluppo parallelo.
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*, Norme di Progetto e Glossario;
- Redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;
- Inizio redazione Piano di Qualifica_G;
- Creazione di uno script_G in grado di inserire automaticamente il pedice del *Glossario* sui documenti.

8.3.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del terzo sprint_G:

- Il ruolo di Analista ha richiesto un impegno superiore di 3 ore rispetto a quanto preventivato. Questo scostamento è dovuto a una mancanza di comunicazione sulle strategie di stesura durante lo sprint precedente: nella fase di revisione preliminare alla creazione dei diagrammi UML_G, il team ha riscontrato inconsistenze di formato tra le diverse sezioni dell'*Analisi dei Requisiti*. È stato necessario spendere ore non previste per uniformare e riscrivere le parti disallineate.
- Il ruolo di Progettista ha richiesto 2 ore in più rispetto al preventivo. Questo scostamento è dovuto a un errore di pianificazione: non avevamo considerato che, prima di avviare lo sviluppo pratico del PoC, fosse strettamente necessario definire l'architettura di base e scegliere le tecnologie. Per dare priorità a questo studio fondamentale, i progettisti hanno limitato la creazione dei mock-up_G a versioni essenziali, dedicando le ore extra alla progettazione del software;
- Il gruppo ha ottenuto un riscontro positivo nell'organizzazione e nella conduzione delle riunioni, adottando un approccio strutturato che ha garantito confronti produttivi, buone idee e una gestione ottimale del tempo;

8.3.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione organizzativo immediato per ottimizzare l'efficienza e sanare le criticità emerse nella retrospettiva_G:

- Promuovere l'uso di comunicazioni vocali informali rapide non appena sorge un dubbio o un'incomprensione, così da evitare che le difficoltà si accumulino e si traducano in scostamenti significativi rispetto al preventivo;
- Definire, condividere e validare un modello di esempio prima di avviare la stesura autonoma di parti corpose;
- Incoraggiare la lettura del lavoro altrui durante lo sprint per preservare la visione d'insieme e favorire l'allineamento tra i membri del team;
- Strutturare To-Do List interne più atomiche per definire con precisione l'avanzamento dei singoli documenti.

8.3.3.1 Pianificazione futura Alla luce dei risultati dello Sprint _G #3, il gruppo conferma il progressivo spostamento del focus dalle attività prevalentemente documentali verso la progettazione pura.

Nel prossimo sprint _G #4 verrà consolidata la fase architetturale iniziata in questa iterazione. Il ruolo di Progettista avrà il compito di raffinare le scelte sui framework e definire nel dettaglio l'isolamento dei moduli. Una volta completata questa base logica, il ruolo di Programmatore verrà attivato per tradurre le scelte progettuali in una prima implementazione del Proof of Concept.

Un ulteriore obiettivo sarà il rafforzamento della collaborazione tra progettazione e sviluppo, così da garantire una transizione fluida tra modello e implementazione. In questa fase sarà inoltre importante mantenere un equilibrio tra attività di apprendimento (lo studio delle tecnologie) e produzione, riducendo il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento degli strumenti.

Infine, il team continuerà a migliorare la qualità della pianificazione operativa, rendendo le attività sempre più chiare, atomiche e condivise, così da ridurre ambiguità e migliorare l'efficienza complessiva del lavoro nello sprint.

8.3.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint G #3 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle previsioni iniziali, concentrato principalmente sui ruoli di Analista (+3 ore per attività correttive e di allineamento sui requisiti) e di Progettista (+2 ore per anticipare lo studio architettuale necessario al PoC).

Nel complesso, queste variazioni risultano contenute e non alterano in modo significativo l'equilibrio generale della pianificazione, né la sostenibilità del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue restano ampiamente adeguate a coprire le attività future.

Di conseguenza, il team ha deciso di accettare gli scostamenti senza alterare il preventivo a finire. Questa scelta si basa sulla consapevolezza che le ore extra impiegate dai Progettisti in questo sprint costituiscono un investimento tecnico che snellerà i lavori nel prossimo ciclo, permettendo di iniziare lo sviluppo del PoC con fondamenta architeturali già consolidate. Tuttavia, qualora nei prossimi sprint dovessero emergere ulteriori necessità di profonda revisione dell'Analisi dei Requisiti, si provvederà a riconsiderare l'allocazione complessiva aggiornando il preventivo.

8.3.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del terzo sprint G , il team ha affrontato due rischi organizzativi critici descritti all'interno della Sezione 2 del documento.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Il rischio si è concretizzato durante la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, dove sono emerse marcate differenze formali e stilistiche tra le sezioni redatte in autonomia, causate da una parziale incomprensione delle norme grafiche del gruppo.
 - * **Esito della mitigazione:** Inizialmente insufficiente. La riluttanza dei membri nel richiedere chiarimenti tempestivi ha spostato la risoluzione alle fasi finali dello sprint G . Come intervento correttivo immediato, gli Analisti disponibili hanno attivato sessioni straordinarie di allineamento in piccoli gruppi, uniformando e riscrivendo le parti non conformi.
 - * **Impatto:** Rilevante. Ha costretto il team a erogare un monte ore extra imprevisto per sanare i difetti strutturali del documento prima della verifica.

- **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Rischio connesso al precedente. La disabitudine alle dinamiche di gruppo ha rallentato l'allineamento dei contenuti.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo a seguito di correzione. Il team ha organizzato meeting di allineamento. Questo ha forzato una revisione interna dei processi comunicativi, migliorando sensibilmente la coesione. A seguito di ciò, è stata aggiornata la Sezione 2 - Analisi dei rischi, introducendo la seguente direttiva: tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.

* **Impatto:** Moderato. Ha causato rallentamenti localizzati nella prima metà dello sprint, compensati dall'incremento di collaborazione sul finale.

8.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	6	-	-	6
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	3	-	8	11
A. Menegaldo	-	3	2	-	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	6	-	6
S. Zecchinato	4	-	-	-	6	-	10
Totale per ruolo	4	10	2	18	12	8	54

Tabella 29: *Consuntivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore consuntivate per ruolo

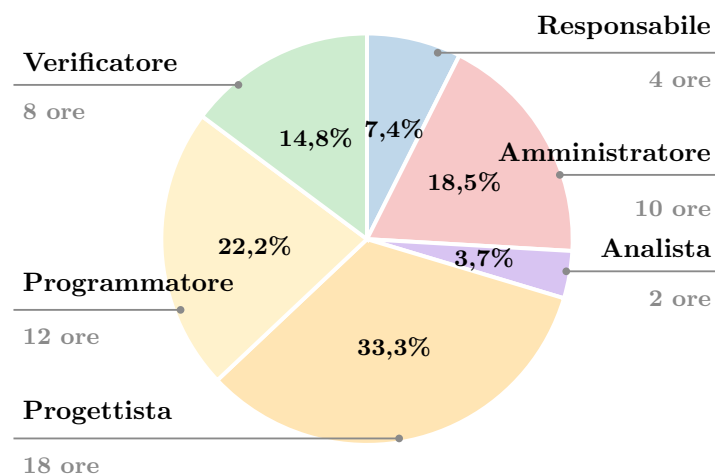


Figura 20: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #4

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	+2	120,00	+60,00
Amministratore	10	0	200,00	0,00
Analista	2	+1	50,00	+25,00
Progettista	18	-3	450,00	-75,00
Programmatore	12	-4	180,00	-60,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	54	-4	1.120,00	-50,00
Sprint pregressi	136	/	3.010,00	/
Restante	454	/	8.730,00	/

Tabella 30: *Consuntivo economico Sprint #4*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	22	23	65
E. De Piccoli	7	4	1	13	22	19	66
D. Facco	7	1	7	15	23	18	71
A. Marini	3	1	-2	22	23	15	62
A. Menegaldo	7	5	1	17	22	15	67
S. Vendramin	1	9	-4	22	15	16	59
S. Zecchinato	2	9	2	23	19	9	64
Totale per ruolo	29	31	8	125	146	115	454

Tabella 31: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #4*

8.4.1 Revisione delle attività

Nel corso del quarto sprint_G, il team ha svolto le seguenti attività coerentemente con la pianificazione:

- Consolidamento del documento di *Analisi dei Requisiti* in ogni sua singola sezione;
- Chiusura delle decisioni sullo stack tecnologico e sui framework di sviluppo per il prodotto *Second Brain* e per il relativo *Proof of Concept*;
- Il lavoro di progettazione durante la prima metà dello sprint si è occupato della stesura dei veri e propri contratti operativi. In questa fase sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- **Progettazione delle Interfacce (API Design):** Definizione dei contratti di comunicazione tra backend e frontend. Sono stati progettati i payload (schemi Pydantic), gli endpoint (es. `POST /api/summarize`) e le logiche del flusso SSE.
 - **Modellazione dei Flussi:** Definizione teorica del ciclo di vita del dato end-to-end: dall'input dell'utente, alla validazione, fino alla gestione delle eccezioni e all'annullamento dello stream.
 - **Grafo di dipendenze:** Traduzione del design in un grafo di dipendenze logiche e scomposizione in task.
- Introduzione formale delle attività del Programmatore nella seconda metà dello sprint, in collaborazione con i Progettisti;
 - Sviluppo iniziale del PoC: inizializzazione del repository condiviso, la configurazione di Docker Compose, la gestione dei segreti, l'impostazione del frontend (Vite + React + TypeScript con Tailwind CSS v4) e del backend (FastAPI), e la configurazione del middleware CORS;
 - Avvio del percorso di formazione e allineamento interno sulle tecnologie selezionate;
 - Avanzamento e stesura dei documenti di supporto, inclusi il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

8.4.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quarto sprint_G:

- Le valutazioni raccolte dal team hanno evidenziato una pianificazione iniziale idonea ma non esaustiva sul piano dello studio autonomo. La transizione verso l'ambiente di sviluppo pratico ha riscontrato barriere tecniche legate al know-how individuale. Per tale motivo, per non generare colli di bottiglia o stalli sulle scadenze, si è registrata una discrepanza di 2 ore produttive rispetto a quanto definito originariamente nel preventivo orario;
- Inoltre, il gruppo ha ritenuto di aver sovrastimato il carico di lavoro isolato per alcuni ruoli di coordinamento, in particolare per il Responsabile di progetto. A posteriori, il team ha beneficiato della scelta di ridurre il carico puro di gestione del Responsabile (sceso a 4 ore effettive), riallocando immediatamente le ore residue in mansioni operative e pesanti come lo sviluppo software per assorbire i ritardi infrastrutturali;
- Per via delle difficoltà tecniche insite nello studio dei framework, il gruppo ha inizialmente performato al di sotto delle aspettative nei task operativi individuali del Programmatore. Tuttavia, la creazione programmata di micro-gruppi autonomi e cooperativi (composti da Progettisti e Programmatori in costante affiancamento) ha favorito la condivisione rapida delle conoscenze e raddrizzato il rendimento globale, minimizzando le perdite di intensità lavorativa;
- La collaborazione tra i membri del gruppo è risultata particolarmente positiva: l'organizzazione in piccoli gruppi di lavoro ha permesso di confrontarsi sulla suddivisione ottimale delle attività e di mantenere alto il livello di comunicazione, riducendo il rischio di fraintendimenti in fasi delicate e ad alto coordinamento come quelle di design e progettazione;

- È stato valutato positivamente il lavoro di scomposizione delle task_G per il prossimo sprint_G relative alla progettazione: il team è finalmente riuscito a raggiungere un livello di dettaglio elevato, evitando la definizione di task_G generiche. Nelle attività di progettazione, in particolare, la definizione di task_G precise e di regole condivise si è confermata essenziale per impedire che più membri lavorino in contemporanea sugli stessi file, prevenendo conflitti e sovrapposizioni;
- Il team ha ottenuto un riscontro ampiamente positivo per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione delle riunioni di coordinamento. Al contrario, sono stati rilevati come aspetti da monitorare con costanza la velocità di adattamento ai nuovi IDE e agli strumenti di controllo e versionamento;
- Durante il quarto sprint_G, il Programmatore ufficiale (S. Vendramin) ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione per allinearsi sulle scelte architetturali. Di conseguenza, lo studio autonomo teorico delle tecnologie è passato provvisoriamente in secondo piano rispetto alla configurazione pratica dell'ambiente operativo locale e alla risoluzione dei conflitti di dipendenza;
- Gli ostacoli principali dal punto di vista organizzativo sono scaturiti dall'impatto combinato di una scarsa esperienza iniziale sulle librerie di backend e front-end. L'Issue Tracking System_G di GitHub_G non è stato pienamente sufficiente a mappare la complessità delle sotto-attività di configurazione hardware e software. Per questo motivo il team ha confermato la necessità di integrare metodologie di tracciamento dei task più granulari e To-Do List mirate prima di avviare le pull request_G;
- Nella prima metà dello sprint_G, le risorse assegnate alla produzione di codice hanno riscontrato rallentamenti critici che rischiavano di lasciare il Verificatore privo di artefatti da controllare. Durante la riunione di retrospettiva_G, il team ha convenuto che la strategia correttiva di mantenere il Verificatore a 8 ore stabili, applicando una rigorosa attività di code review preventiva sui file di configurazione, abbia evitato l'accumularsi di debito tecnico per i cicli futuri.

8.4.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione per migliorare l'organizzazione e la produttività del prossimo sprint_G, traendo insegnamento dalle problematiche riscontrate:

- Definire una To-Do List e una scomposizione dei task operativi più precisa;
- Organizzare riunioni di allineamento tecnico più brevi, asincrone e mirate;
- Incrementare l'interazione quotidiana tra il responsabile di progetto e il team di sviluppo;
- Pianificare lo studio delle nuove tecnologie in maniera graduata e distribuita nel tempo;
- Verificare costantemente l'avanzamento dei moduli software in parallelo alla documentazione;
- Programmare un incontro in presenza o in sessione dedicata con cadenza fissa;
- Sfruttare appieno la sinergia tra ruoli complementari tramite logiche di pair-programming;
- Fare leva sull'esperienza pregressa accumulata dai membri che hanno già ricoperto ruoli affini.

8.4.3.1 Pianificazione futura Come riportato nelle analisi a posteriori, il team ha dovuto riconsiderare e rimodulare l'approccio allo studio sistematico dello stack tecnologico. Nella fase di pianificazione iniziale, infatti, il gruppo aveva ipotizzato che l'allineamento su Python_G, React_G e le API_G degli LLM_G potesse completarsi rapidamente senza inficiare i tempi di sviluppo. Questa stima preliminare, tuttavia, non teneva conto dei tempi fisiologici di appianamento delle competenze e delle attività documentali di consolidamento dell'Analisi dei Requisiti. Lo studio specialistico approfondito e la codifica dei moduli core del PoC sono stati quindi rimodulati in sotto-attività incrementalmente da trascinare ed estendere nella pianificazione del prossimo periodo, che comprenderà:

- Completamento dello scheletro del back-end e test di chiamata alle API degli LLM;
- Sviluppo dell'interfaccia grafica modulare e gestione del rendering dei file Markdown_G.

8.4.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Riguardo alla ripartizione del budget, le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento o risparmiate grazie all'efficientamento dei processi comunicativi interni saranno interamente reinvestite negli sprint a ridosso delle milestone tecnologiche e della RTB_G. Questo consentirà di apportare raffinamenti formali alla documentazione e supportare l'incremento di effort richiesto per i test di sistema e di integrazione. Durante la retrospettiva_G, il team ha confermato l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, escludendo la necessità di rielaborare la data di consegna stimata. Nei prossimi sprint_G verrà mantenuta la flessibilità di allocazione oraria per spostare eventuali risorse eccedenti verso i ruoli di natura tecnica in caso di anomalie bloccanti sul codice.

8.4.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quarto sprint_G, il team ha affrontato l'affioramento concreto e l'impatto operativo dei rischi tecnologici precedentemente mappati nella sezione generale del documento. L'analisi sul campo ha evidenziato che l'applicazione tempestiva delle contromisure ha evitato ritardi strutturali, permettendo al gruppo di trarre importanti lezioni metodologiche.

- **Rischi occorsi e mitigati:**
 - **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**
 - * **Descrizione:** La limitata familiarità iniziale con il funzionamento di React_G e con i suoi meccanismi di gestione dello stato, oltre che con le librerie asincrone di Python_G per l'interazione con gli LLM_G, ha richiesto al Programmatore una fase di studio dedicata all'apprendimento dei framework prima di poter procedere con la codifica. Ciò ha causato un rallentamento nei task_G operativi, ostacolando l'integrazione immediata del codice.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci grazie alla flessibilità e alla dinamicità del team. Piuttosto che interrompere le attività per uno studio isolato, i membri con maggiore esperienza tecnico-architetturale hanno affiancato la risorsa in difficoltà tramite sessioni estese di *pair-programming*, sbloccando lo sviluppo delle componenti di baseline del PoC.
 - * **Impatto:** Moderato. Ha costretto il team a erogare ore aggiuntive nel ruolo di Programmatore per superare le barriere di apprendimento iniziali delle API_G.
 - **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**
 - * **Descrizione:** Si sono verificati conflitti imprevisti e disallineamenti di configurazione durante il merge_G dei branch_G locali e l'apertura delle prime pull request_G

su GitHub_G, rallentando la sincronizzazione del codice e della documentazione in LaTeX_G.

- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il Responsabile e l'Amministratore hanno supportato operativamente la risorsa applicando con rigore le procedure definite nelle Norme di Progetto_G. L'utilizzo di template_G standardizzati e l'introduzione di controlli preventivi sul repository_G hanno permesso di risolvere i conflitti salvaguardando l'integrità del lavoro.
- * **Impatto:** Contenuto. Ha generato inefficienze temporanee nel flusso di approvazione, risolte senza impattare sulle scadenze di fine sprint_G.

– **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La pianificazione iniziale dello sprint_G ha attribuito un peso insufficiente al ruolo di Programmatore, preventivando l'impiego di un'unica risorsa (S. Vendramin) per la codifica dei moduli di baseline del PoC. La curva di apprendimento sulle tecnologie e la mole di configurazione richiesta hanno reso questa stima inadeguata, generando uno scostamento orario sui ruoli tecnici: il Programmatore ha consuntivato 12 ore (4 in più rispetto alle 8 preventivate) e il Progettista 18 ore (3 in più rispetto alle 15 preventivate).
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Per evitare un collo di bottiglia sul singolo Programmatore, il team ha riallocato dinamicamente le risorse: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività, è intervenuto a supporto della codifica affiancando la risorsa ufficiale. Questa correzione in corsa ha permesso di assorbire il carico aggiuntivo senza compromettere gli obiettivi dello sprint_G.
- * **Impatto:** Moderato. Le ore supplementari erogate sui ruoli tecnici sono state in larga parte compensate dai risparmi ottenuti sui ruoli di coordinamento, mantenendo lo scostamento complessivo del preventivo entro margini gestibili. L'evento ha comunque evidenziato la necessità di dimensionare con maggiore prudenza il ruolo di Programmatore nelle stime future, prevedendo fin dalla pianificazione l'affiancamento di una seconda risorsa nelle fasi di codifica più intense.

• **Rischi attesi e gestiti con successo:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli:** Il passaggio di consegne all'inizio dello sprint_G è stato superato con successo estendendo la durata degli incontri interni dedicati al passaggio di informazioni. I membri uscenti hanno fornito indicazioni dettagliate sul lavoro pregresso, riducendo i tempi di adattamento dei subentranti.

8.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	9	9
E. De Piccoli	-	-	-	-	7	-	7
D. Facco	-	-	-	-	12	-	12
A. Marini	-	-	-	-	12	-	12
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	4	-	10
Totale per ruolo	2	8	-	6	41	9	66

Tabella 32: *Consuntivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore consuntivate per ruolo

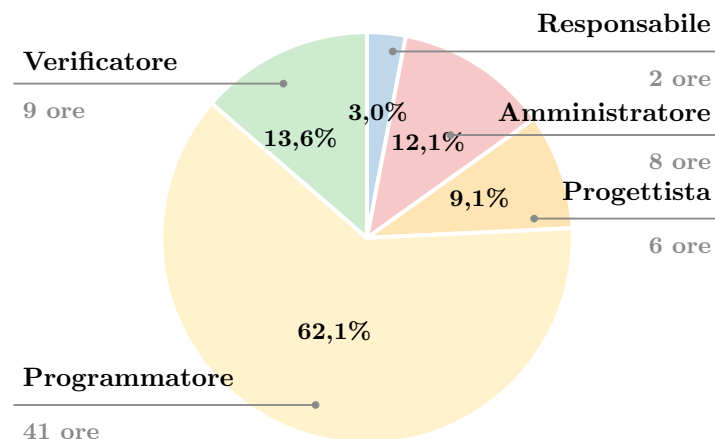


Figura 21: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #5

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quinto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	2	0	60,00	0,00
Amministratore	8	0	160,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	6	0	150,00	0,00
Programmatore	41	-4	615,00	-60,00
Verificatore	9	+1	135,00	+15,00
Totale	66	-3	1.120,00	-45,00
Sprint pregressi	190	/	4.130,00	/
Restante	388	/	7.610,00	/

Tabella 33: *Consuntivo economico Sprint #5*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	22	14	59
E. De Piccoli	7	4	1	13	15	19	59
D. Facco	7	1	7	15	11	18	59
A. Marini	3	1	-2	19	11	15	47
A. Menegaldo	5	5	1	17	16	15	59
S. Vendramin	1	1	-4	22	18	16	54
S. Zecchinato	2	9	2	17	12	9	51
Totale per ruolo	27	23	8	119	105	106	388

Tabella 34: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #5*

8.5.1 Revisione delle attività

Nel corso del quinto sprint_G, il team ha portato avanti lo sviluppo del *Proof of Concept* del prodotto *Second Brain*, concentrando l'impegno sulle attività di codifica e di verifica. In particolare sono state svolte le seguenti attività, coerentemente con la pianificazione:

- Implementazione degli endpoint del back-end a supporto delle funzionalità basate su LLM_G (riassunto, riscrittura, traduzione e correzione del testo), con la relativa gestione del flusso di risposta in streaming;
- Sviluppo dei componenti front-end dell'editor e della vista di anteprima, con la gestione del rendering dei contenuti in formato Markdown_G;

- Integrazione progressiva tra front-end e back-end, con la verifica del corretto scambio dei dati e della gestione degli errori di comunicazione;
- Suddivisione del lavoro di sviluppo in issue_G atomiche e tracciabili, così da ridurre le sovrapposizioni tra i Programmatori e rendere più semplice la revisione delle pull request_G ;
- Organizzazione di brevi riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori con cadenza di pochi giorni, finalizzate ad allineare lo stato di avanzamento, individuare le attività ancora mancanti e mantenere il ritmo di lavoro;
- Attività di verifica incrementale sul codice prodotto e avanzamento dei documenti di supporto, in particolare il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

8.5.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quinto sprint_G :

- Il bilancio complessivo dello sprint_G è stato positivo: lo scostamento tra le ore preventivate (63) e quelle effettivamente svolte (66) è risultato contenuto, a conferma del fatto che il gruppo ha saputo fare tesoro delle criticità emerse negli sprint_G precedenti, applicando le azioni correttive individuate nelle relative retrospettive $_G$;
- L'obiettivo principale dello sprint_G , ovvero il completamento dello sviluppo del *Proof of Concept*, non è stato raggiunto interamente: alcune attività di rifinitura, integrazione e verifica $_G$ sono state rinviate allo Sprint_G #6. Lo slittamento è imputabile soprattutto alla ridotta disponibilità dei membri in concomitanza con la sessione d'esami (rischio RO-1 – Periodi di rallentamento), che ha compresso il tempo effettivamente dedicabile allo sviluppo nella finestra dello sprint_G ;
- Sul piano delle ore, lo scostamento più rilevante ha interessato il ruolo di Programmatore, che ha consuntivato 41 ore a fronte delle 37 preventivate. Le 4 ore aggiuntive rientrano in un margine del tutto fisiologico per attività di codifica e integrazione: parte dell'effort supplementare è derivato dalla risoluzione di alcune difficoltà tecniche emerse durante l'integrazione tra front-end e back-end e dalla messa a punto della gestione dello streaming delle risposte, attività la cui complessità è risultata leggermente superiore alla stima iniziale. Lo scostamento non ha comunque inciso sul rispetto degli obiettivi dello sprint_G ;
- All'interno del ruolo di Programmatore il carico è stato ridistribuito in corso d'opera: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività di Progettista, è intervenuto a supporto della codifica assorbendo alcune ore inizialmente in carico a E. De Piccoli, così da mantenere costante il ritmo di sviluppo del PoC;
- Per i restanti ruoli il gruppo ha raggiunto un buon equilibrio tra ore preventivate ed effettive. In particolare, il Responsabile, per il quale era stato previsto un carico orario contenuto sul piano del puro coordinamento, ha svolto anche attività di Programmatore: questa scelta ha permesso di allocare al meglio le risorse disponibili ed evitare di sovraccaricare gli altri Programmatori, sfruttando la disponibilità residua quando una risorsa si trovava temporaneamente priva di task_G bloccanti;
- La suddivisione del lavoro del PoC in issue_G di granularità molto fine si è confermata una scelta vincente: la definizione di task_G atomici ha ridotto le sovrapposizioni sugli stessi file e ha reso più scorrevole il processo di revisione e integrazione del codice;

- Le riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori, organizzate con cadenza ravvicinata, si sono rivelate fondamentali in un lavoro fortemente collaborativo come lo sviluppo del PoC: hanno consentito di verificare costantemente l'avanzamento, di capire tempestivamente cosa mancasse e di mantenere il gruppo allineato sul ritmo di lavoro, prevenendo disallineamenti e blocchi reciproci;
- Il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e collaborativo, e la comunicazione interna è risultata fluida e tempestiva sia nelle riunioni dedicate sia nello scambio quotidiano tra i membri del gruppo.

8.5.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito alcune linee guida per consolidare l'organizzazione raggiunta e proseguire con la stessa efficacia nel prossimo sprint_G:

- Mantenere la suddivisione del lavoro in issue_G atomiche e ben tracciabili;
- Conservare la cadenza ravvicinata delle riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori;
- Continuare a sfruttare la flessibilità nell'allocazione delle risorse, reimpiegando le ore residue dei ruoli di coordinamento sulle attività tecniche in caso di necessità;
- Proseguire la verifica incrementale del codice in parallelo all'avanzamento della documentazione.

8.5.3.1 Pianificazione futura Lo sviluppo del PoC procederà nel prossimo periodo con il completamento e il consolidamento delle funzionalità basate su LLM_G, l'affinamento dell'interfaccia utente e l'estensione delle attività di test e di verifica sull'integrazione tra le componenti. La buona tenuta della pianificazione di questo sprint_G conferma l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, senza necessità di rielaborare la data di consegna stimata.

8.5.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Lo scostamento orario registrato in questo sprint_G è risultato minimo e pienamente assorbito dalla flessibilità di allocazione delle risorse, senza richiedere una revisione sostanziale del preventivo a finire. Le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento restano disponibili per essere reinvestite, nei prossimi sprint_G, sulle attività tecniche e sui raffinamenti documentali in prossimità delle milestone_G del progetto.

8.5.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quinto sprint_G non si sono manifestati rischi di particolare gravità. I rischi affiorati erano già stati mappati nella sezione generale del documento e sono stati gestiti con esito positivo grazie all'applicazione tempestiva delle relative contromisure.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** Durante la codifica delle componenti del PoC sono emerse alcune difficoltà legate alla limitata familiarità con la gestione dello streaming delle risposte degli LLM_G e con l'integrazione tra il back-end Python_G e il front-end React_G, che hanno richiesto un impegno leggermente superiore al previsto sul ruolo di Programmatore.

- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci: i membri con maggiore dimestichezza tecnica hanno affiancato chi incontrava difficoltà e le frequenti riunioni interne di coordinamento hanno favorito la rapida condivisione delle soluzioni, evitando che i singoli rimanessero bloccati a lungo sullo stesso problema.
 - * **Impatto:** Contenuto. Si è tradotto unicamente nelle 4 ore aggiuntive consuntivate sul ruolo di Programmatore, riassorbite grazie alla riallocazione delle ore residue del Responsabile sulle attività di sviluppo.
- **RO-3 - Contrasti interni al gruppo**
- * **Descrizione:** Nel corso dello sprint_G si sono presentate alcune divergenze di opinione su scelte tecniche e organizzative relative allo sviluppo del PoC. Non si è trattato di veri e propri contrasti, quanto piuttosto del normale confronto tra idee differenti su come affrontare alcune attività.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo. Coerentemente con quanto previsto nella sezione di gestione dei rischi, il gruppo ha adottato un approccio democratico, discutendo collettivamente le alternative durante le riunioni di coordinamento e convergendo verso la soluzione condivisa più adatta. Il confronto è sempre rimasto costruttivo e ha contribuito a migliorare le decisioni prese.
 - * **Impatto:** Trascurabile. Le divergenze sono state risolte rapidamente, senza generare situazioni di stallo né incidere sul clima di lavoro o sull'avanzamento dello sprint_G.

8.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	7	-	7
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	8	11
D. Facco	-	-	-	-	7	-	7
A. Marini	-	-	-	7	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	1	3	-	4
S. Vendramin	-	-	-	-	4	9	13
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	21	17	58

Tabella 35: *Consuntivo orario Sprint #6*

Distribuzione ore per ruolo

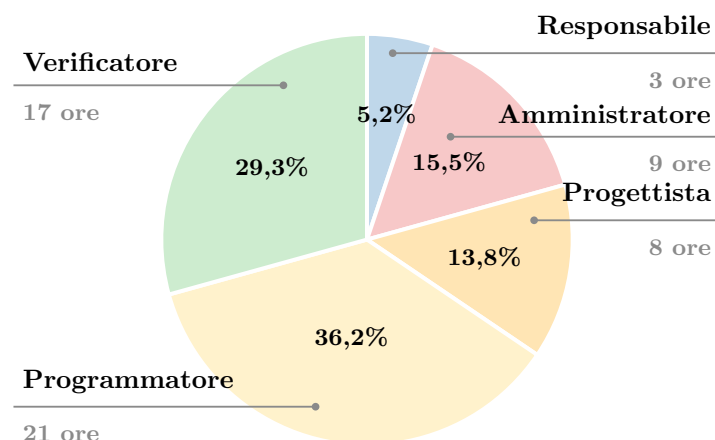


Figura 22: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #6

Di seguito è riportato il consuntivo economico del sesto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	9	0	180,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	8	0	200,00	0,00
Programmatore	21	+3	315,00	+45,00
Verificatore	17	-2	255,00	-30,00
Totale	58	+1	1.040,00	+15,00
Sprint pregressi	256	/	5.250,00	/
Restante	330	/	6.570,00	/

Tabella 36: *Consuntivo economico Sprint #6*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	15	14	52
E. De Piccoli	4	4	1	13	15	11	48
D. Facco	7	1	7	15	4	18	52
A. Marini	3	1	-2	12	11	15	40
A. Menegaldo	5	5	1	16	13	15	55
S. Vendramin	1	1	-4	22	14	7	41
S. Zecchinato	2	0	2	17	12	9	42
Totale per ruolo	24	14	8	111	84	89	330

Tabella 37: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #6

8.6.1 Revisione delle attività

Nel corso del sesto sprint_G il team ha concentrato l'impegno sulle attività di programmazione e di verifica_G, in vista della presentazione della RTB_G. Le attività principali svolte sono state:

- completamento dello sviluppo del *Proof of Concept*, con la rifinitura delle funzionalità basate su LLM_G e la stabilizzazione dell'integrazione tra front-end e back-end;
- verifica_G approfondita dei documenti in vista della RTB_G, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto*, al *Piano di Progetto* e al *Piano di Qualifica*;
- completamento del *Piano di Qualifica*;
- incontro con la Proponente_G per mostrare il *Proof of Concept* e raccogliere il riscontro;
- preparazione delle diapositive per la presentazione RTB_G delle tecnologie;
- redazione della lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti.

Non è invece stato possibile inoltrare al prof. Cardin la richiesta del colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_G entro la finestra dello sprint_G: la mole di documenti da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta alla concomitante sessione d'esami, non ha consentito di rispettare i tempi previsti. La richiesta è quindi stata rimandata al 25 giugno 2026, all'inizio dello Sprint_G #7.

8.6.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del sesto sprint_G:

- Lo scostamento tra le ore preventivate (59) e quelle effettivamente consuntivate (58) è risultato minimo e ha interessato soprattutto i ruoli di Programmatore (21 ore contro le 24 preventivate) e di Verificatore (17 ore contro le 15 preventivate);
- La lieve riduzione delle ore di Programmatore è dovuta al fatto che le attività di completamento del *Proof of Concept*, potendo contare sulla base già consolidata negli sprint_G precedenti, hanno richiesto un lavoro di rifinitura di poco inferiore alla stima;

- Sul piano della distribuzione individuale, alcuni membri hanno potuto dedicare meno tempo del previsto alla codifica a causa degli impegni concomitanti della sessione d'esami: in particolare A. Menegaldo ha svolto meno ore di Programmatore, il cui carico è stato in parte assorbito da S. Vendramin; E. De Piccoli, invece, ha consuntivato qualche ora in più come Verificatore a supporto del controllo dei documenti in vista della RTB_G;
- Il ruolo di Verificatore ha richiesto complessivamente più ore rispetto al preventivo (17 contro le 15 previste): la mole di documentazione da controllare a fondo in vista della revisione della RTB_G (*Analisi dei Requisiti*, *Norme di Progetto*, *Piano di Progetto* e *Piano di Qualifica*) ha comportato un carico di verifica_G superiore alla stima iniziale. Nonostante ciò, la ridotta disponibilità dei membri per la concomitante sessione d'esami non ha lasciato il tempo necessario a completare tutte le verifiche entro lo sprint_G: parte del controllo dei documenti e la consegna della RTB_G sono slittate di circa cinque giorni, all'inizio dello Sprint_G #7;
- Nonostante lo slittamento, l'obiettivo centrale dello sprint_G, ovvero il completamento del *Proof of Concept*, è stato raggiunto, così come la stesura del *Piano di Qualifica*;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo: le divergenze di opinione emerse sono state gestite con il consueto confronto democratico, senza incidere sull'avanzamento delle attività.

8.6.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

8.6.3.1 Pianificazione futura Le attività residue di verifica_G dei documenti e la formalizzazione della consegna della RTB_G sono state riprogrammate nei primissimi giorni dello Sprint_G #7. Il completamento del *Proof of Concept* consente di considerare conclusa la fase di sviluppo prevista per la RTB_G e di concentrare il periodo successivo sul consolidamento della documentazione e sulla preparazione della presentazione.

8.6.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint_G #6 il preventivo a finire non presenta variazioni nella distribuzione delle ore per ruolo; i consuntivi degli sprint_G già conclusi restano invariati. Risultano consuntivate complessivamente 314 ore delle 644 preventivate, con 330 ore residue per un valore di 6.570,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.6.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_G #6 si sono manifestati due rischi già previsti nel documento, entrambi gestiti senza compromettere gli obiettivi principali:

- **Rischi occorsi e mitigati:**
 - **RO-1 - Periodi di rallentamento**
 - * **Descrizione:** La concomitanza con la sessione d'esami ha ridotto la disponibilità oraria di tutti i membri del gruppo, comprimendo il tempo dedicabile alle attività di sviluppo e, soprattutto, di verifica_G della documentazione.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo. Grazie alla pianificazione che teneva già conto dei periodi di minore disponibilità e alla flessibilità nell'allocazione delle risorse, il gruppo ha contenuto lo scostamento orario e ha comunque completato il *Proof of Concept*.

- * **Impatto:** Contenuto. L'unico effetto rilevante è stato lo slittamento di circa cinque giorni della consegna della RTB_G, avvenuta il 25 giugno 2026 all'inizio dello Sprint_G #7.

– **RO-6 - Errori di pianificazione**

- * **Descrizione:** Il gruppo aveva sovrastimato la possibilità di svolgere il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G entro lo Sprint_G #6. La quantità di documenti corposi da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta agli esami, ha reso l'obiettivo non realizzabile nella finestra prevista.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il gruppo ha riprogrammato la richiesta del colloquio e la finalizzazione delle verifiche nei primi giorni dello Sprint_G #7, dando priorità al completamento accurato dei controlli piuttosto che al rispetto rigido della finestra temporale.
- * **Impatto:** Contenuto. Lo slittamento ha riguardato pochi giorni e non ha inciso sulla qualità della documentazione né sugli obiettivi complessivi della RTB_G.

– **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Sostenere una collaborazione continua durante la sessione d'esami è risultato difficile a causa della limitata disponibilità dei membri del team; è stato necessario organizzare riunioni più concise e definire task_G mirati.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. La pianificazione adottata si è rivelata adeguata, grazie soprattutto all'esperienza maturata nel corso degli sprint_G precedenti, alleviando il carico individuale senza compromettere l'avanzamento del progetto.
- * **Impatto:** Contenuto. Il gruppo ha mantenuto il ritmo di lavoro previsto nonostante la ridotta disponibilità.

8.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	2	2
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	-	-
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 38: *Consuntivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

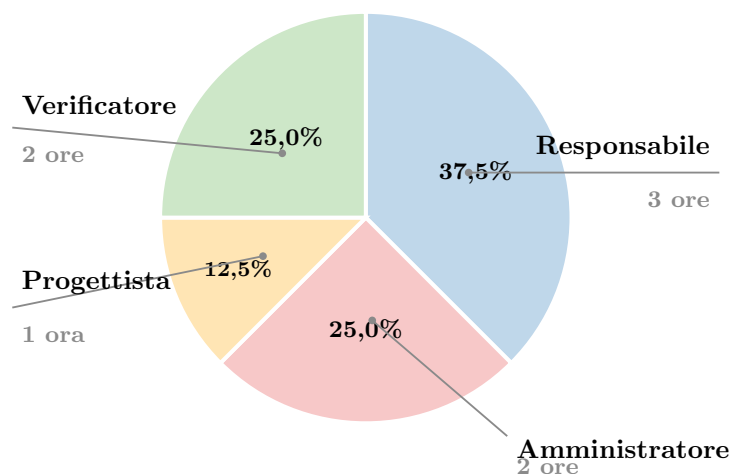


Figura 23: Areogramma della distribuzione delle ore consumate per ruolo nello Sprint #7

Di seguito è riportato il consuntivo economico del settimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	2	0	40,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	1	0	25,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	2	0	30,00	0,00
Totale	8	0	185,00	0,00
Sprint pregressi	314	/	6.290,00	/
Restante	301	/	5.860,00	/

Tabella 39: *Consuntivo economico Sprint #7*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	15	12	47
E. De Piccoli	4	4	1	10	15	11	45
D. Facco	4	1	7	12	4	18	46
A. Marini	3	1	-2	9	11	15	37
A. Menegaldo	5	3	1	13	13	15	50
S. Vendramin	1	1	-4	18	14	7	37
S. Zecchinato	2	0	2	14	12	9	39
Totale per ruolo	21	12	8	89	84	87	301

Tabella 40: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #7

8.7.1 Revisione delle attività

Nel corso del settimo sprint_G il team ha lavorato alla consegna della RTB_G, all'aggiornamento e all'approvazione della documentazione, all'avvio della progettazione e a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase di Product Baseline_G. Le attività principali svolte sono state:

- stesura del consuntivo dello Sprint_G #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_G #7 nel *Piano di Progetto*;
- aggiornamento del *Piano di Qualifica* con l'aggiunta degli Sprint_G #6 e #7;
- approvazione di tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_G della RTB_G;
- redazione della lettera di presentazione della RTB_G destinata al prof. Vardanega;
- invio al prof. Cardin della candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G, inoltrata il 25 giugno 2026, e successivo studio e preparazione della presentazione;
- avvio della progettazione dell'MVP_G, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analisi dei documenti da produrre nella fase di Product Baseline_G, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specific Tecnica*, per comprenderne struttura e contenuti;
- svolgimento di ore di palestra dedicate all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline_G.

8.7.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del settimo sprint_G:

- Le ore preventivate (8) e quelle effettivamente consuntivate (8) hanno coinciso, senza scostamenti: la pianificazione dello sprint_G si è rivelata accurata;
- Oltre ai ruoli di coordinamento e amministrazione, lo sprint_G ha coinvolto il Progettista per l'avvio della progettazione dell'MVP_G e il Verificatore per il controllo dei documenti portati in baseline_G: le due ore di verifica_G sono state svolte da L. Battistella;

- Coerentemente con la natura dello sprint_G, gran parte dell’impegno del gruppo è stato dedicato alle ore di palestra, non rendicontate come produttive ma fondamentali per acquisire la padronanza tecnica necessaria all’avvio della fase successiva;
- Guardando indietro, il gruppo riconosce che sarebbe stato utile affrontare con maggiore anticipo lo studio dei documenti della Product Baseline_G: averne compreso prima struttura e contenuti avrebbe reso più fluido l’avvio della progettazione;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e non si sono manifestate criticità di rilievo.

8.7.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

8.7.3.1 Pianificazione futura Con la consegna della RTB_G e l’avvio dell’interazione con il prof. Cardin, nel periodo successivo il gruppo si concentrerà sulla fase di Progettazione e Codifica, mettendo a frutto le competenze consolidate durante le ore di palestra.

8.7.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint_G #7 il gruppo ha rivisto la stima delle ore ancora necessarie al completamento del progetto. La progettazione è stata infatti in gran parte completata durante la fase di RTB_G: le funzionalità residue sono prevalentemente da estendere e richiederanno soprattutto attività di codifica anziché di progettazione. Inoltre, i consuntivi dei primi sprint_G sono stati contenuti a causa della rilevante attività di “palestra” e apprendimento, che nei prossimi sprint_G diminuirà a favore di un maggior numero di ore produttive per periodo. Per questi motivi sono state rimosse 21 ore dal ruolo Progettista_G, ritenute sovrastimate, lasciando invariati gli altri ruoli. Risultano quindi consuntivate complessivamente 322 ore delle 623 preventivate, con 301 ore residue per un valore di 5.860,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.7.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_G #7 non si sono manifestati rischi di rilievo. Il periodo, dedicato principalmente all’attesa del riscontro sulla presentazione e alle attività di palestra, si è svolto senza scostamenti significativi rispetto a quanto pianificato.

8.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	15	-	-	15
D. Facco	-	-	15	-	-	-	15
A. Marini	11	-	-	-	-	-	11
A. Menegaldo	-	9	-	-	-	-	9
S. Vendramin	-	-	-	14	-	-	14
S. Zecchinato	-	-	14	-	-	-	14
Totale per ruolo	11	9	29	29	-	10	88

Tabella 41: *Consuntivo orario Sprint #8*

Distribuzione ore per ruolo

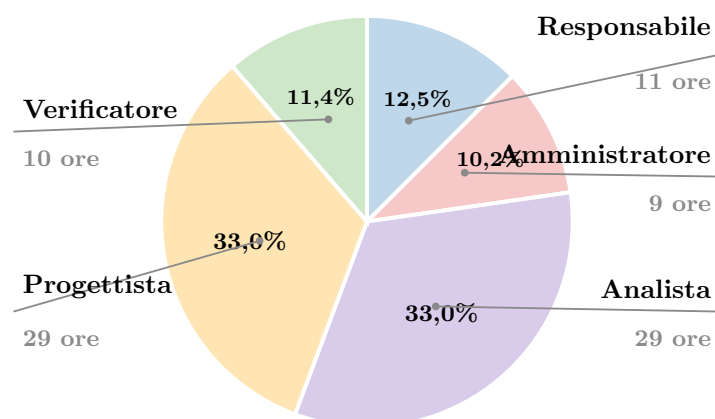


Figura 24: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #8

Di seguito è riportato il consuntivo economico dell'ottavo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	11	-1	330,00	-30,00
Amministratore	9	-1	180,00	-20,00
Analista	29	-5	725,00	-125,00
Progettista	29	-5	725,00	-125,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	10	0	150,00	0,00
Totale	88	-12	2.110,00	-300,00
Sprint pregressi	322	/	6.475,00	/
Restante	213	/	3.750,00	/

Tabella 42: Consuntivo economico Sprint #8

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	15	2	37
E. De Piccoli	4	4	1	-5	15	11	30
D. Facco	4	1	-8	12	4	18	31
A. Marini	-8	1	-2	9	11	15	26
A. Menegaldo	5	-6	1	13	13	15	41
S. Vendramin	1	1	-4	4	14	7	23
S. Zecchinato	2	0	-12	14	12	9	25
Totale per ruolo	10	3	-21	60	84	77	213

Tabella 43: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #8

8.8.1 Consuntivo di periodo

Nel corso dell'ottavo sprint_G il team ha operato su tre fronti paralleli: il recepimento dei rilievi del prof. Riccardo Cardin, la seconda parte della presentazione RTB_G con il prof. Tullio Vardanega e l'avvio della fase di Product Baseline_G. Le attività effettivamente svolte sono state:

- sistemazione degli errori e dei requisiti_G segnalati dal prof. Riccardo Cardin nell'*Analisi dei Requisiti*, con riscrittura dei requisiti_G non funzionali in forma misurabile e verificabile_G e conseguente aggiornamento delle tabelle di tracciamento;
- studio e preparazione, sia individuale sia collettiva, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega;
- preparazione dei materiali e delle argomentazioni da presentare al prof. Tullio Vardanega e svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G;
- avvio della fase di Product Baseline_G a valle dell'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, con impostazione delle attività e dei documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avvio, da parte dei Progettisti_G, della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G a partire dal *Proof of Concept*;
- analisi dei design pattern_G e dell'architettura_G generale del prodotto, con avvio della relativa stesura nel documento di *Specificazione Tecnica*.

Sul piano dei consumi, a fronte di 76 ore preventivate ne sono state consuntivate 88, con uno scostamento_G di 12 ore (+15,8%) e un costo di 2.110,00 € contro i 1.810,00 € previsti, pari a un maggior onere di 300,00 €. Lo sfondamento si concentra interamente sui ruoli di Analista_G (29 ore contro 24) e Progettista_G (29 ore contro 24), mentre Responsabile_G e Amministratore_G registrano uno scostamento_G contenuto di un'ora ciascuno e il Verificatore_G chiude in linea con il preventivo. Con questo periodo il monte ore complessivamente consuntivato sale a 410 ore delle 623 preventivate, per un valore di 8.585,00 €, lasciando 213 ore residue pari a 3.750,00 €.

Va sottolineato che si tratta comunque dello sprint_G più oneroso dall'avvio del progetto: le 88 ore consuntivate sono circa il doppio della media dei periodi precedenti, pari a 46 ore per sprint_G negli Sprint_G dal #1 al #7. L'incremento era in buona parte atteso e voluto, poiché deliberato in sede di pianificazione_G per assorbire i "tempi morti" dei periodi precedenti; lo scostamento_G di 12 ore rappresenta invece la quota non prevista, analizzata nel paragrafo seguente.

8.8.2 Retrospettiva

Gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti nella loro totalità: tutte le attività pianificate sono state portate a termine entro la finestra dei quattordici giorni e nessun elemento è stato rimandato allo sprint_G successivo. Il grado di raggiungimento è quindi da considerarsi pieno sul piano dei risultati, ma parziale sul piano dell'efficienza, dato lo scostamento_G orario registrato. Dal confronto interno sono emerse le seguenti ragioni presunte delle discrepanze:

- **Complessità imprevista nell'analisi dei design pattern_G.** I Progettisti_G avevano stimato l'attività come una selezione fra alternative già note, mentre si è rivelata un lavoro di valutazione comparativa ben più oneroso: la scelta dei pattern_G per la mediazione verso il servizio LLM_G e per la gestione dello stato dell'editor ha richiesto di scartare due ipotesi iniziali dopo averle già istruite, e la ricaduta sull'architettura_G generale ha imposto di rivedere la suddivisione in livelli prima di poterla documentare nella *Specific Tecnica*. A questo si aggiunge la scarsa familiarità pregressa del gruppo con la formalizzazione architeturale, mai affrontata prima in un contesto di progetto reale. Le 5 ore eccedenti sul ruolo Progettista_G sono interamente riconducibili a questa attività.
- **Tempi più lunghi del previsto per il refactoring_G dei requisiti_G.** La riscrittura dei requisiti_G non funzionali segnalati dal prof. Cardin non si è esaurita nella riformulazione testuale: rendere ciascun requisito_G misurabile ha richiesto di individuare metriche e soglie oggettive e, in diversi casi, di scomporre un singolo requisito_G generico in più requisiti_G distinti. L'operazione ha innescato un effetto a catena sulle tabelle di tracciamento verso i casi d'uso_G e sui riferimenti presenti nel *Piano di Qualifica*, che gli Analisti_G non avevano considerato in sede di stima. Le 5 ore eccedenti sul ruolo Analista_G derivano da questo effetto propagativo.
- **Colli di bottiglia organizzativi attorno all'incontro con il prof. Vardanega.** La concentrazione della presentazione RTB_G nella prima parte del periodo ha reso necessari alcuni momenti di allineamento collettivo aggiuntivi rispetto a quelli pianificati, durante i quali parte del gruppo è rimasta in attesa senza poter avanzare sui propri task_G. La fase di PB_G ha inoltre potuto essere avviata concretamente solo a valle dell'esito dell'incontro, comprimendo le attività di progettazione_G nella seconda metà dello sprint_G e riducendo il margine disponibile per assorbire gli imprevisti. Il maggior carico di coordinamento spiega l'ora eccedente sul Responsabile_G e sull'Amministratore_G.

Sul piano positivo, il gruppo rileva che l'aumento del monte ore preventivato ha effettivamente eliminato i "tempi morti" osservati negli Sprint_G #6 e #7: la scelta di densificare la pianificazione_G si è dimostrata corretta nella direzione, se non ancora nella misura. Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e la ripartizione su due Analisti_G e due Progettisti_G ha consentito la revisione incrociata che il gruppo si era prefissato.

8.8.3 Misure correttive

A fronte delle criticità rilevate, il gruppo ha definito le seguenti azioni correttive:

- **Istruttoria preliminare delle scelte architettureali.** Prima di stimare le attività di progettazione_G, i Progettisti_G dedicano una sessione dedicata alla ricognizione delle alternative disponibili, producendo un elenco motivato dei pattern_G candidati. La stima viene formulata solo dopo tale ricognizione, così da non scontare a posteriori il costo delle ipotesi scartate.

- **Stima estesa agli effetti propagativi.** Ogni attività che modifica requisiti_G, casi d'uso_G o loro tracciamenti viene stimata includendo esplicitamente l'aggiornamento dei documenti collegati, in particolare il *Piano di Qualifica*. La verifica_G di coerenza fra documenti diventa parte della definizione di completamento del task_G.
- **Disaccoppiamento delle attività dai riscontri esterni.** Il Responsabile_G pianifica per ogni periodo un insieme di attività indipendenti dagli incontri con la committenza_G e dai riscontri esterni, da assegnare ai membri che si trovino temporaneamente bloccati, riducendo i tempi di attesa collettiva.
- **Riequilibrio del budget del ruolo Analista_G.** Il monte ore residuo dell'Analista_G risulta negativo (-21 ore) a seguito dello sfondamento: il gruppo interviene sul preventivo a finire riportandolo in positivo, come descritto nel paragrafo dedicato.

8.8.3.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_G #8 ha visto la manifestazione concreta di due rischi_G già censiti, la cui valutazione viene aggiornata di conseguenza nella Sezione §2 e nella relativa tabella riassuntiva:

- **RO-6 – Errori di pianificazione_G:** la probabilità passa da *Bassa* a *Media*. Il rischio_G si è manifestato nella mancata considerazione delle dipendenze fra la revisione dei requisiti_G e i documenti da essa derivati, e nella compressione delle attività di progettazione_G nella seconda metà del periodo. Alle contromisure già previste viene aggiunta la pianificazione_G di attività indipendenti dai riscontri esterni.
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la probabilità passa da *Media* ad *Alta*. La sotto-stima si è verificata simultaneamente sui ruoli Analista_G e Progettista_G e riguarda attività, quali la definizione dell'architettura_G e la formalizzazione dei requisiti_G non funzionali, che il gruppo affronta per la prima volta e per le quali non dispone ancora di dati storici affidabili. Alle contromisure viene aggiunta l'istruttoria preliminare delle scelte architetture prima della formulazione delle stime.

Il rischio_G RO-4 (*Risorse disponibili ma non impiegate*) non ha invece prodotto effetti apprezzabili: l'incremento del monte ore preventivato ha eliminato i periodi di inattività riscontrati negli sprint_G precedenti e la sua valutazione resta invariata.

8.8.4 Miglioramento della pianificazione futura

Nel breve termine, ossia a partire dallo Sprint_G #9, le misure adottate incidono su tre aspetti della gestione del lavoro. In primo luogo il monte ore preventivato per periodo resta sui livelli raggiunti in questo sprint_G: il ritmo di 80-90 ore effettive si è dimostrato sostenibile e necessario per la fase di Product Baseline_G, che concentra progettazione_G, codifica_G e stesura documentale. In secondo luogo la composizione dei ruoli si sposta verso l'implementazione_G: il gruppo reintroduce due Programmatori_G, mantenendo due Progettisti_G dedicati alla progettazione_G di dettaglio e alla definizione dei pattern_G architetture, così da fornire ai Programmatori_G una base implementabile senza interrompere il flusso di lavoro. In terzo luogo la stesura della *Specifica Tecnica* viene distribuita lungo tutta la fase anziché concentrata al termine, procedendo di pari passo con le decisioni progettuali che documenta.

Nel lungo termine il gruppo adotta un criterio di stima più prudente per le attività prive di precedenti storici: a queste viene applicato un margine esplicito, in luogo della stima puntuale usata finora, riconoscendo che l'esperienza maturata sugli sprint_G di documentazione non è trasferibile alle attività di progettazione_G e codifica_G. Il confronto sistematico fra preventivo_G e

consuntivo_G per ruolo, e non solo sul totale di periodo, diventa parte stabile della retrospettiva_G, così da individuare precocemente i ruoli in sofferenza anziché rilevarne lo sfondamento a budget esaurito. Il gruppo mantiene inoltre un margine di riserva sul monte ore complessivo per assorbire gli imprevisti della fase finale, evitando di dover ricorrere a rinegoziazioni del budget in prossimità delle scadenze.

8.8.5 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_G #8 risultano consuntivate complessivamente 410 ore delle 623 preventive, con 213 ore residue per un valore di 3.750,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta confermato a 623 ore e il budget totale a 12.335,00 €: la ricalibrazione non incrementa il costo del progetto, ma ne ridistribuisce le ore residue fra i ruoli, in quanto la ripartizione emersa dai consuntivi non è più coerente con le attività ancora da svolgere.

La revisione interviene su tre voci:

- il ruolo **Analista_G** passa da -21 a 8 ore residue. Il valore negativo, prodotto dallo sfondamento di questo sprint_G e dei precedenti, non è sostenibile: la fase di PB_G richiede ancora interventi di manutenzione_G sui requisiti_G e sui tracciamenti, che devono disporre di un budget effettivo;
- il ruolo **Progettista_G** passa da 60 a 30 ore residue. L'analisi dei design pattern_G e dell'architettura_G generale svolta in questo sprint_G, pur essendo costata più del previsto, ha anticipato una porzione consistente del lavoro progettuale residuo: le decisioni strutturali sono ormai assunte e ciò che resta è prevalentemente progettazione_G di dettaglio incrementale;
- i ruoli **Programmatore_G** e **Verificatore_G** vengono ritoccati marginalmente, rispettivamente a 82 e 78 ore residue, mentre l'**Amministratore_G** risale a 5 ore per coprire la gestione dei rilasci prevista nella fase conclusiva.

La ridistribuzione è stata costruita in modo da lasciare invariato il valore economico complessivo delle ore residue: le 30 ore sottratte al Progettista_G finanziano il riequilibrio dell'Analista_G, avendo i due ruoli il medesimo costo orario di 25,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.
