



Dichiarazione degli Impegni

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-03-24	Approvato	Prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin, The Bitless

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-24	A. Marini	A. Menegaldo	S. Zecchinato	Approvazione
0.3.0	2026-03-24	A. Marini	A. Menegaldo	–	Aggiunta sezione rischi previsti
0.2.1	2026-03-21	S. Zecchinato	L. Battistella	–	Correzione refusi
0.2.0	2026-03-21	A. Marini	L. Battistella	–	Suddivisione ore
0.1.0	2026-03-20	A. Marini	D. Facco	–	Prima stesura

Indice

1	Introduzione	2
2	Descrizione dei Ruoli	2
2.1	Responsabile	2
2.2	Amministratore	2
2.3	Analista	2
2.4	Progettista	2
2.5	Programmatore	2
2.6	Verificatore	3
3	Suddivisione Oraria	3
3.1	Motivazioni sulla ripartizione delle ore	3
4	Preventivo Economico	4
5	Consegna	4
6	Rischi previsti e mitigazione	4
6.1	Periodi di rallentamento	4
6.2	Mitigazione dei rischi	4
6.2.1	Gestione delle assenze estive	4
6.2.2	Competenze non omogenee e supporto interno	5
6.2.3	Impegno individuale e visione d'insieme	5

1 Introduzione

Il seguente documento definisce formalmente gli impegni del gruppo **The Bitless** per la realizzazione del progetto *Second Brain* (Capitolato C6), proposto da **Zucchetti S.p.A.**.

2 Descrizione dei Ruoli

Per una corretta organizzazione del lavoro e il rispetto degli standard di qualità, il gruppo ha adottato la suddivisione dei ruoli tipica dell'ingegneria del software. Ogni membro del gruppo ruoterà tra queste figure ogni due settimane per acquisire una visione d'insieme del progetto.

2.1 Responsabile

Questa figura funge da guida strategica per l'intero gruppo. Il Responsabile coordina i flussi di lavoro, gestisce le relazioni ufficiali con i docenti e i referenti aziendali (Zucchetti S.p.A.) e si occupa della pianificazione delle scadenze. Tra i suoi compiti principali rientrano il monitoraggio costante dei progressi e l'identificazione preventiva dei rischi.

2.2 Amministratore

L'Amministratore è incaricato di configurare e mantenere attive le piattaforme di supporto, la gestione dei repository su GitHub e l'implementazione dei sistemi di Continuous Integration. Inoltre, cura l'organizzazione della documentazione prodotta. Il suo impegno è distribuito in modo costante per assicurare che gli ambienti di sviluppo siano sempre operativi e conformi alle necessità del team.

2.3 Analista

L'Analista ha il compito di interpretare e definire nel dettaglio i requisiti necessari per lo sviluppo del software. Attraverso l'analisi del capitolato C6 e il confronto diretto con i referenti di Zucchetti S.p.A., trasforma le necessità del proponente in modelli dei casi d'uso e specifiche tecniche chiare. Il suo lavoro è fondamentale nelle fasi iniziali, poiché stabilisce le linee guida teoriche su cui il team costruirà l'intera architettura del progetto.

2.4 Progettista

Il Progettista ha il compito di tradurre i requisiti funzionali in un'architettura software robusta, scalabile e manutenibile. Si occupa di selezionare i pattern architetturali più idonei e di definire i diagrammi di sistema che guideranno lo sviluppo. Il suo lavoro è fondamentale per garantire che i diversi moduli del software funzionino in modo integrato, mantenendo il codice ordinato anche con l'aumentare della complessità del progetto.

2.5 Programmatore

Il Programmatore ha il compito di tradurre le specifiche tecniche in codice sorgente eseguibile, seguendo rigorosamente le best practice dell'ingegneria del software. Si occupa dell'implementazione dei componenti logici e dell'integrazione dei diversi moduli applicativi. Il suo lavoro include la scrittura di test unitari per verificare la correttezza di ogni singola funzione e garantire che l'implementazione finale rispetti quanto definito dal Progettista.

2.6 Verificatore

Il Verificatore è il garante della qualità finale. Attraverso procedure di testing sistematico, *code review* e validazione della documentazione, assicura che ogni output del gruppo rispetti gli standard qualitativi definiti. Esegue test di integrazione e controlla che il materiale prodotto soddisfi pienamente i requisiti del capitolato. La sua funzione di controllo è una costante che attraversa ogni fase del progetto.

3 Suddivisione Oraria

Ogni membro del gruppo si impegna a dedicare al progetto un totale di **92 ore produttive**, per un totale di **644 ore**. Il gruppo adotta un modello di rotazione dei ruoli ogni 2 settimane per garantire una formazione trasversale su ogni fase del ciclo di vita del software.

Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
L. Battistella	7	9	9	22	22	23	92
E. De Piccoli	7	9	9	22	22	23	92
D. Facco	7	8	9	22	23	23	92
A. Marini	7	8	9	22	23	23	92
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	23	92
S. Vendramin	7	9	8	22	24	22	92
S. Zecchinato	6	9	9	23	22	23	92
Totale	48	60	62	156	158	160	644

Tabella 1: Distribuzione delle ore per ruolo (RE: Responsabile, AM: Amministratore, AN: Analista, PG: Progettista, PR: Programmatore, VE: Verificatore).

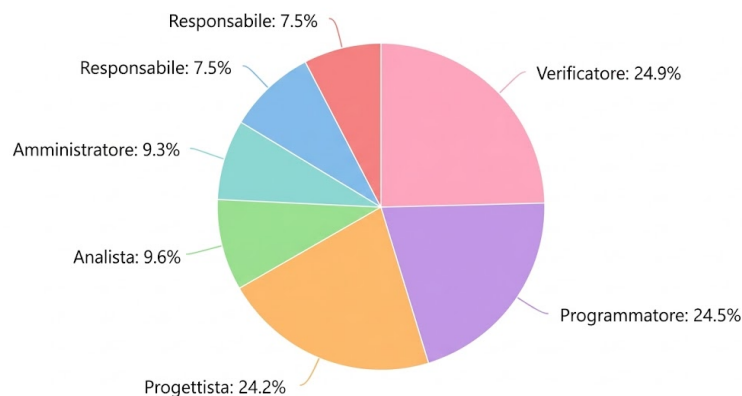


Figura 1: Ripartizione percentuale delle ore totali per ruolo

3.1 Motivazioni sulla ripartizione delle ore

La ripartizione del carico orario è stata definita in funzione di queste valutazioni:

- **Sviluppo e Qualità:** Il Programmatore (158 h) e il Verificatore (160h) hanno un carico orario molto simile. Abbiamo fatto questa scelta per garantire che ogni funzionalità di

Second Brain venga testata subito dopo essere stata scritta, evitando che si accumulino bug difficili da risolvere in seguito.

- **Progettazione e Architettura:** Il Progettista (156h) mantiene un ruolo centrale nella definizione dei pattern necessari per l'integrazione degli LLM, fornendo al Programmatore indicazioni chiare che riducono i tempi di implementazione.
- **Gestione e Analisi:** I ruoli di Responsabile, Amministratore e Analista (in totale 170h) coprono le necessità organizzative e di definizione dei requisiti, assicurando che il team lavori sempre in modo coordinato e conforme agli obiettivi aziendali.

4 Preventivo Economico

Il costo complessivo stimato per la realizzazione del progetto è il seguente:

Ruolo	Costo Orario	Ore Totali	Costo Totale
Responsabile	€ 30,00	48	€ 1.440,00
Amministratore	€ 20,00	60	€ 1.200,00
Analista	€ 25,00	62	€ 1.550,00
Progettista	€ 25,00	156	€ 3.900,00
Programmatore	€ 15,00	158	€ 2.370,00
Verificatore	€ 15,00	160	€ 2.400,00
Totale	–	644	€ 12.860,00

Tabella 2: Quadro economico sintetico basato sulla ripartizione oraria.

5 Consegna

La data ultima per la consegna del progetto è fissata al giorno **30 agosto 2026**.

6 Rischi previsti e mitigazione

6.1 Periodi di rallentamento

Alcuni periodi possono presentare riduzioni della produttività dovute a impegni accademici o personali:

- **Sessione d'esami estiva:** dal 15/06/2026 al 18/07/2026;
- **Assenze pianificate:** durante il mese di agosto 2026. La turnazione delle assenze individuali potrebbe causare una discontinuità operativa nel gruppo.

6.2 Mitigazione dei rischi

6.2.1 Gestione delle assenze estive

Per garantire la continuità dei lavori nel periodo estivo, i membri comunicheranno con adeguato anticipo i propri periodi di assenza. Questo permetterà una pianificazione precisa delle attività, garantendo che le scadenze non vengano compromesse.

6.2.2 Competenze non omogenee e supporto interno

I membri con maggiore esperienza in specifici ambiti forniranno supporto e formazione ai colleghi meno esperti. Tale approccio favorisce l'apprendimento reciproco e previene rallentamenti.

6.2.3 Impegno individuale e visione d'insieme

Ogni componente del gruppo si impegna a fornire il massimo contributo per il raggiungimento degli obiettivi. Per mantenere la qualità del progetto, verranno svolti incontri periodici di monitoraggio per mantenere una visione d'insieme sullo stato d'avanzamento, verificando costantemente il rispetto della tabella di marcia.
