



Presentazione RTB

The Bitless — Gruppo 18

Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026

COMPONENTI DEL TEAM

Lorenzo Battistella, Edoardo De Piccoli, Davide Facco, Anna Marini
Andrea Menegaldo, Samuele Vendramin, Simone Zecchinato

Comprensione obiettivi del capitolato (1/2)

Dal capitolato emergono quattro requisiti fondamentali:

Editing Markdown in tempo reale

Editor con sintassi Markdown e anteprima, con rendering istantaneo del testo formattato.

Assistenza AI all'editing

LLM via API su selezione o intero documento: variazione stilistica, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua.

Analisi critica e generazione

Critica del testo con i «Sei Cappelli per Pensare» e generazione di documenti a partire da un prompt.

Gestione delle note

Salvataggio su file system locale e persistenza server-side.

Comprensione obiettivi del capitolato (2/2)

Requisiti difficili da individuare

Il capitolato lasciava ampia libertà e non definiva requisiti chiari e precisi: all'inizio è stato faticoso individuarli.

Casi d'uso più atomici

Scomposto i casi d'uso in modo atomico (identificando chiaramente i requisiti).

Ridefiniti con la proponente

- Analisi dei sei cappelli → selezione singola e modifica del testo.
- Traduzione → circoscritta alle principali lingue europee.
- Generazione contenuto a partire da link

Tipologia	Obbligatorie	Desiderabili	Opzionali	Totale
Funzionali	49	54	16	119
Qualità	9	3	1	13
Vincolo	4	0	4	8
Totale	62	57	21	140

Aree di Rischio Tecnologico

Molte tecnologie da utilizzare nel progetto erano sconosciute dai componenti del team



React + Typescript



CodeMirror



FastAPI

Sfide tecniche specifiche del capitolato

- Streaming in tempo reale delle risposte dell'LLM.
- Generazione del testo «Da link» con contenuti estesi e fonti non sempre affidabili.
- Gestione degli errori dell'LLM: annullamento, timeout, risposte d'errore.

Modifiche migliorative (1/2)

Norme di Progetto

- Ristrutturazione completa per coerenza e uniformità strutturale.
- Aggiunte procedure operative per ogni processo.
- Applicata la gerarchia processo–attività–procedure–strumenti su tutti i processi.

Piano di Progetto

- Migliorato il consuntivo: retrospettiva → misure correttive → pianificazione → preventivo a finire.
- Retrospettiva con valutazione dell'efficacia delle mitigazioni dei rischi.

Piano di Qualifica



- Rileviamo metriche a ogni sprint
- Strumento per individuare problemi e misure correttive.

Verbali

- Eliminato il registro delle modifiche dai verbali.
- Utilizzati per registrare e motivare le decisioni prese

Modifiche migliorative (2/2)

Sito web: aggiunta la barra di navigazione in alto e pubblicato il glossario come risorsa web consultabile.

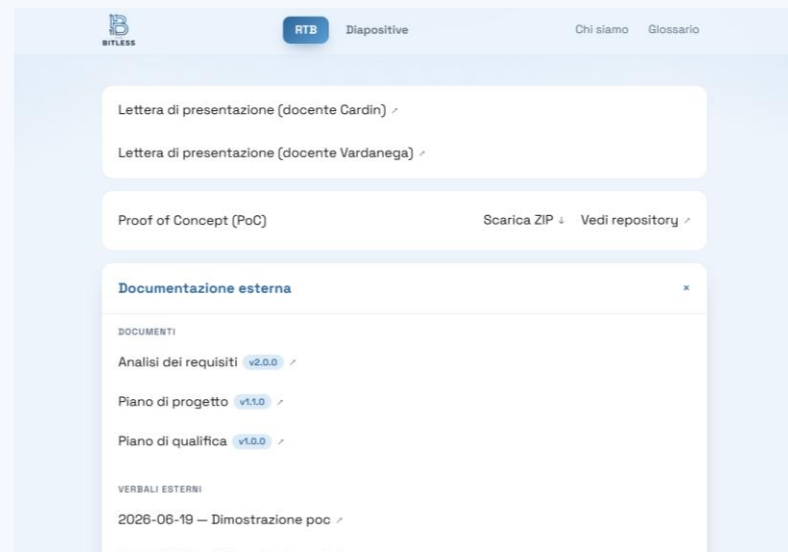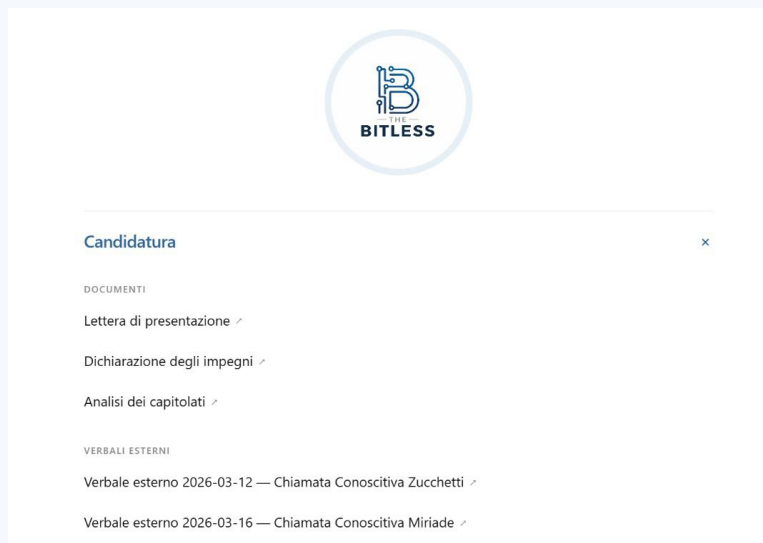

Autovalutazione (1/2)

Granularità dei task

Inizialmente task troppo ampi e assegnati senza criteri chiari: monitoraggio dell'avanzamento difficile e dispendioso.



Migliorato creando issue più atomiche e foglio condiviso per le ore, con confronto preventivo/consuntivo a ogni sprint.

Comunicazione interna

Comunicazione poco efficace: incomprensioni, sprechi e attività sporadiche (es. Analisi dei Requisiti).



Allineamenti più frequenti, segnalazione tempestiva dei blocchi e utilizzo delle retrospettive di sprint per capire cosa migliorare.

Autovalutazione (2/2)

Passaggio di consegna dei ruoli

L'alternanza periodica ha creato attriti, con membri in ruoli poco familiari e discontinuità nelle attività.




Trasformata in un'assegnazione flessibile, calibrando i ruoli sulle reali esigenze di ciascuno sprint.

Stima delle ore

Definire quante ore assegnare alle attività resta difficile: le stime vengono affinate sprint dopo sprint, sulla base dello storico dei consuntivi.

Esito Colloquio TB



Semaforo verde

Scelte tecnologiche

Ritenute plausibili. Rilevata però un'esposizione impacciata e l'uso di termini poco tecnici in sede di colloquio.

Azioni correttive

Revisione di alcuni casi d'uso e correzione dei requisiti non funzionali. Risolti gli errori segnalati.

Analisi dei Requisiti

La parte di analisi del documento ha una buona struttura.

Preventivo-Consuntivo primi 7 sprint

Membro	RE	RE	AM	AM	AN	AN	PT	PT	PR	PR	VE	VE	Tot	Tot
	Prev	Cons	Prev	Cons	Prev	Cons	Prev	Cons	Prev	Cons	Prev	Cons	Prev	Cons
L. Battistella	7	5	7	7	6	6	7	6	8	7	11	11	46	42
E. De Piccoli	3	3	5	5	7	8	8	9	10	7	12	12	45	44
D. Facco	3	3	7	7	6	2	5	7	18	19	6	5	45	43
A. Marini	4	4	7	7	9	11	8	10	11	12	9	8	48	52
A. Menegaldo	2	2	5	5	9	8	5	7	14	9	8	8	43	39
S. Vendramin	4	6	8	8	6	12	1	1	8	10	15	15	42	52
S. Zecchinato	6	4	9	9	12	7	6	6	0	10	7	14	40	50
Totale (ore)	29	27	48	48	55	54	40	46	69	74	68	73	309	322
Costo (€)	870	810	960	960	1.375	1.350	1.000	1.150	1.035	1.110	1.020	1.095	6.260	6.475

RE Responsabile · AM Amministratore · AN Analista · PT Progettista · PR Programmatore · VE Verificatore

Differenze Preventivo-Consuntivo RTB

Ruolo	Resp.	Ammin.	Analista	Progett.	Programm.	Verific.	Totale (€)
Ore preventivate	29	48	55	40	69	68	309 (6.260)
Ore consumate	27	48	54	46	74	73	322 (6.475)
Differenze	-2	0	-1	+6	+5	+5	+13 (+215)

Programmatore: lo sviluppo del codice si è rivelato più impegnativo e articolato del previsto.

Verificatore e Progettista: all'inizio erano allocate troppe poche ore; la stima delle ore per ogni attività, tuttora difficile, era errata.

Preventivo a finire PB

Membro	RE	AM	AN	PT	PR	VE	Totale
L. Battistella	2	2	3	13	15	12	47
E. De Piccoli	4	4	1	10	15	11	45
D. Facco	4	1	7	12	4	18	46
A. Marini	3	1	-2	9	11	15	37
A. Menegaldo	5	3	1	13	13	15	50
S. Vendramin	1	1	-4	18	14	7	37
S. Zecchinato	2	0	2	14	12	9	39
Totale per ruolo	21	12	8	89	84	87	301
Costo totale (€)	630,00	240,00	200,00	2.225,00	1.260,00	1.305,00	5.860,00

RE Responsabile · AM Amministratore · AN Analista · PT Progettista · PR Programmatore · VE Verificatore — ore stimate al termine dello Sprint #7.
